



HRVATSKI SABOR

KLASA: 022-03/18-01/49

URBROJ: 65-18-02

Zagreb, 22. ožujka 2018.

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA
HRVATSKOGA SABORA**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA
RADNIH TIJELA**

Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem *Izvešće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2017. godinu*, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu s odredbom članka 7. stavka 10. Zakona o protuminskom djelovanju ("Narodne novine", broj 110/15) podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. ožujka 2018. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila dr. sc. Davora Božinovića, ministra unutarnjih poslova, Žarka Katića, državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Tomislava Ivića i mr. sc. Zdravka Jakopa, državne tajnike u Ministarstvu obrane, Antu Delipetra i dr. sc. Damira Truta, pomoćnike ministra unutarnjih poslova, te dr. sc. Petra Mihatova, pomoćnika ministra obrane.

PREDSJEDNIK

Gordan Jandroković



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa: 022-03/18-14/03
Urbroj: 50301-29/09-18-2



Zagreb, 22. ožujka 2018.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2017. godinu

Na temelju članka 7. stavka 10. Zakona o protuminskom djelovanju (Narodne novine, broj 110/15), Vlada Republike Hrvatske podnosi Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2017. godinu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada Republike Hrvatske je odredila dr. sc. Davora Božinovića, ministra unutarnjih poslova, Žarka Katića, državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Tomislava Ivića i mr. sc. Zdravka Jakopa, državne tajnike u Ministarstvu obrane, Antu Delipetra i dr. sc. Damira Truta, pomoćnike ministra unutarnjih poslova, te dr. sc. Petra Mihatova, pomoćnika ministra obrane.

 **PREDSJEDNIK**
mr. sc.  Andrej Plenković

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I
UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2017. GODINU**

SADRŽAJ

1. Uvod	4
2. Analiza Nacionalnog programa protuminskog djelovanja za razdoblje 2009-2017.	5
3. Realizacija temeljnih ciljeva Plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu..8	
3.1. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u Republici Hrvatskoj	9
3.1.1. Razminiranje minski sumnjivog područja	10
3.1.1.1. Izvršenje posljednjih ugovorenih poslova razminiranja u Brodsko – posavskoj županiji s ciljem cjelovitog rješavanja minskog problema Županije	18
3.1.1.2. Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem poljoprivrednog zemljišta.....	18
3.1.1.3. Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u Požeško-slavonskoj županiji	20
3.1.2. Smanjenje MSP-a provedbom općeg i tehničkog izvida	20
3.1.2.1. Povećanje MSP-a provedbom općeg izvida	21
3.1.3. Struktura planirane površine za razminiranje, tehnički i opći izvid	21
3.2. Održavanje sustava obilježnosti cjelokupnog minski sumnjivog prostora i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima	22
3.3. Provođenje informiranja i edukacije o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova	23
3.3.1. Edukacija o opasnostima od mina	23
3.3.2. Žrtve mina	24
3.4. Promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici s ciljem stvaranja uvjeta za nastavljane provođenja poslova iz područja protuminskog djelovanja po izvršenju obveza proisteklih iz konvencija.....	25
3.5. Pružanje tehničke pomoći u projektima koji će se financirati sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.	29
3.5.1. Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko – dravskoj regiji – Naturavita	29
3.5.2. „Karlovac Karst“	30
3.5.3. Fearless Velebit	30
3.5.4. Tip operacije 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta	30
3.5.5. Švicarski program pomoći.....	31
3.5.6. INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.	33
3.5.7. Provedba projekata financiranih sredstvima prepristupnih programa IPA-I. Kompeneneta i Prijelaznog instrumenta	34

3.6. Izrada zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. Ottawske konvencije-Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima.....	36
4. Financiranje plana	37
4.1. Financiranje poslova razminiranja	39
4.1.1. Donacije.....	40
4.1.2. ITF Enhancing Human Security.....	40
4.1.3. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta.....	41
4.1.4. Razminiranje sredstvima Državnog proračuna (Ministarstvo poljoprivrede) s pozicije Općekorisne funkcije šuma	41
4.1.5. Ukupno realizirana financijska sredstva	41
4.1.6. Prosječna cijena poslova razminiranja.....	41
5. Zaključak	42
6. Prilozi	44
6.1. Prikaz razminiranih područja u 2017. godini po županijama.....	44
6.2. Izvešće o provedbi plana razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina i utrošenim financijskim sredstvima za 2017. godinu	46

1. Uvod

Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) je dokument kojem je svrha izvijestiti Hrvatski sabor i javnost o aktivnostima i ciljevima koji su realizirani na području protuminskog djelovanja u 2017. godini, kao i financijskim sredstvima koja su osigurana i realizirana za tu namjenu.

U Izvješću se, uz utvrđivanje realiziranih ciljeva i njihove analize, ocjenjuje i učinkovitost dosadašnje provedbe strateških ciljeva vezanih uz cjelovito rješavanje minskog problema u Republici Hrvatskoj.

Jedan od ciljeva Izvješća je i potaknuti aktivnosti za stvaranje uvjeta da se sukladno potpisanim konvencijama stvore uvjeti za pravovremeno, učinkovito i cjelovito rješavanje minskog problema Republike Hrvatske.

Osnova za izradu Izvješća je Plan protuminskog djelovanja za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) koji je donijela Vlada Republike Hrvatske na svojoj 65. sjednici održanoj 9. Studenoga 2017. godine. Izrada i donošenje Plana utemeljeni su na Zakonu o protuminskom djelovanju (Narodne novine, broj 110/15) i Nacionalnom programu protuminskog djelovanja Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 120/09).

Plan je usklađen sa Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2017.–2019. godina, u posebnom cilju 1.4. „Smanjiti zagađenost prostora minama i eksplozivnim sredstvima“, sadržanom u općem cilju 1. „Jačati opću sigurnost“.

Plan je izradio Hrvatski centar za razminiranje uz mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija, Ministarstva obrane, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva kulture, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva turizma, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva poljoprivrede, Državne uprave za zaštitu i spašavanje te svih minski zagađenih županija u Republici Hrvatskoj.

2. Analiza Nacionalnog programa protuminskog djelovanja za razdoblje 2009. – 2017.

Nacionalni program protuminskog djelovanja (u daljnjem tekstu: Program) je strateški dokument koji je donio Hrvatski sabor na sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine i njegova je svrha da donositeljima odluka, prije svih Ministarstvu financija i Ministarstvu unutarnjih poslova, bude osnova za izradu službenih dokumenata vezanih za protuminsko djelovanje, a Hrvatskom centru za razminiranje osnova za godišnja planiranja.

Programom su utvrđeni ciljevi i načini ostvarenja rješavanja minskog problema Republike Hrvatske s ciljem ispunjenja obveza preuzetih ratifikacijom Konvencije o zabrani uporabe, stvaranju zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (u daljnjem tekstu: Ottawska konvencija) i Konvencije o kazetnom streljivu.

U Programu je utvrđeno ostvarenje sljedećih 5 strateških ciljeva u razdoblju od 1. siječnja 2009. do 1. ožujka 2019. godine:

1. Potpuno uklanjanje minske opasnosti s područja Republike Hrvatske do 2019. godine¹.
2. Održavanje obilježnosti minski sumnjivog područja u svim fazama rješavanja minskog problema.
3. Izrađivanje i provođenje programa edukacije cjelokupnog stanovništva koje živi i/ili radi u okruženju minski sumnjivog područja ili gravitira istom.
4. Nastavljanje s pružanjem skrbi i rehabilitacije, uključujući psiho-socijalnu rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svim žrtvama mina.
5. Pozicioniranje i promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici.

Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2017.–2019. godina, u posebnom cilju 1.4. „Smanjiti zagađenost prostora minama i eksplozivnim sredstvima“, sadržanom u općem cilju 1. „Jačati opću sigurnost“, planirano je u 2017. godini smanjenje minski sumnjivih područja i područja zagađenih isključivo NUS-om za 20%.

Strategijom Europske unije za dunavsku regiju, COM(2010) 715 final, u poglavlju D „Jačanje Podunavlja“, u paragrafu „Zajednički rad na promicanju sigurnosti i borbi protiv organiziranog kriminala“ sadržana je akcija „Nastaviti razminirati minski sumnjiva područja Podunavlja“.

¹ U razdoblju trajanja Programa, od 2009.-2019. godine u cilju potpunog uklanjanja minske opasnosti iz Republike Hrvatske, planirano je smanjenje minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: MSP) veličine 954,5 km². Za izvršenje tih poslova potrebno je osigurati iz svih izvora financiranja 4.187.000.000,00 kuna


Izvrješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu

Godina	2009.		2010.		2011.		2012.		2013.		2014.		2015.		2016.		2017.		Planirano programom	Ostvareno	Planirano programom - 2018.
	Planirano programom	Realizirano																			
Ukupno smanjenje MSP-a u km ²	57,4	62,6	75,5	70	86,5	70,4	134,5	67,3	139,5	71,9	132,5	83,8	104,5	67,8	86,4	41,4	70,2	36,5			57
Sredstva u mil.kuna	326,2	318,2	347,9	287	371,0	289,6	555,5	272,6	572,5	248,7	572,4	280,9	414,6	328,9	379	292,9	333	346,7			271
Ukupno smanjenje MSP-a u km ² u razdoblju 2009.-2017. godina																			887,0	571,7	
Realizirana sredstva u mil.kuna u razdoblju 2009.-2017. godina																			3.872,1	2.865,5	

Tablica 2.1.

Usporedba Nacionalnim programom utvrđenih ciljeva i potrebnih financijskih sredstava s ostvarenjem u razdoblju 2009.-2017. godina

U razdoblju od 2009. do 2017. godine Nacionalnim programom je utvrđeno smanjenje minski sumnjivog područja Republike Hrvatske za 887 km², za što je bilo potrebno iz svih izvora financiranja osigurati 3,87 mlrd. kuna. U navedenom razdoblju minski sumnjivo područje ukupno je smanjeno za 571,7 km². Ukupno utrošena financijska sredstva za izvršenje navedenih poslova iznose 2,67 mlrd. kuna.

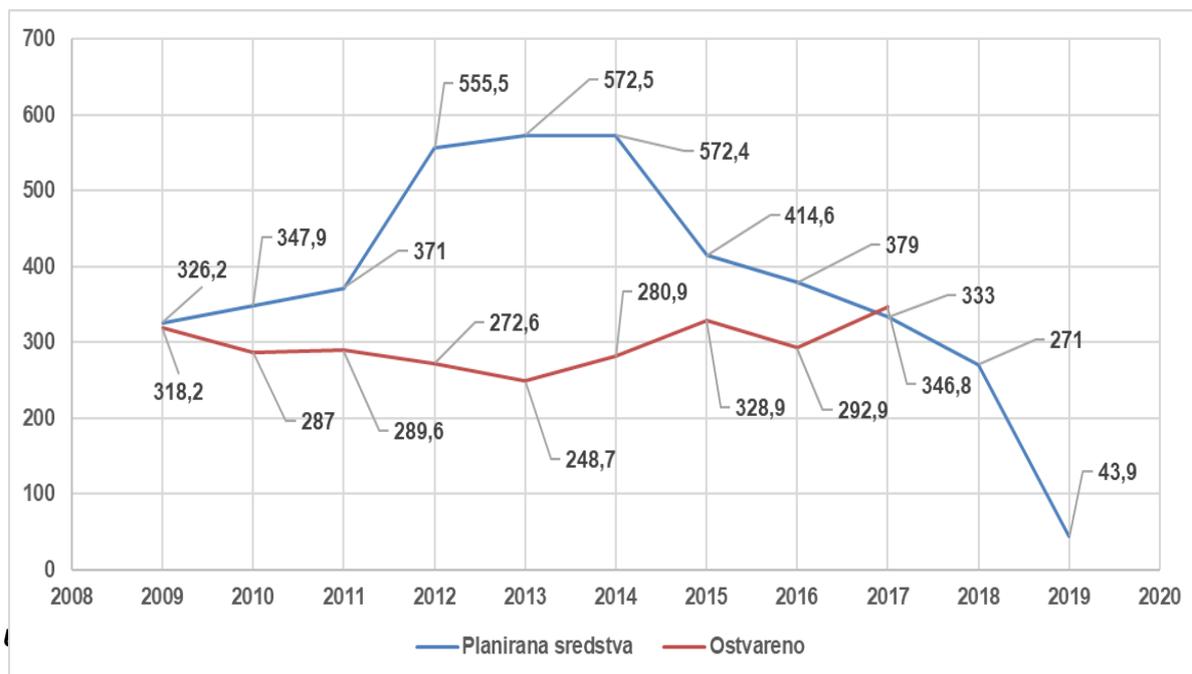

Iz navedenog je razvidno da su ukupna financijska sredstva koja su utrošena u navedenom razdoblju manja za 31% od utvrđenih Nacionalnim programom.. U navedenom razdoblju ukupno smanjenje MSP-a je za 36% manje od planiranog Nacionalnim programom..

Financijska sredstva koja su osigurana iz Državnog proračuna i ostalih izvora za 2017. godinu veća su od planiranih Nacionalnim programom za 2017. godinu.

	Planirano Programom	Planirano za 2017.	Realizirano
Poslovi koji za cilj imaju smanjenje MSP-a	70,2	58,3	36,5
Financijska sredstva (mil. kuna)	333	505,2	346,7

Tablica 2.2. Usporedba Nacionalnim programom utvrđenih potrebnih financijskih sredstava s osiguranim sredstvima državnog proračuna i ostalim izvorima financiranja za 2017. godinu

Analiza devetogodišnjeg ostvarenja Programa 2009.-2019. jasno ukazuje da je u navedenom razdoblju provedbe jedino u prvoj godini, godišnja osigurana sredstva za poslove koji imaju za cilj smanjenje MSP-a bila na razini planiranih Programom. U razdoblju 2010.-2014. godišnje realizacije smanjenja MSP-a znatno odstupaju u odnosu na planirane Programom zbog značajno manjeg iznosa osiguranih sredstava na godišnjoj razini. U posljednje tri godine, planirana i osigurana financijska sredstva su veća od planiranih Programom, ali nisu u cijelosti realizirana. Izvor većih, osiguranih financijska sredstva od planiranih Programom su pretpristupni fondovi EU te Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Tijekom provedbe Programa, sukladno gore navedenim pokazateljima, stvorila se potreba za izradom novog strateškog dokumenta, koji će utvrditi uvjete za kapacitiran sustav protuminskog djelovanja s ciljem provedbe poslova razminiranja, tehničkog, općeg i dopunskog općeg izvoda u skladu s osiguranim financijskim sredstvima na godišnjim razinama i za cijelosti ispunjavanje obveza iz članka. 5. Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima, sadržanog u Ottawskoj konvenciji, nakon 2019. godine u najkraće mogućem vremenu.

3. Realizacija temeljnih ciljeva Plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu

Na dan 1. siječnja 2017. godine ukupno minski sumnjivo područje Republike Hrvatske iznosilo je 446,6 km², prostiralo se unutar 65 gradova i općina u 9 županija i bilo je obilježeno sa 14.088 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksploziviranih ubojnih sredstava.

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima utvrđenim u Nacionalnom programu, u 2017. godini u Republici Hrvatskoj protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

CILJ 1.

Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg izvida i dopunskog općeg izvida te tehničkog izvida na površini od 58,3 km²;

PODCILJ 1.1.

Izvršenje posljednjih ugovorenih poslova razminiranja u Brodsko-posavskoj županiji u cilju cjelovitog rješavanja minskog problema Županije;

PODCILJ 1.2.

Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem poljoprivrednog zemljišta;

PODCILJ 1.3.

Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u Požeško-slavonskoj županiji;

CILJ 2.

Održavanje sustava obilježnosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo neeksploziviranim ubojnim sredstvima;

CILJ 3.

Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova;

CILJ 4.

Promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici u cilju stvaranja uvjeta za nastavljeno provođenje poslova iz područja protuminskog djelovanja po izvršenju obveza proisteklih iz konvencija;

CILJ 5.

Pružanje tehničke pomoći u projektima koji će se financirati sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020;

CILJ 6.

Izrada zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. Ottawske konvencije -Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima.

U 2017. godini Hrvatskim centrom za razminiranje rukovodila su dva ravnatelja i jedan v.d. ravnatelja. Upravno vijeće Hrvatskog centra za razminiranje konstituirano je u srpnju 2017. godine.

3.1. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u Republici Hrvatskoj

Izvršenje poslova razminiranja u Republici Hrvatskoj u 2017. godini planirano je na površini od 44,4 km². Usporedo s poslovima razminiranja koji su obavljale pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova razminiranja, Hrvatski centar za razminiranje je planirao provoditi opći, dopunski opći i tehnički izvid na površini od najmanje 13,9 km². Također, na projektima razminiranja na kojima su poslovi bili u tijeku, odnosno koji nisu u cijelosti završeni, razminirana površina na kojoj je Hrvatski centar za razminiranje do 31. prosinca 2016. godine proveo kontrolu kvalitete u tijeku, iznosi 19,8 km² i u Izvješću o ostvarenju Plana protuminskog djelovanja za 2016. godinu je iskazana u razminiranoj površini, ali nije kao smanjenje MSP-a jer u 2016. godini nisu izdane potvrde o isključenju iz MSP-a.

U 2017. godini MSP Republike Hrvatske poslovima razminiranja, tehničkog i dopunskog općeg i općeg izvida smanjen za 36,5 km².

Rb.	Vrsta aktivnosti	Planirano za 2017. godinu (km ²)	Smanjeno MSP (km ²)
1.	Razminiranje	44,4	29,9
2.	Izvid – opći, dopunski opći i tehnički	13,9	6,6
UKUPNO:		58,3	36,5

Tablica 3.1. Smanjenje MSP-a

Red. Broj	Županija	Ukupna zagađenost MES-om i NUS-om na da 01.01.2017. (km ²)	Smanjenje MSP-a (km ²)
1.	Brodsko-posavska	2,0	2,0
2.	Karlovačka	50,9	1,3
3.	Ličko-senjska	138,6	0,7
4.	Osječko-baranjska	60,1	4,9
5.	Požeško-slavonska	29,9	6,0
6.	Splitsko-dalmatinska	21,9	1,8
7.	Sisačko-moslavačka	78,5	8,1
8.	Šibensko-kninska	27,1	5,0
9.	Zadarska	37,6	6,7
UKUPNO		446,6	36,5

Tablica 3.2. Izvršeno poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida po županijama

Nakon izvršenih poslova razminiranja na 73 idejna plana razminiranja izdana je potvrda o isključenju površina iz minski sumnjivih na površini od 29.885.067 m².

Provedba 54 općih izvida, dopunskih općih izvida i tehničkih izvida rezultiralo je izdavanjem potvrda o isključenosti površina iz minski sumnjivih, veličine od 6.600.192 m².

Na dan 31. prosinca 2017. godine MSP Republike Hrvatske iznosi 411.494.688 m², odnosno 411,5 km².

3.1.1. Razminiranje minski sumnjivog područja

Red.br.	Županija	Ukupna zagađenost MES-om i NUS-om 01.01.2017.	Planirani poslovi razminiranjem	Razminirano	Udio smanjenja MSP-a u odnosu na ukupan MSP županije
		km ²	km ²	km ²	%
1	Brodsko-posavska	2,0	0,2	0,2	10,0
2	Karlovačka	50,9	1,4	0,9	1,8
3	Ličko-senjska	138,6	16,4	15,4	11,1
4	Osječko-baranjska	60,1	2,7	0,9	1,5
5	Požeško-slavonska	29,9	6,6	5,4	18,1
6	Sisačko-moslavačka	78,5	7,4	7,4	9,4
7	Splitsko-dalmatinska	21,9	2,3	1,8	8,2
8	Šibensko-kninska	27,1	3,2	2,5	9,2
9	Zadarska	37,6	4,1	4,0	10,6
Republika Hrvatska - ukupno		446,6	44,4	38,5	8,6


Tablica 3.3. Ukupno planirani i ostvareni poslovi razminiranja, po županijama

U 2017. godini od planiranih 44,4 km² poslovi razminiranja su izvršeni na površini od 38,5 km². Neostvarenje u cijelosti poslova razminiranja uvjetovano je kasnijim započinjanjem poslova razminiranja sredstvima Državnog proračuna s pozicije naknada OKFŠ-a jer je Sporazum između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskog centra za razminiranje potpisan tek u rujnu 2017.


Također, projekt „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita“ koji će se financirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda nije u 2017. godini započeo s provedbom.

U 2017. godini pronađeno je i uništeno 1.289 komada MES-a i 519 komada NUS-a. Najviše MES-a pronađeno je u Ličko-senjskoj županiji gdje je ukupno pronađeno i uništeno 584 komada, od čega najviše protupješačkih mina (u daljnjem tekstu: PPM) tipa PMR-2A, PMA-3, PMR-2AS te protuoklopnih mina (u daljnjem tekstu: POM) tipa TMRP-6.


Najviše NUS-a pronađeno je i uništeno u Šibensko-kninskoj županiji, te Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji.

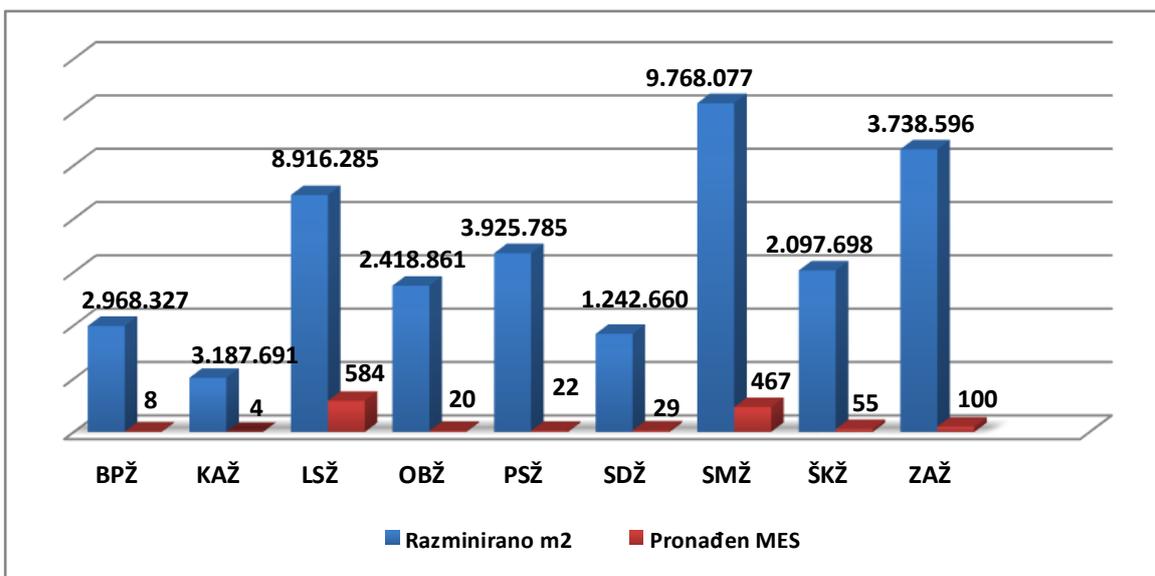


Graf 3.1. Prikaz pronađenih MES-a po županijama

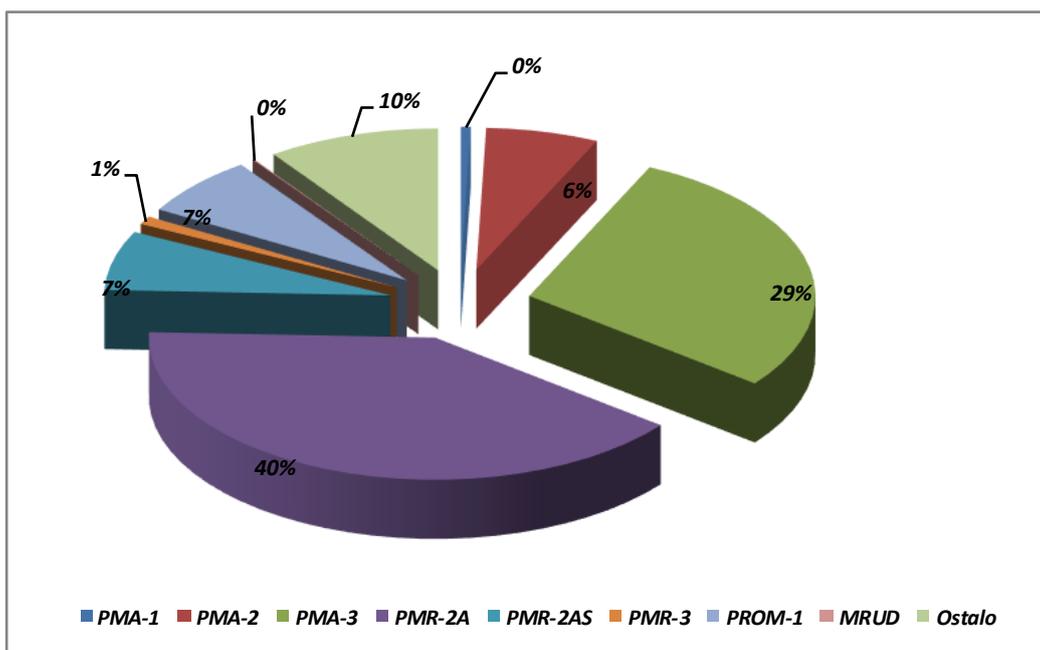

Graf 3.2. Pregled pronađenih PPM po vrstama

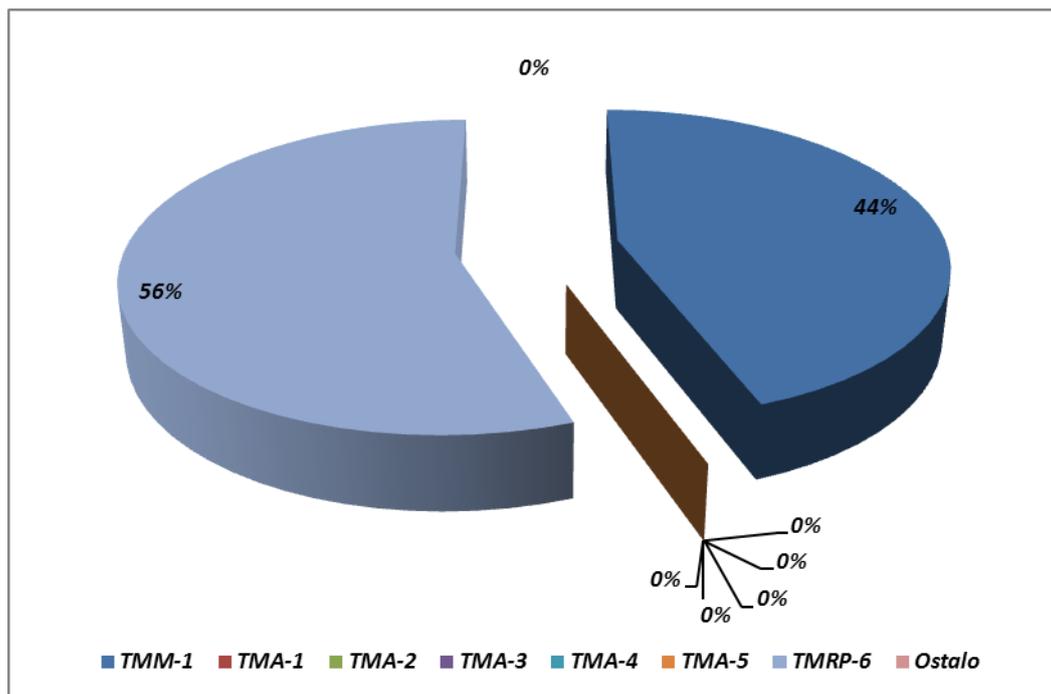

Graf 3.3. Pregled pronađenih POM po vrstama

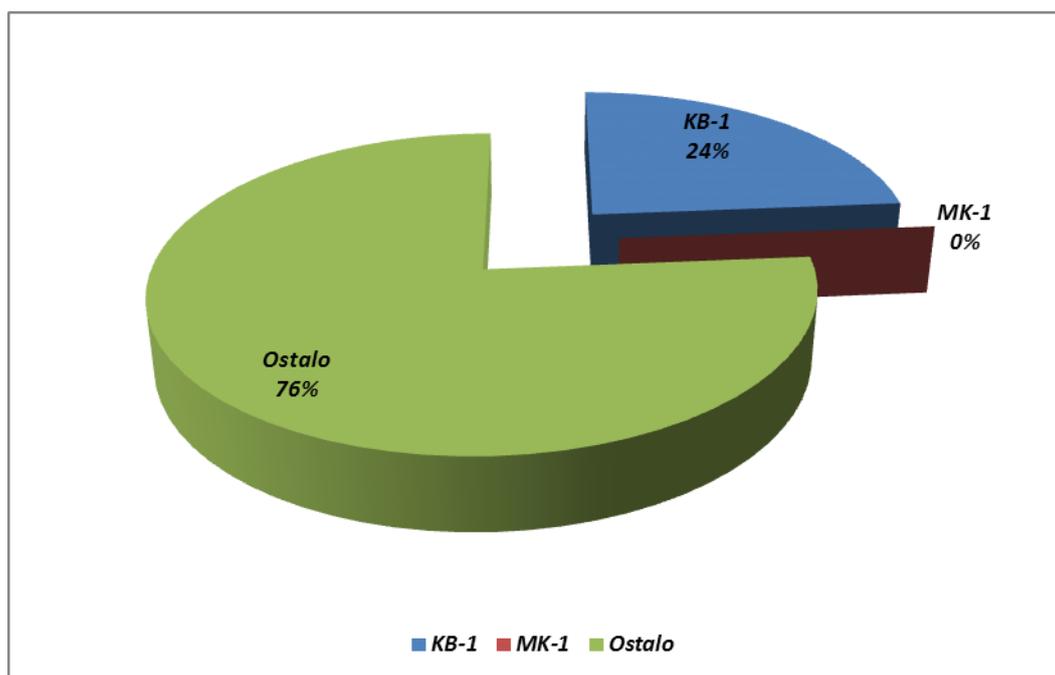

Graf 3.4. Pregled pronađenih NUS-a

U 2017. godini u Republici Hrvatskoj obzirom na vrstu MES-a najviše je pronađeno i uništeno PPM-a tipa PMR-2A, PMA-3 i PMR-2AS i POM-a tipa TMM-1 i TMRP-6.

Od ukupno pronađenog i uništenog NUS-a 24% odnosi se na kazetne bombice tipa KB-1, a preostalih 76% na različite vrste streljiva.

Rb.	Županija	Ostvarenje razminiranja u 2017. godini (m ²)	Pronađena minskoeksplozivna sredstva (kom)		Pronađena neeksplozivna ubojna sredstva (kom)	Ukupno pronađena minskoeksplozivna sredstva i neeksplozivna ubojna sredstva (kom)
			Protupješačke mine	Protuoaklopne mine		
1	Brodsko-posavska	1.989.567	8	0	1	9
2	Karlovačka	1.014.153	4	0	2	6
3	Ličko-senjska	4.444.258	574	10	71	655
4	Osječko-baranjska	2.743.869	20	0	36	56
5	Požeško-slavonska	3.353.769	22	0	8	30
6	Splitsko-dalmatinska	1.840.573	29	0	6	35
7	Sisačko-moslavačka	6.167.458	459	8	48	515
8	Šibensko-kninska	3.029.902	55	0	273	328
9	Zadarska	5.301.518	100	0	74	174
Ukupno		29.885.067	1.271	18	519	1.808
			1.289			

Tablica 3.4. Broj i vrste pronađenih MES-a i NUS-a po županijama

Poslove razminiranja ručnom detekcijom mina, poslove strojne pripreme površine poslove pregleda površine psima za detekciju mina, obavljale su pravne osobe ili obrtnici, koji imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Poslove kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja obavljaju ovlaštene djelatnici Hrvatskog centra za razminiranje (pirotehničari za kontrolu kvalitete i nadzornici za kontrolu kvalitete) dok poslove završne kontrole kvalitete obavlja Povjerenstvo imenovano od ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje (predsjednik Povjerenstva i jedan član iz redova Hrvatskog centra za razminiranje te jedan član iz Ministarstva unutarnjih poslova).

Tijekom provođenja poslova kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja, na 42 radilišta utvrđeno je da poslovi razminiranja ne zadovoljavaju propisane uvjete kvalitete te je naloženo ponavljanje – ponovno razminiranje na ukupnoj površini od 84.905 m².

Tijekom provođenja završne kontrole kvalitete Povjerenstvo je u 29 slučajeva utvrdilo da poslovi nisu obavljani kvalitetno te je naloženo ponavljanje poslova na ukupno 41.559 m².

Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu

RB	Oznaka projekta	Naziv projekta	Županija	Tvrtka	Projektirana površina	Status projektirane površine 31.12.2017.	Radovi u tijeku		Preostalo m ²
							Realizirano do 31.12.2017.	Preostalo za KKUT	
1	PR-KARAK-015-03-17	Površine na području Općine Rakovica	KA	PIPER	106.564	Ugovor potpisan	0	0	106.564
2	PR-KACET-014-03-17	Površine na području naselja Cetinograd	KA	TITAN	113.306	Radovi u tijeku-mirovanje	83.087	2.322	30.219
3	PR-KAJOS-011-03-17	Površine na području općina Josipdol i Plaški	KA	FAS	307.965	Radovi u tijeku-mirovanje	146.699	48.474	161.266
4	PR-KATOU-019-05-17	Površine uz rijeku Tounjčicu	KA	HARPIJA	89.812	Radovi u tijeku-mirovanje	48.590	1.800	41.222
5	PR-KASAB-016-03-17	Šumske površine na području Ličke Jesenice	KA	HARPIJA	253.168	Radovi u tijeku-mirovanje	125.336	48.006	127.832
6	PR-LSGOS-117-12-15	Poljoprivredne površine u naseljima Barlete i Bilaj	LS	EXPLORATOR	1.532.605	Radovi u tijeku-mirovanje	1.028.846	88.020	503.759
7	PR-LSGOS-119-12-15	Poljoprivredne površine na području Obljajac te u naseljima Novoselija i Veljun	LS	COR	607.169	Radovi u tijeku-mirovanje	486.605	0	120.564
8	PR-LSPJE-122-12-15	Poljoprivredne površine u naselju Donji Vaganac	LS	DETEKTOR	1.159.200	Radovi u tijeku-mirovanje	799.201	420	359.999
9	PR-LSGOS-121-12-15	Poljoprivredne površine na području Tromede i Bliznice te u naselju Jurkovići	LS	DOK-ING RAZMINIRANJE	1.739.115	Radovi u tijeku-mirovanje	1.550.747	0	188.368
10	PR-LSGOS-007-03-17	Šire područje Grada Gospića	LS	DOK-ING RAZMINIRANJE	356.915	Radovi u tijeku-mirovanje	350.097	0	6.818
11	PR-LSOTČ-013-03-17	Površine uz županijsku cestu ŽC 5113 na dijelu dionice Glibodol-Lička Jesenica, 2. dio	LS	TITAN	57.655	Radovi u tijeku-mirovanje	38.182	10.125	19.473
12	PR-LSPER-008-13-17	Područja u zaselcima Lipova Glavica i Štimci	LS	FOSSIO	266.261	Radovi u tijeku-mirovanje	235.490	7.800	30.771
13	PR-LSPJE-089-12-16	Područje uz državnu granicu sa BiH u naselju Željava, 2. dio	LS	PIPER	1.873.774	Ponavljanje poslova ZKK	1.873.774		0
14	PR-LSGOS-033-07-17	Šuma u naselju Smiljan uz zaselak Bogdanić	LS	TITAN	27.663	Radovi u tijeku-mirovanje (samo uvedeno)	0		27.663
15	PR-PSPAK-129-12-15	Poljoprivredne površine Požeško-slavonske županije	PS	TITAN	3.706.367	Radovi u tijeku-mirovanje	3.148.314	9.000	558.053
16	PR-PSPAK-017-04-17	Šumske površine uz naselje Kusunje	PS	TETRAZEN	593.041	Radovi u tijeku-mirovanje	473.661	0	119.380
17	PR-PSPAK-018-04-17	Šumske površine uz naselja Donja Šumetlica i Branešci	PS	HARPIJA	835.525	Radovi u tijeku-mirovanje	805.414	0	30.111
18	PR-PSPAK-025-05-17	Šume na području Cicelja	PS	ISTRAŽIVAČ	784.727	Radovi u tijeku-mirovanje	759.778	25.460	24.949
19	PR-PSPAK-024-05-17	Šume na području: Obješenjak, Čivčinac, Tečinsko brdo, Ovtak i Badnjašica	PS	HEKSOGEN	357.105	Radovi u tijeku-mirovanje	102.190	54.190	254.915
20	PR-PSPAK-023-05-17	Šume na području Brezovog Polja i Čungara	PS	PITON	418.453	Radovi u tijeku-mirovanje	0		418.453
21	PR-SDVRL-030-07-17	Područje zaselka Dragiči u gradu Vrlici	SD	TNT 7	93.780	Radovi u tijeku-mirovanje	66.720	0	27.060
22	PR-ŠKRUŽ-031-07-17	Površine na području Mirlović polja	ŠK	TITAN	264.383	Radovi u tijeku-mirovanje	45.774	0	218.609
23	PR-ŠKSKR-028-07-17	Šumski odjel 16A u G.J. Guduča	ŠK	DOK-ING RAZMINIRANJE	518.033	Radovi u tijeku-mirovanje	124.460	0	393.573
24	PR-ŠKSKR-029-07-17	Šumski odjeli 17B i 17D u G.J. Guduča	ŠK	COR	198.775	Poslan poziv za početak poslova	0		198.775
25	PR-ŠKŠIB-005-01-16	Područje naselja Zaton i naselje Jurasi u Šibeniku	ŠK	DIZ-EKO	108.809	Radovi u tijeku-mirovanje-ponavljanje	108.809		0
					16.370.170		12.401.774	295.617	3.968.396

Tablica 3.5. Preostalo za realizaciju na projektima započetim 2017. godine

Izvjешće o provedbi Plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu

R.br.	Oznaka projekta	Naziv projekta	Županija	Površina projekta m ²	Tvrtka	Status	Površina za ZKK m ²
1	PR-SMDVO-088-12-16	Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području Općine Dvor, 2. dio	SM	2.500.463	RUMITAL	Zaprimljen zahtjev za ZKK	3.879
2	PR-SMDVO-084-10-16	Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području Općine Dvor	SM	1.367.000	DOK-ING razminiranje	Zaprimljen zahtjev za ZKK	3.507
3	PR-LSPJE-085-10-16	Područje uz državnu granicu sa BiH u naselju Željava	LS	2.425.270	CAPSULA INTERNA	Poslan poziv za završnu kontrolu	2.425.270
4	PR-SMSUNJ-113-11-15	Poljoprivredne površine na području naselja Novoselci i Bobovac	SM	3.172.481	HEKSOGEN	Zaprimljen zahtjev za ZKK	3.172.481
5	PR-SMDVO-048-09-17	Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području Općine Dvor, 4. dio	SM	17.502	DOK-ING razminiranje	Zaprimljen zahtjev za ZKK	17.502
6	PR-SMSIS-043-09-17	Površine na području naselja Mađžari	SM	19.115	ZELENI KVADRAT	Zaprimljen zahtjev za ZKK	19.115
7	PR-SMSUNJ-086-10-16	Livade i šume na području naselja Mađari, Komarevo, Blinjski Kut i Bestрма	SM	1.349.000	ZELENI KVADRAT	Zaprimljen zahtjev za ZKK	1.349.000
8	PR-LSPJE-044-09-17	Područje uz državnu granicu s BiH u naselju Željava, 3. dio	LS	74.981	PIPER	Zaprimljen zahtjev za ZKK	74.981
9	PR-LSPJE-045-09-17	Područje uz državnu granicu sa BiH u naselju Željava, 4. dio	LS	25.880	PIPER	Zaprimljen zahtjev za ZKK	25.880
10	PR-LSPJE-010-03-17	Područje zagađeno NUS-om u naselju Bjelopolje	LS	28.248	TITAN	Zaprimljen zahtjev za ZKK	28.248
11	PR-LSDLA-009-03-17	Područje zagađeno NUS-om u naselju Oraovac	LS	25.228	TITAN	Zaprimljen zahtjev za ZKK	25.228
12	PR-PSPAK-039-05-16	Širi prostor prosjeka i putova na području Ciceľ	PS	199.233	MKA*DEMING	Zaprimljen zahtjev za ZKK	199.233
13	PR-SMDVO-041-09-17	Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području općine Dvor, 3. dio	SM	42.032	TITAN	Zaprimljen zahtjev za ZKK	42.032
15	PR-OBŠOD-027-04-16	Područje ribnjaka i šumska površina u Općini Šodalovci	OB	393.412	HEKSOGEN	završeni poslovi-nije predan zahtjev za ZKK	393.412
				11.639.845			7.779.768

Tablica 3.6. Preostalo za završnu kontrolu kvalitete

R.br.	Oznaka projekta	Naziv projekta	Županija	Površina projekta m ²	Tvrtka	Trenutni status	Površina m ²
1	PR-ZDNOG-014-03-16	Područje zaselaka Grgorići i Narandžići u Općini Noviograd	ZD	71.492	ISTRAŽIVAČ BENZ	Geodetska izmjera	71.492
2	PR-KABAR-012-03-17	Cjelokupni MSP na području općina Barilović i Generalski Stol	KA	533.306	PIPER	Geodetska izmjera	533.306
3	PR-ZDSTA-026-05-17	Područje zaselka Klarići u naselju Bila Vlaka	ZD	39.800	ZELENI KVADRAT	Geodetska izmjera	39.800
4	PR-LSGOS-118-12-15	Poljoprivredne površine između naselja Lički Ribnik i Ornice	LS	4.140.424	ZELENI KVADRAT	Radovi (dorada)	4.140.424
5	PR-SMSUNJ-132-12-15	Poljoprivredne površine na području naselja Mađžari	SM	123.251	CAPSULA INTERNA	Radovi (dorada)	123.251
				4.908.273			4.908.273

Tablica 3.7. Preostalo za izdavanje Potvrda o isključenju

Na projektima razminiranja na kojima su poslovi u tijeku, odnosno koji su započeli u 2017. godini, od ukupno ugovorene površine od 16.370.170 m² razminirana je u 2017. godini površina od 12.401.774 m². Od ukupno odrađenih poslova razminiranja u 2017. godini na površini od 16.548.118 m² potrebno je u 2018. godini izvršiti završnu kontrolu kvalitete i izdati potvrde o isključenju površina iz minski sumnjivih.

Tijekom 2017. godine zaprimljeno je 18 dojava o pronalascima MES-a i NUS-a od čega se 14 pronalazaka odnosilo na područja koja su bila predmet obavljanja poslova, a 4 pronalaska odnosilo se na pronalaska van MSP-a.

RB	Datum pronalaska	Mjesto pronalaska		Pronađeno sredstvo			Pronađeno na području / projektu
		Županija	Općina / Grad	Vrsta	Tip	Količina	Razminirano / Van MSP-a
1	18.12.2016	ZD	Poličnik	nepoznato		1	Van MSP-a
2	22.2.2017.	VS	Vrbanja	PO mina	TMM-1	1	Van MSP-a
3	23.2.2017.	ZD	Zadar	PO mina	TMM-1	1	R
4	24.12.2016.	ZD	Benkovac	NUS	KB-1	1	R
5	5.12.2016.	ZD	Islam Latinski	PP mina	PMA-2	1	R
6	3.4.2017.	ZD	Obrovac	NUS	TMK	3	R
				NUS	ostaci RRB 64 mm Zolja	5	R
				NUS	ostaci motora rakete "Maljutka" 9M14P1	12	R
7	24.3.2017.	ZD	Poličnik	PP mina	PMA-3	1	R
8	5.5.2017.	OB	Tenja	PP mina	PMA-3	1	R
9	05.05.2017.	ŠK	Drniš	PP mina	PMA-2	1	R
10	30.5.2017.		SOMOVAC	NUS	TTM M60	1	Van MSP-a
11	15.5.2017.	LS	Gospić	NUS	KB-1	1	R
12	22.8.2017.	VS	Vinkovci	PP mina	PMR-2A	1	R
13	16.6.2017.	ŠK	Drniš	PP mina	PMA-2	1	R
14	4.9.2017.	OB	Antunovac	NUS	pancimo zrno 100 mm	1	Van MSP-a
	NUS			projektil 76 mm	1		
	NUS			raketni motor M-80 Zolja	1		
15	10.10.2017.	BP	Gornji Bogičevci	PO mina	TMA-5	1	R
16	14.10.2017.	VS	Vrbanja	PP mina	PROM-1	1	R
17	15.10.2017.	OB	Šodolovci	PO mina	TMA-1A	1	R
18	5.11.2017.	OB	Osijek	NUS	RKZ M72	1	R
UKUPNO						39	


Tablica 3.8. Evidencija naknadno pronađenog MES-a i NUS-a

Najveći udio u izvršenim poslovima razminiranja u 2017. godini imale su tvrtke ISTRAŽIVAČ d.o.o. sa 7,63%, DOK-ING Razminiranje d.o.o. sa 7,38% i ZELENI KVADRAT d.o.o. sa 5,38%.

Izvršće o provedbi Plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu

R.br.	Tvrтка	Broj radnih dana	Dani rada pirotehničara	Dani rada strojeva	Dani rada pasa	Realizacija tvrtke u periodu	Udio realizacije tvrtke u odnosu na ukupno realizirano
						m ²	%
1	ALFA RAZMINIRANJE	205	1.534	19	18	514.093	1,33
2	AVATAR RAZMINIRANJE	168	954	15	16	369.883	0,96
3	BIOS-F	226	2.900	86	0	1.105.019	2,87
4	CAPSULA INTERNA	246	2.106	104	257	1.108.709	2,88
5	COR	267	3.177	52	18	1.174.059	3,05
6	CREDO	216	1.196	65	221	697.833	1,81
7	DETEKTOR	242	1.684	14	21	555.258	1,44
8	DETONATOR	198	1.058	15	25	399.410	1,04
9	DIZ-EKO	278	2.455	120	309	1.073.188	2,78
10	DOK-ING	62	36	77	0	1.000	0,00
11	DOK-ING razminiranje	280	6.941	310	44	2.845.053	7,38
12	EXPLORATOR	235	1.669	23	125	687.637	1,78
13	FAS	257	2.736	47	4	1.033.614	2,68
14	FOSSIO	222	2.435	35	260	927.471	2,41
15	HARPIJA	230	2.563	12	2	823.852	2,14
16	HEKSOGEN	286	3.446	186	576	2.038.196	5,29
17	ISTRAŽIVAČ	247	5.869	217	252	2.939.727	7,63
18	ISTRAŽIVAČ BENZ	156	2.775	106	203	1.442.657	3,74
19	LOCO	199	1.151	9	0	364.081	0,94
20	MAGNUS	232	1.632	13	0	537.136	1,39
21	MAPER	196	1.431	8	0	493.385	1,28
22	MINA PLUS	236	3.970	101	164	1.643.891	4,27
23	MINE-EX	162	609	7	4	231.605	0,60
24	MKA*DEMING	235	1.911	16	20	573.108	1,49
25	MUNGOS RAZMINIRANJE	27	531	0	0	110.006	0,29
26	OMNIA MEA	32	218	8	8	61.495	0,16
27	ORKAN	217	1.390	18	91	572.942	1,49
28	PIPER	272	2.075	81	321	1.223.262	3,17
29	PIPER RAZMINIRANJE	232	1.478	65	173	755.899	1,96
30	PITON	244	2.449	73	122	1.011.709	2,63
31	PROLUMIS	217	1.451	48	98	577.454	1,50
32	RUMITAL	242	3.819	133	242	1.513.116	3,93
33	TAURUS RAZMINIRANJE	194	1.019	8	0	346.550	0,90
34	TETRAZEN	256	2.823	18	33	977.847	2,54
35	TITAN	270	4.583	167	211	1.886.132	4,89
36	TNT 7	174	1.892	37	71	875.787	2,27
37	TORNADO RAZMINIRANJE	267	2.400	72	363	1.037.648	2,69
38	ZELENI KVADRAT	241	3.662	208	128	2.074.109	5,38
39	ZIGO	190	2.639	147	86	1.451.985	3,77
40	ZONA RAZMINIRANJE	155	1.055	28	32	479.322	1,24
UKUPNO:		337	89.722	2.768	4.518	38.535.128	100,00

Tablica 3.9. Pregled angažiranja kapaciteta za razminiranje i ostvarena realizacija, po ovlaštenim pravnim osobama

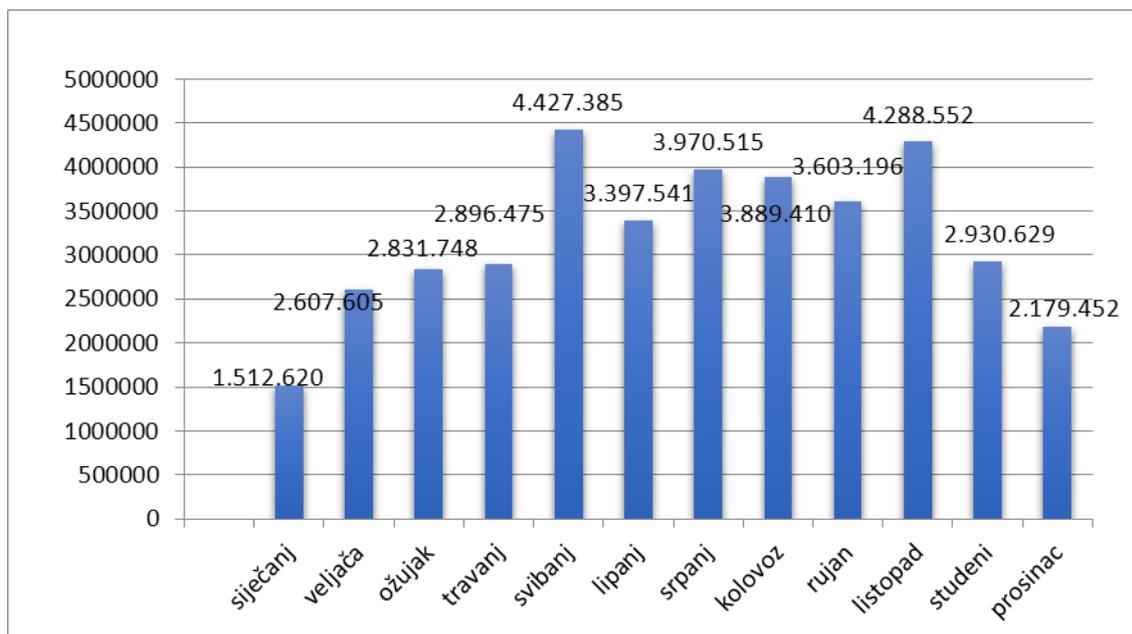

Graf 3.5. Prikaz realizacije poslova razminiranja, po mjesecima

Iz prethodnog grafa vidljivo je da je najveća realizacija poslova razminiranja bila tijekom svibnja, te od srpnja do listopada, iz razloga što su se intenzivno radili poslovi razminiranja poljoprivrednih površina, posebice u Ličko-senjskoj županiji, te poslovi razminiranja ugovoreni iz pretpristupnih fondova i Prijelaznog instrumenta.

OPIS POSLOVA RAZMINIRANJA PREMA ZADANIM CILJEVIMA

3.1.1.1. Izvršenje posljednjih ugovorenih poslova razminiranja u Brodsko – posavskoj županiji s ciljem cjelovitog rješavanja minskog problema Županije

Kao što je i planirano, u 2017. godini završeni su poslovi razminiranja posljednje dvije minski zagađene površine u Općini Okučani. Tijekom izvršenja poslova razminiranja u 2017. pronađeno je i uništeno 8 komada PPM-a i 1 komad NUS-a.

3.1.1.2. Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem poljoprivrednog zemljišta

Jedna od značajnih planiranih zadaća predviđenih za 2017. godinu, zasigurno je rješavanje u najvećoj mjeri minskog problema poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine nastavljeno je sa razminiranjem površina ugovoreni u 2016. godini, a na temelju natječaja za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (nadalje u tekstu: EPFRR) za dodjelu potpore za „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (nadalje u tekstu: APPRRR)

raspisala 4. svibnja 2016. godine. Ugovoreno je svih 17 projekata u 7 županija površine 25.062.140 m². Ukupna vrijednost ugovorenih projekata iznosi 207.179.774,40 Kn sa PDV-om.

Na dan 31. prosinca 2016. godine odrađeno je 4.852.921 m², odnosno 19,36% ugovorene površine.

Do kraja prosinca 2017. godine poslovi razminiranja završili su u svim županijama osim u Požeško-slavonskoj i Ličko-senjskoj županiji (gdje su 4 projekta u mirovanju zbog vremenskih uvjeta) na površini od 22.875.232 m², odnosno 93,01%.

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ MJERA 5.2.2. RAZMINIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA									
II. FAZA									
RB	Županija	Površina m ²	Ugovorena cijena s PDV- om	Realizirano na dan 31.12.2016.	Realizirano na dan 31.12.2017.	Postotak završenih radova (%)	Pronađen MES i NUS		
							PP	PO	NUS
1.	Ličko-senjska	11.253.465	88.153.232,29	0	10.080.775	89,58	432	10	25
2.	Osječko- baranjska	912.748	7.153.662,45	0	912.748	100,00	20	0	36
3.	Požeško- slavonska	3.706.367	31.735.767,44	0	3.148.314	84,94	11	0	1
4.	Splitsko- dalmatinska	1.003.607	9.697.352,64	0	1.003.607	100,00	14	0	1
5.	Sisačko- moslavačka	6.801.122	56.212.882,90	4.808.012	6.786.957	99,79	201	23	14
6.	Šibensko-kninska	669.797	6.915.654,03	0	661.866	98,82	8	0	2
7.	Zadarska	715.034	7.311.222,65	44.909	715.034	100,00	8	0	49
Ukupno		25.062.140	207.179.774,40	4.852.921	22.875.232	93,01	694	33	128

Tablica 3.10. Realizacija na projektima Tip operacije 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednih površina – Faza II

Napomena: Površine završenih projekata "Poljoprivredne površine sjeverno od naselja Košutarice u Sisačko-moslavačkoj županiji", „Poljoprivredne površine na području naselja Mađari u Sisačko-moslavačkoj županiji“, „Poljoprivredne površine na području Novoselci i Bobovac u Sisačko-moslavačkoj županiji“, te "Poljoprivredne površine na području gradova Vodice, Skradina i Drniša te općine Promina u Šibensko-kninskoj županiji" manje su od ugovorenih jer je u toku radova aneksom ugovoru izuzeta površina koja je bila "obrađena" (nasadi u SMŽ i/ili maslinici u ŠKŽ).

Izvršenjem ugovorenih poslova razminiranja poljoprivrednih površina (faza II.) u Ličko-senjskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji u 2017. godini stvorili su se uvjeti za razminiranjem preostalog minski sumnjivog poljoprivrednog zemljišta u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji u I. polugodištu 2018. godine, čijim izvršenjem će se u cijelosti ukloniti minska opasnost s poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske.

Hrvatski centar za razminiranje će nastaviti pružati tehničku pomoć svim sudionicima vezano uz pripremu razminiranja preostalih 10 km² poljoprivrednog zemljišta u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji koji se planiraju razminirati u 2018. godini kroz posljednju fazu provedbe Tipa operacije 5.2.2.

3.1.1.3. Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u Požeško-slavonskoj županiji

Tijekom 2017. godine nastavilo se s poslovima razminiranja onih gospodarskih jedinica, odnosno gospodarskih odjela i odsjeka čije razminiranje će omogućiti eksploataciju drvene mase, kao i održavanje vrijednog šumskog dobra i šumskih prometnica te će se doprinijeti povećanju sigurnosti djelatnika Hrvatskih šuma d.o.o.

Na području Požeško-slavonske županije planirane su za razminiranje prioritetne šumske površine u gospodarskoj jedinici Sjeverni Psunj-Javorovica u Gradu Pakracu u nadležnosti UŠP Bjelovar, ukupne površine 1,4 km² unutar sljedećih odjela: 25a, 27e, 28a, 29a, 30a, 33a, 33b, 33e, 34b, 34c, 35b, 35d, 35e, 60a, 60b, 60d, 62a, 62b, 65a, 66a, 67a, 69a, 78b, 96a, 97a, 98a, 98c. Navedeno je planirano za II. i III. kvartal 2017. godine. Postupak javne nabave proveden je u rujnu 2017. godine, a ugovori sa najpovoljnijim izvoditeljima zaključeni krajem listopada. Sredstva za izvršenje poslova su osigurana Državnog proračuna s pozicija naknade za korištenje OKFŠ-a.

3.1.2. Smanjenje MSP-a provedbom općeg i tehničkog izvida

Usporedo s poslovima razminiranja MSP-a koji su obavljale ovlaštene pravne osobe, izvidnički timovi Hrvatskog centra za razminiranje su u 2017. godini vršili ciljano izviđanje sa svrhom ažuriranja podataka o MSP-u.

Na području šest županija Hrvatski centar za razminiranje obavljao je i poslove tehničkog izvida unutar poligona kategoriziranih za pretraživanje s ciljem dodatne provjere podataka, odnosno kao potpora aktivnostima općeg izvida. Tehnički izvid je obavljen unutar poligona ukupne površine 9.695.848 m².

Izvršavanje navedenih poslova, sukladno Standardnom operativnom postupku SOP 01.01. Opći izvid, rezultiralo je povećanjem MSP Republike Hrvatske u 2017. godini za 3.095.656 m².

Sukladno navedenom, Plan protuminskog djelovanja za 2017. godinu u dijelu koji se odnosi na opći i tehnički izvid je ostvaren sa 47,2%.

Rb.	Županija	Planirani površina za poslove općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida	Smanjenje MSP-a poslovima općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida
		km ²	km ³
1	Brodsko-posavska	0,0	0,0
2	Karlovačka	0,4	0,2
3	Ličko-senjska	1,7	-3,7
4	Osječko-baranjska	2,2	2,2
5	Požeško-slavonska	1,7	2,7
6	Splitsko-dalmatinska	0,0	0,0
7	Sisačko-moslavačka	0,0	1,9
8	Šibensko-kninska	1,6	2,0
9	Zadarska	6,4	1,4
UKUPNO		13,9	6,6

Tablica 3.11. Ukupno planirano i ostvareno smanjenje MSP-a općim i tehničkim izvidom po županijama

Hrvatski centar za razminiranje je izvršio poslove tehničkog izvida na svim planiranim površinama.

Tijekom izvršenja poslova općeg izvida osim isključivanja površina iz minski sumnjivih temeljem novih saznanja o minskog zagađenosti dio površina je uključen u minski sumnjive.

Izvršenje ovih poslova rezultiralo je smanjenjem MSP u veličini od 6,6 km².

3.1.2.1. Povećanje MSP-a provedbom općeg izvida

Rb.	Županija	Ukupna uključenja u MSP općim izvidom
		m ²
1	Brodsko-posavska	0
2	Karlovačka	124.313
3	Ličko-senjska	5.462.585
4	Osječko-baranjska	32
5	Požeško-slavonska	0
6	Splitsko-dalmatinska	0
7	Sisačko-moslavačka	64.491
8	Šibensko-kninska	48.971
9	Zadarska	13.297
UKUPNO		5.713.689


Tablica 3.12. Ukupno uključena površina u MSP općim izvidom po županijama

Kako je i ranije navedeno u 2017. godini provedbom općeg izvida u cilju ažuriranja MSP-a i za potrebe izrade idejnih planova razminiranja, sukladno dobivenim novim podacima tijekom godine, Hrvatski centar za razminiranje je površinu veličine 5.7 km² unutar 5 županija uključio u minski sumnjivu.

3.1.3. Struktura planirane površine za razminiranje, tehnički i opći izvid

Hrvatski centar za razminiranje izvršava analizu podataka vezanih uz strukturu MSP-a korištenjem podataka o kategorizaciji zemljišnog pokrova tvrtke Hrvatske šume d.o.o., Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Agencije za zaštitu okoliša i Državne geodetske uprave.

Temeljem provedene analize strukture površina u MSP-u, krajem 2017. godine, utvrđeno je 4,3% MSP-a Republike Hrvatske kao poljoprivredne površine, 95,3% MSP-a kao šumske površine te 0,4% MSP-a kao ostale površine (vode, močvarno zemljište, stijene, klizišta, kamenari, obale i dr.).

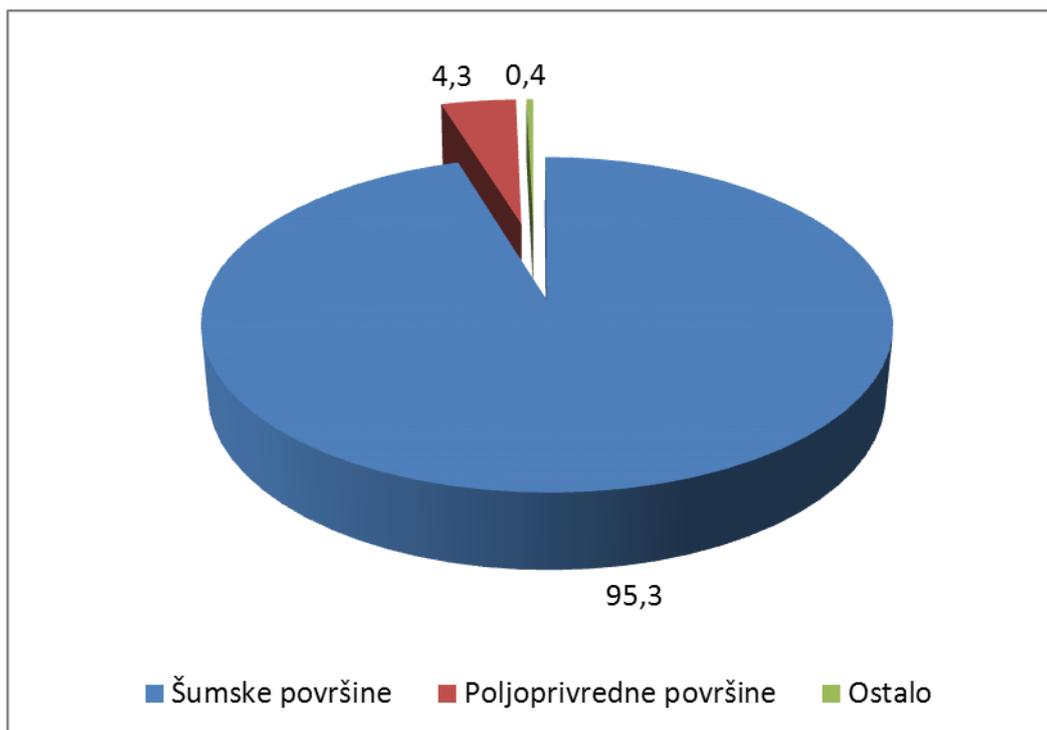

Graf 3.6. Struktura MSP-a Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 2017. godine

3.2. Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog minski sumnjivog prostora i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima

Usporedo s provedbom općeg i tehničkog izvida i poslova razminiranja u 2017. godini, jedna od težišnih aktivnosti Hrvatskog centra za razminiranje bila je provedba i kontrola obilježenosti i prema potrebi, dodatno obilježavanje minski sumnjivog područja i područja zagađenog isključivo NUS-om radi stvaranja jasne granice između sigurne i minski sumnjive površine ili površine zagađene isključivo NUS-om.

Informacije o položaju oznaka o opasnostima od mina i mogućem pronalasku NUS-a su jedan od temeljnih elemenata informacijskog sustava koji je dostupan svim građanima Republike Hrvatske i gostima koji dolaze u našu zemlju putem Interneta kroz MISportal na kojem se stanje miniranosti, zagađenosti isključivo NUS-om i obilježenosti MSP-a, tjedno ažurira. Zemljovidi miniranosti i zagađenosti isključivo NUS-om s podacima o postavljenim oznakama upozorenja su se i u 2017. godini dostavljali tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, policijskim upravama te drugim fizičkim i pravnim osobama na zahtjev.

Na dan 1. siječnja 2017. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 14.088 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplozivnih ubojnih sredstava te se prostirao unutar 65 gradova i općina u 9 županija.

Dana 31. prosinca 2017. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 13.563 oznake koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksploziviranih ubojnih sredstava i prostirao se unutar 61-og grada i općine u 9 županija.

3.3. Provođenje informiranja i edukacije o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

Hrvatski centar za razminiranje, u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnog sektora i lokalnim stanovništvom, kontinuirano je tijekom 2017. godine provodio informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Ukupno je planirano 75 aktivnosti edukacije i informiranja stanovništva i ciljanih skupina o minskoj opasnosti u 2017. godini.

3.3.1. Edukacija o opasnostima od mina

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine kroz 77 aktivnosti informirano i educirano je 27.893 osoba o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Informiranje i edukacije su održane u 14 županija i Gradu Zagrebu, u 52 grada/općine (građani, učenici, planinari, članovi Hrvatskog lovačkog saveza, Hrvatskih šuma, HEP-a, Gorske službe spašavanja, poljoprivrednici, izviđači-volonteri, i drugi).

Također, održan je jedan koordinativni sastanak, dana 31. svibnja 2017. godine u Uredu za razminiranje sa svim subjektima koji sudjeluju u edukaciji o minskoj opasnosti.

Edukacije su najvećim dijelom pratile idejne planove razminiranja na području minski zagađenih županija u skladu s Godišnjim planom razminiranja za 2017. godinu.

Sva informiranja i edukacije o opasnostima od MES-a i NUS-a su popraćena javnim i lokalnim medijima, a Hrvatski centar za razminiranje je na svom web portalu redovito i ažurno objavljivao informacije o provedenim aktivnostima.

Rb.	Edukacija o opasnostima od mina	Planirane edukacije	Izvršene edukacije	Realizirano u 2017. godini %
1.	Godišnji plan protuminskog djelovanja	35	28	80,0
2.	Na poziv	25	28	112,0
3.	Prema ciljanim skupinama	15	15	100,0
4.	Godišnji plan protuminskog djelovanja - edukacija ciljanih skupina	0	3	0,0
5.	U skladu sa pozivom TDU i drugih institucija	0	3	0,0
UKUPNO		75	77	102,7
6.	Stručna radionica za osposobljavanje djelatnika HCR-a	1	1	100,0

Tablica broj 3.13. Izvršenje edukacija o opasnosti od mina u 2017. godini

Najveći broj informiranja i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a je obavljen u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i nadležnim policijskim upravama u kampanji Ministarstva unutarnjih poslova „Manje oružja, manje tragedije“ (63 edukacije na kojima je sudjelovalo 26.828 osoba).

Najveći broj posjetitelja je bio u sklopu aktivnosti: Dani Zaštite i sigurnosti u Zagrebu, Sajmu lova, ribolova, prirode i turizma u Varaždinu, Danima lova i ribolova u Zagrebu. Danima Policije u Požegi, 14. Sajma lova i ribolova SALORI u Osijeku, Manifestaciji „Zdrav za 5“ u Sisku, 10. konferenciji „Dani kriznog upravljanja“ u Tuheljskim Toplicama, Petrovo u Kutini, Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici, OŠ „Grigor Vitez“ u Zagrebu u sklopu Obilježavanja Dana škole i humanitarne akcije prikupljanja novca za razminiranje MSP-a u blizini OŠ Komarevo, te pri obilježavanju „4. travnja“ - Međunarodnog dana svjesnosti opasnosti od mina i pomoći u protuminskom djelovanju u Glini.


Provedene su i edukacije ciljanih skupina: djece u minskom okružju, lovaca, planinara, djelatnika sigurnosti HŠ i volontera kampa Podum te edukaciji djece iz Armenije i Iraka u Novom Vinodolskom, branitelja 100%-tnih invalida Domovinskog rata i branitelja JSP „Osa“ u Varaždinskim Toplicama.

Najveći broj aktivnosti informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova u 2017. godini HCR je ostvario u suradnji sa: MUPRH, HCK i Udrugom Hrvatska pomaže.

3.3.2. Žrtve mina


U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine nije bilo minskih incidenata i nesreća.

Od 1.1.1996. godine do 31.12.2017. godine dogodilo se 423 minska incidenata i nesreća u kojima je ukupno stradalo 595 osoba. Smrtno je stradalo 203 osobe, teške tjelesne ozljede zadobilo je 271 osoba dok ih je 120 zadobilo lake tjelesne ozljede.

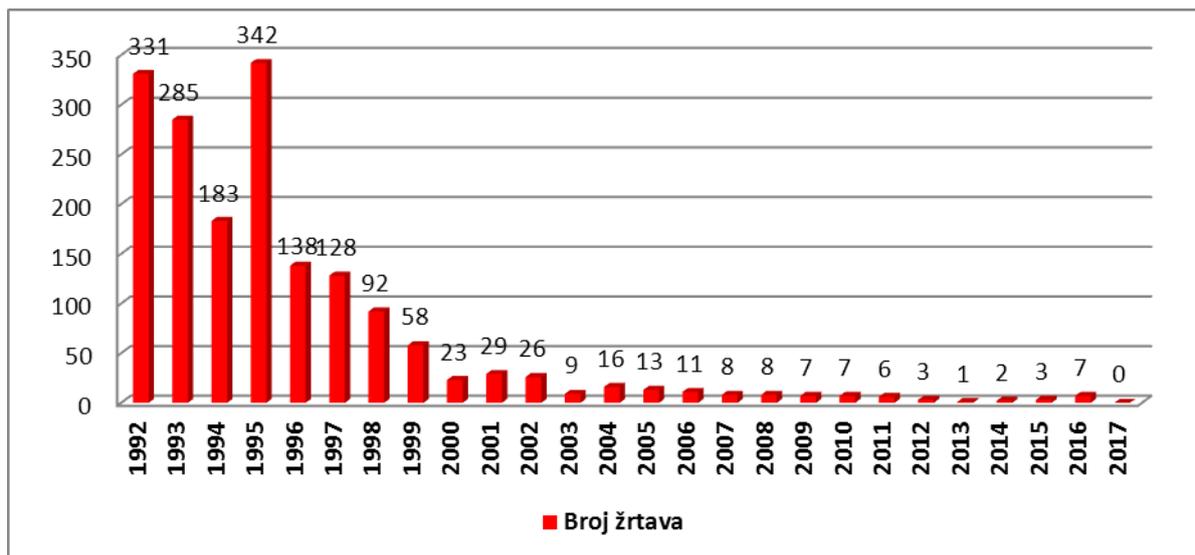

Graf broj 3.7. Broj ųrtava mina u razdoblju 1991.-2017. godina

Ukupno je u Republici Hrvatskoj od 1991. godine do 31. prosinca 2017. godine u 1.367 minka incidenta i nesreća stradalo 1.999 osobe od čega 518 osoba smrtno.

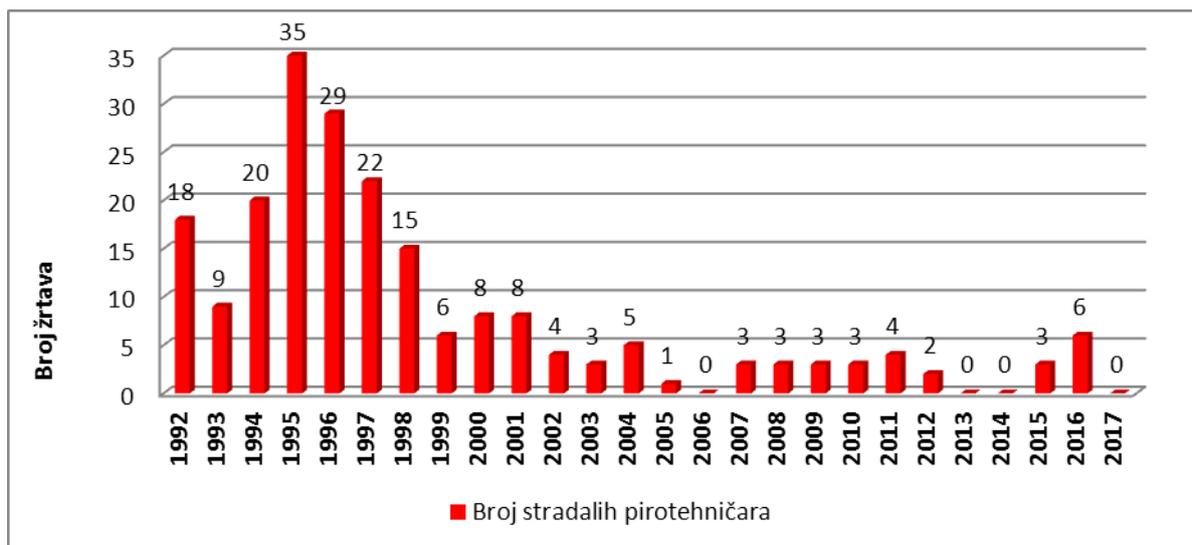

Graf 3.8. Broj stradalih pirotehničara po godinama

3.4. Promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici s ciljem stvaranja uvjeta za nastavljnje provođenja poslova iz područja protuminskog djelovanja po izvršenju obveza proisteklih iz konvencija

Hrvatski centar za razminiranje i ostali dionici sustava protuminskog djelovanja su, u cilju promocije hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici, provodili brojne aktivnosti prema međunarodnoj zajednici, diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj i predstavnicima donatorskih zemalja:

- 26. siječnja u Hrvatskom centru za razminiranje boravila je delegacija Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom je prezentiran rad Centra kroz postignuća i izazove te doprinos EU-a u protuminskom djelovanju u RH, odnosno iskustva Centra u povlačenju sredstava iz pretpristupnih fondova EU-a.
- 21. veljače, Veleposlanica Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj N.J.E. Smiljana Knez, koja je u nastupnom posjetu boravila u Županiji Sisačko-moslavačkoj te Gradu Sisku, posjetila je i Hrvatski centar za razminiranje.
- Od 20. ožujka do 08. travnja - Regionalni tečaj za više rukovoditelje u protuminskom djelovanju i uklanjanju eksplozivnih ostataka rata, održan je u Biogradu. Tečaj su u suradnji s Hrvatskim centrom za razminiranje, HCR-Centrom za testiranje, razvoj i obuku d.o.o. i Uredom za razminiranje proveli Centar za međunarodnu stabilizaciju i oporavak (Centre for International Stabilization and Recovery – CISR) i Škola za poslovanje (College of Business - CoB) Sveučilišta James Madison (James Madison University – JMU) koji već nekoliko godina provode programe edukacije za rukovoditelje u sustavu protuminskog djelovanja. „Regionalni tečaj za više rukovoditelje u protuminskom djelovanju i uklanjanju eksplozivnih ostataka rata“ integrirao je najnovija postignuća na području poslovnog upravljanja s praktičnim znanjima i iskustvima djelatnika u protuminskom djelovanju i uklanjanju eksplozivnih ostataka rata. Krajnji cilj ovog programa je bio stvoriti uvjete da upravljački segment u nacionalnim protuminskim sustavima ovlada dodatnim vještinama potrebnim za uspješniji i učinkovitiji rad odnosno upravljanje svojim sustavima). Na tečaju je sudjelovalo 20 sudionika – polaznika iz 12 zemalja (Albanije, Armenije, Azerbajdžana, BiH, Gruzije, Hrvatske, Kolumbije, Kosova, Slovenije, Srbije, Turske i Ukrajine te 6 predavača (JMU) i 9 gostujućih predavača iz regije. Tečaj je uspješno organiziran i proveden.
- Predstavnici Hrvatskog centra za razminiranje prisustvovali su Godišnjem sastanku ravnatelja nacionalnih protuminskih programa i UN-ovih savjetnika u veljači u Ženevi, te polugodišnjem i godišnjem sastanku država stranaka Ottawske konvencije u lipnju u Ženevi, odnosno u prosincu u Beču.
- 31. ožujka u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH održane su političke konzultacije između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Republike Kolumbije koju je predstavljala zamjenica ministrice vanjskih poslova Kolumbije.
- od 25. do 27. travnja 2017. godine održan je međunarodni simpozij „Protuminsko djelovanje 2017.“ Biogradu na Moru. Zemlje partneri su bile Kraljevine Norveške i Kolumbija. U okviru navedenog simpozija „Protuminskog djelovanje 2017.“ održano je nekoliko bilateralnih sastanaka.

- Krajem travnja je održan sastanak sa predstavnicima talijanske Udruge za humanitarno razminiranje HDIG u cilju uspostavljanja moguće suradnje. Tada je otvorena mogućnosti za daljnju suradnju te pomoć Udruzi oko registracije kao preduvjetu djelovanja U Republici Hrvatskoj.
- Radni sastanak Hrvatskog centra za razminiranje održan je i s predstavnicima konzultantske firme koja djeluje na području protuminskog djelovanja iz Iraka, na kojem se između ostalog, razgovaralo o mogućnostima obuke stručnjaka u protuminskom djelovanju od strane HCR-CTRO-a te prenošenju iskustava glede edukacije o minskoj opasnosti, čemu bi prethodilo potpisivanje Sporazuma o suradnji.
- 27. travnja u Biogradu na Moru održan je sastanak sa predstavnicima iz Ukrajine nadležnima za razminiranje. Sastanak je nastavak na održani sastanak u Zagrebu početkom lipnja s Vadyma Chernysha, ministrom privremeno okupiranog područja i raseljenih osoba Ukrajine. Centar kao krovna institucija protuminskog sustava Republike Hrvatske, spreman je oformiti tim stručnjaka koji bi Ukrajini prezentirali sastave elemente navedenog (zakonski i podzakonski akti, dionici sustava, metode utvrđivanja minski sumnjivog prostora, model ustupanja poslova razminiranja, metode poslova razminiranja, nadzor kvalitete, oprema za razminiranje, certificiranje stručnjaka, pravnih osoba i opreme, obilježavanje MSP-a, edukacija stanovništva o opasnosti itd.).
- 17. i 18. svibnja 2017. godine HCR je ugostio gđu. Pinches iz „Mine Action Review“ odnosno organizacije Norveške narodne pomoći pri čemu su organizirani i održani razgovori sa svim dionicima protuminskog sustava RH za potrebe izrade godišnjeg izvještaja i praćenja realizacije obveza prema potpisanim međunarodnim konvencijama.
- 28. kolovoza 2017. godine, HCR je ugostio g. Casnovu iz Italije s partnerima, te su tom prilikom pružene informacije za potrebe snimanja dokumentarnog filma o minama na području jugoistočne Europe pri čemu je održana i prezentacija protuminskog sustava RH.
- HCR je pružio potporu Udruzi za podršku i poticanje zajedništva „Hrvatska pomaže“ u organizacijskoj provedbi posjete 22 djece iz Iraka, s pratiteljima, koja su od 28. kolovoza 2017. godine boravila u odmaralištu Crvenog križa Grada Zagreba u Novom Vinodolskom
- Od 4. do 6. rujna 2017. godine HCR je prisustvovao na 7. sastanku država stranaka Konvencije o kazetnom streljivu koji se održavao u Ženevi
- 10. listopada predstavnici HCR-a prisustvovali su recepciji u veleposlanstvu SAD-a u RH povodom imenovanja novih dužnosnika

- Od 16. do 18. listopada 2017. godine predstavnici HCR-a prisustvovali su na „Međunarodnoj konferenciji u povodu 20. godišnjice Konvencije o zabrani protupješačkih mina“, koju su u Zagrebu organizirali Ured za razminiranje, RACVIAC – Središte za sigurnosnu suradnju u JI Europi i Veleposlanstvo Kanade u Hrvatskoj. Za sudionike predmetne konferencije HCR je organizirao posjet radilištu razminiranja na području naselja Mađari, Komarevo, Blinjski Kut i Bestrna u Sisačko-moslavačkoj županiji, financiranog sredstvima Europske unije.
- Od 24. listopada do 2. studenoga predstavnik HCR-a bio je u službenoj posjeti Republici Kolumbiji gdje je prisustvovao Trećoj znanstveno-tehnološkoj konferenciji o humanitarnom razminiranju, te kao član delegacije predvođene državnom tajnicom u MVEP-u Zdravkom Bušić sudjelovao u nizu bilateralnih radnih sastanaka
- U periodu od 8. do 10. studenog 2017. godine u Sarajevu je održana Regionalna stručna radionica za države JIE na temu provedbe članka 4. Konvencije o kazetnom streljivu (izvid i uklanjanje kazetnog streljiva i njihovih ostataka). Radionicu je organizirala Nizozemska i Norveška kao tematski koordinatori za provedbu članka 4. Konvencije. Uvodno je održan posjet radilištu uklanjanja kazetnog streljiva u Općini Olovo. Na radionici su sudjelovali predstavnici BiH, Crne Gore i Kosova, kao i predstavnici NPA i HELO Trusta te Ženevskog centra država donatora Švicarska, Njemačka, SAD i NATO u BiH. U sklopu radionice HCR-ovu pripremljenu prezentaciju „Čišćenje kazetnog streljiva u RH“ održao je Ured za razminiranje.
- Od 26. do 30. studenoga 2017. godine HCR je ugostio delegaciju Ministarstva obrane Kraljevine Saudijske Arabije pri čemu je održana prezentacija protuminskog sustava RH kao i upoznavanje predstavnika Saudijske Arabije sa ključnim dionicima sustava. Saudijsko izaslanstvo činili su predstavnici Zapovjedništva za inženjeriju, Zapovjedništva za pješaštvo, Zapovjedništva oružanih snaga, Ureda zapovjednika Glavnog stožera te Zapovjedništva mornarice Ministarstva obrane.
- Od 6. do 9. prosinca 2017., u Ukrajini je boravilo izaslanstvo Hrvatskog centra za razminiranje te predstavnica HCR-Centra za testiranje, razvoj i obuku. Posjet je organiziran u sklopu djelovanja Radne skupine za suradnju između Hrvatske i Ukrajine na temu razmjene iskustava u području razminiranja i mogućnosti adaptacije/implementacije istih u Ukrajini, a domaćin samog posjeta bilo je Ministarstvo za privremeno okupirana područja i raseljene osobe Ukrajine. Posjet je organiziran uz potporu Veleposlanstva Švicarske Konfederacije, s time da su značajnu organizacijsku potporu pružili i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ukrajini te misija OESS PCU.

- od 18. do 21. prosinca 2017. godine, u Beču je održan 16. sastanak država stranaka Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje, i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Otawska konvencija) na kojoj je sudjelovala predstavnica Hrvatskog centra za razminiranje.

3.5. Pružanje tehničke pomoći u projektima koji će se financirati sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.

3.5.1. Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko – dravskoj regiji – Naturavita

U Operativnom programu za konkurentnost i koheziju utvrđen je specifični cilj 6iii3: Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima i područjima mreže NATURA 2000.

Unutar ovog specifičnog cilja moguće je financirati sljedeće aktivnosti iz protuminskog djelovanja: uklanjanje mina i neeksplozivnih ubojnih sredstava, uključujući aktivnosti podizanja svijesti o minama, osiguravanje sigurnog kretanja građana uz područja na kojima su prisutne mine ili se sumnja na prisutnost mina te time stvaranje uvjeta za održivo upravljanje tim područjima; aktivnosti podizanja svijesti o bioraznolikosti i važnosti održivog gospodarenja šumama i šumskim zemljištem unutar mreže NATURA 2000 koja su zagađena ili se sumnja na zagađenost minama ili su donedavno bila zagađena minama i stoga se njima nije moglo upravljati.

Hrvatski centar za razminiranje s partnerima (Hrvatske šume d.o.o., Ured za razminiranje, Hrvatske vode, Agencija za regionalni razvoj RH i JU Park prirode „Kopački rit“) planirao je u 2017. godini prijaviti projekt „Naturavita“ za financiranje sredstvima ESI fondova – prijava se temelji na Studiji izvodljivosti i projektnoj aplikaciji za projekt „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog, zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita“, te po odobrenju projekta i potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava provoditi aktivnosti koji su u njegovoj nadležnosti, a sukladno obvezama propisanim u Partnerskom sporazumu s Glavnim partnerom, Hrvatske šume d.o.o. te proračunu projekta i Projektnoj aplikaciji.

Obzirom da je nakon mnogobrojnih sastanaka, konzultacija partnera, dorade dokumentacije od strane Konzultanta tijekom godine, Projektna aplikacija i Obrazac za prijavu predan Korisniku-tvrtki Hrvatske šume d.o.o. dana 15. prosinca 2017. godine, nisu mogle započeti ostale planom predviđene aktivnosti.

Projektna aplikacija te Obrazac za prijavu projekta poslani su JASPERS-u 19. prosinca 2017. godine, dok je Konzultantu 21. prosinca 2017. godine isplaćeno posljednjih 10% ugovorenih sredstava za izradu istih.

Sve daljnje aktivnosti planiraju se za 2018. godinu.

3.5.2. „Karlovac Karst“

U 2017. godini trebalo se započeti sa pripremom projekta naziva „KARLOVAC KARST“ na način da se sklopi Sporazum o partnerstvu s Karlovačkom županijom u cilju pripreme projekta kojim bi se razminiralo i omogućilo upravljanje na svim županijskim zaštićenim područjima, Natura 2000 područjima. Sporazumom se planiralo razraditi projektna ideja te vrstu i količinu potrebne popratne dokumentacije bez kojih nije moguća prijava za financiranje iz sredstava ESI fondova.

U sklopu ovog projekta planira se razminiranje i obnova degradiranih i zapuštenih šumskih ekosustava brda Krpel, odnosno područja uz bivšu vojarnu u naselju Oštarije u Općini Josipdol, uz koju je nakon eksplozija u Domovinskom ratu na velikoj površini ostao razasut veliki broj različitog MES-a i NUS-a.

U 2017. godini nije započeto s pripremom ovog projekta jer niti kapaciteti u Hrvatskom centru za razminiranje, niti u Karlovačkoj županiji nisu bili dostatni, a i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ovaj projekt na listi strateških unutar specifičnog cilja 6iii3, vodi iza projekta Fearless Velebit.

3.5.3. Fearless Velebit

Priprema ovog projekta sukladno razgovorima s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te budućim Korisnikom tvrtkom Hrvatske šume d.o.o. započet će po dobivanju Completion note-a za projekt Naturavita. Projektom se planira razminirati i obnoviti degradirane i zapuštene šumske ekosustave u Parku prirode Velebit i ostalim NATURA 2000 područjima u Ličko-senjskoj županiji.

3.5.4. Tip operacije 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine nastavljeno je sa razminiranjem površina ugovorenih u 2016. godini, a na temelju natječaja za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za dodjelu potpore za «Razminiranje poljoprivrednog zemljišta» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je 4. svibnja 2016. godine. Ugovoreno je svih 17 projekata u 7 županija površine 25.062.140 m². Ukupna vrijednost ugovorenih projekata iznosi 207.179.774,40 kn sa PDV-om.

Do kraja prosinca 2017. godine poslovi razminiranja završili su u svim županijama osim u Požeško-slavonskoj i Ličko-senjskoj županiji (gdje su 4 projekta u mirovanju zbog vremenskih uvjeta). U tijeku je završna analiza na temelju koje slijedi izdavanje Potvrda o isključenju područja iz MSP-a.

Red. br	Županija	Naziv idejnog plana	Oznaka	Ugovorena površina m ²	Realizirano na dan 31.12.2017.	Postotak završenih radova (%)
1	LSŽ	Poljoprivredne površine u naselju Agabe i Čanak	PR-LSPJE-120-12-15	2.074.952	2.074.952	100,00
2		Poljoprivredne površine na području Tromede i Bliznice te u naselju Jurkovići	PR-LSGOS-121-12-15	1.739.115	1.550.747	89,17
3		Poljoprivredne površine u naselju Donji Vaganac	PR-LSPJE-122-12-15	1.159.200	799.201	68,94
4		Poljoprivredne površine na području Obljajac te u naseljima Novoselija i Veljun	PR-LSGOS-119-12-15	607.169	486.605	80,14
5		Poljoprivredne površine u naseljima Barlete i Bilaj	PR-LSGOS-117-12-15	1.532.605	1.028.846	67,13
6		Poljoprivredne površine između naselja Lički Ribnik i Ornice	PR-LSGOS-118-12-15	4.140.424	4.140.424	100,00
7	OBŽ	Preostale poljoprivredne površine na području Osječko-baranjske županije, 1.dio	PR-OBSOD-128-12-15	912.748	912.748	100,00
8	PSŽ	Poljoprivredne površine Požeško-slavonske županije	PR-PSPAK-129-12-15	3.706.367	3.148.314	84,94
9	SDŽ	Poljoprivredne površine na području općine Hrvace	PR-SDHRV-115-11-15	1.003.607	1.003.607	100,00
10	SMŽ	Poljoprivredne površine na području naselja Mađari	PR-SMSUNJ-132-12-15	125.571	123.251	98,15
11		Poljoprivredne površine na području Grada Gline i Općine Gvozđ	PR-SMGLI-127-12-15	2.077.944	2.077.944	100,00
12		Poljoprivredne površine na području naselja Gora	PR-SMPET-131-12-15	402.627	402.627	100,00
13		Poljoprivredne površine uz naselje Kričke u Gradu Novska	PR-SMNOV-130-12-15	759.286	759.286	100,00
14		Poljoprivredne površine sjeverno od naselja Košutarice	PR-SMJAS-111-11-15	256.648	251.368	97,94
15		Poljoprivredne površine na području naselja Novoselci i Bobovac	PR-SMSUNJ-113-11-15	3.179.046	3.172.481	99,79
16	ŠKŽ	Poljoprivredne površine na području gradova Vodice, Skradina i Drniša te Općine Promina	PR-ŠKDRN-116-11-15	669.797	661.866	98,82
17	ZAŽ	Poljoprivredne površine u Zadarskoj županiji	PR-ZDZDO-112-11-15	715.034	715.034	100,00
Ukupno				25.062.140	23.309.301	93,01

Tablica 3.14. Prikaz ugovorenih poslova (Tip operacije 5.2.2. – II. Faza) i njihova realizacija

Napomena: Površine završenih projekata "Poljoprivredne površine sjeverno od naselja Košutarice u Sisačko-moslavačkoj županiji", "Poljoprivredne površine na području naselja Mađari u Sisačko-moslavačkoj županiji", "Poljoprivredne površine na području naselja Novoselci i Bobovac u Sisačko-moslavačkoj županiji", te "Poljoprivredne površine na području gradova Vodice, Skradina i Drniša te općine Promina u Šibensko-kninskoj županiji" manje su od ugovorenih jer je u toku radova aneksom ugovoru izuzeta površina koja je bila "obrađena" (nasadi u SMŽ i/ili maslinici u ŠKŽ).

3.5.5. Švicarski program pomoći

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i

socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji će se provoditi u razdoblju od 2016. do 2024. godine potpisan je u lipnju 2015. godine.

Švicarsko–hrvatski program suradnje poduprijet će aktivnosti koji na direktan način omogućavaju boljitak građana Republike Hrvatske i to kroz osam projekata između kojih je i „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ koji se sastoji od razminiranja zaštićenog šumskog zemljišta, ali i društveno-gospodarske integracije žrtava mina. U okviru projekta Hrvatski centar za razminiranje ima ulogu Izvršne agencije, Ured za razminiranje ulogu Posredničkog tijela dok Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije djeluje kao Nacionalna koordinacijska jedinica.

Za navedeni projekt predviđena je ukupna vrijednost od 3,53 milijuna CHF, od čega bi švicarska darovnica iznosila 3 mil. CHF, a udio proračuna RH 530.000 CHF. Projekt će omogućiti realizaciju poslova razminiranja 1,8 km² minskih polja unutar Kotar šume u Sisačko-moslavačkoj županiji i provedbu ostalih poslova iz protuminskog djelovanja povezanih s poslovima razminiranja.

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje stupio je na snagu 9. siječnja 2017. godine, o čemu nas je izvijestilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 25. siječnja 2017. godine.

Dana 27. travnja 2017. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije obavjestilo je HCR da su 18. travnja 2017. od strane Švicarske agencije za razvoj i suradnju zaprimili odobrenje projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“. Projekt je odobren uz sljedeće uvjete:

- revidirana logička matrica: dorada ishoda, indikatora, polaznih vrijednosti i ciljeva (rok: kolovoz 2017. godine)
- koncept baze podataka o žrtvama stradalim od mina (rok: prosinac 2017. godine)
- pomoć žrtvama stradalim od mina: odabir partnera za provedbu aktivnosti pomoći žrtvama stradalim od mina i dovršena procjena potreba (rok: 2018. godina).

Dana 30. svibnja 2017. godine u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje potpisan je ugovor između Švicarske Agencije za razvoj i suradnju i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt Razminiranje i društveno-gospodarska integracija. Po navedenom su u toku godine provedene sjedeće aktivnosti:

- Dana 5. rujna 2017. održan je redoviti mjesečni sastanak s predstavnicima Posredničkog tijela i Nacionalne koordinacijske jedinice u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije pri čemu su razmotrene dosadašnje te definirane buduće aktivnosti. Usuglašena je izrada Plana nabave te popratne dokumentacije vezane uz Ugovor o provedbi odnosno formiranju Upravljačkog odbora projekta. U tijeku je priprema dokumentacije za nadmetanje za poslove razminiranja koja nakon izrade i objave mora biti odobrena od strane Švicarske agencije za razvoj i

suradnju, kao i drugi poslovi pripreme koncepta Baze minskih žrtava odnosno planiranog natječaja za tehničku potporu.

- Dana 12. rujna, 2017. godine Posredničkom tijelu poslan je prijedlog dokumentacije za nadmetanje za aktivnost razminiranja.
- Dana 15. rujna, 2017. godine Posredničkom tijelu poslana je dokumentacija vezana uz Plan nabave i elaboraciju, Ugovor o provedbi, Postupovnik o radu Upravljačkog odbora, Logička matrica s dodatnim komentarima te obrazloženje koncepta Baze minskih žrtava (kroz dodatna usklađivanja konačan sadržaj dokumentacije dostavljen 9. listopada).
- Dana 18. rujna, 2017. godine održan je sastanak s predstavnicima Uprava šuma Podružnica Sisak kako bi se isti upoznali s glavnim odrednicama projekta te pružili potporu u vidu dokumentiranja i uključivanja projektnog područja u plan gospodarenja šumama po završetku aktivnosti razminiranja.
- Dana 27. listopada 2017. godine održan sastanak s predstavnicima Posredničkog tijela na kojem se usklađivala dokumentacija i razmatrao daljnji tijek projektnih aktivnosti.
- Dana 13. studenoga 2017. godine održan je redoviti mjesečni sastanak s predstavnicima posredničkog i kontrolnog tijela u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU pri čemu su razmotrene dosadašnje te definirane buduće aktivnosti.
- U razdoblju 15 -16. studenoga 2017. godine održan je sastanak u prostorijama MRRFEU-a sa predstavnicima Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) te Državnog tajništva za gospodarstvo (SECO) Švicarske Konfederacije u okviru tehničke misije projekta. Drugi dan posjete, za g. Ralph Ammanna, programskog menadžera Državnog tajništva za gospodarstvo (SECO) Švicarske Konfederacije, u pratnji predstavnika Posredničkog i Kontrolnog tijela, organiziran je posjet Hrvatskom centru za razminiranje te projektnom području Kotar šume, gdje su održane prezentacije protuminskog sustava odnosno konkretnog projekta.
- Do dana 12. prosinca 2017. godine, putem i uz suglasnost Posredničkog tijela, a prema Kontrolnom tijelu, poslana je cjelokupna dokumentacija nabave vezana uz provedbu aktivnosti razminiranja, konačni prijedlog komunikacijskog plana te druga pojašnjenja odnosno operativni dokumenti vezani uz provedbu projekta.

3.5.6. INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

Unutar INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. projekt naziva „Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata“ uvršten je kao strateški projekt. Vodeći partner je Hrvatski centar za razminiranje, a projektni partneri s mađarske strane su policija pokrajine Baranya te Nacionalni park Drava-Dunav iz Mađarske. Unutar ukupnog proračuna koji iznosi 3.529.399,70 EUR za aktivnosti koje provodi Hrvatski centar za razminiranje odobreno je 1.789.181,74 EUR. Ugovor o sufinanciranju s Upravljačkim tijelom potpisan je 21. srpnja 2016. godine.

Ukupno ugovorena i razminirana površina iznosi 1.456.319 m², a preostala ugovorena površina koja se razminirala u 2017. godini iznosi 3.400 m². U suradnji s Državnom geodetskom upravom, u sklopu projekta bit će dopunjene i obnovljene i granične oznake između Republike Hrvatske i Mađarske na dijelu sektora D od granične oznake D1 – D211 te od D260 –D417.

U tijeku su radovi na obnovi i dopuni graničnih oznaka na dijelu sektora D hrvatsko-mađarske granice. 21. prosinca 2017. godine. Aneksom ugovora s izvoditeljem – tvrtkom Geomatika d.o.o. produžen je rok za završetak radova do 31. siječnja 2018. godine.

Dana 18. prosinca 2017. godine tvrtka Geoprem d.o.o. započela je radove na održavanju i stabilizaciji graničnih oznaka te geodetska izmjera graničnih oznaka na sektoru B.

U tijeku je i postupak bagatelne nabave za stabilizaciju i izmjeru stalnih točaka geodetske osnove, geodetsku izmjeru graničnih oznaka na dijelu sektora D (D1-D211 i D260-D417) te izradu nacрта novih graničnih dokumenata državne granice između Republike Hrvatske i Mađarske.

Svi izvještaji o napretku i projektni izvještaji su prihvaćeni 100% i prijavljeni troškovi odobreni i plaćeni (prva 4 izvještaja o napretku i 3 projektna izvještaja).

3.5.7. Provedba projekata financiranih sredstvima prepristupnih programa IPA-I. Komponenta i Prijelaznog instrumenta

HCR, iz programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta, ima u provedbi 5 grant ugovora, ukupne vrijednosti 10,6 milijuna eura. Realizacijom navedenih ugovora planirano je razminirati 9,5 km² minski sumnjivih površina uz granicu s Bosnom i Hercegovinom na području Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije te područje socio-gospodarske infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Krajem studenoga i početkom prosinca 2016. godine Hrvatski centar za razminiranje potpisao je 5 grant ugovora, ukupne vrijednosti 10,6 milijuna eura, od čega 9 milijuna eura bespovratnih sredstava iz programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelazni instrument. Realizacijom navedenih ugovora planirano je razminirati 9,5 km² minski sumnjivih površina uz granicu s Bosnom i Hercegovinom na području Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije te područje socio-gospodarske infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Osnovna aktivnost u svim ugovorima je razminiranje, a do kraja 2017. godine razminirano je 100% površine svih inicijalno planiranih i naknadno realociranih i ugovorenih projekata. Inicijalno je planirano razminiranje 9.515.507 m², a nakon realokacija preostalih sredstava razminirano je ukupno 9.688.896 m².

OSNOVNI PROJEKTI						
Program	Naziv projekta (grant ugovor)	Provedba	Udio EU	Udio RH	POVRŠINA RAZMINIRANJA	REALIZACIJA RAZMINIRANJA NA DAN 31.12.2017.
			(eur)	(eur)	(m ²)	(m ²)
IPA 2012	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Sisačko-moslavačkoj županiji GC 2012-01-23-0401	23.11.2016. - 23.02.2018.	1.170.000,00	206.471,00	1.367.000	1.384.502
IPA 2012	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Sisačko-moslavačkoj županiji GC 2012-01-23-04-02	29.11.2016. - 28.02.2018.	2.711.999,80	478.588,20	2.500.463	2.546.374
IPA 2013	Razminiranje socio-gospodarske infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji (II.dio) GC 2013-01-36-0101	29.11.2016. - 28.02.2018.	1.161.000,00	204.882,00	1.349.000	1.368.115
Transition Facility (Prijelazni instrument)	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Ličko-senjskoj županiji GC TH/HR/P1/M3-O4-01	29.11.2016. - 28.02.2018.	2.075.000,00	366.176,00	2.425.270	2.500.251
Transition Facility (Prijelazni instrument)	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Ličko-senjskoj županiji GC TH/HR/P1-M3-O4-02	09.12.2016. - 09.03.2018.	1.923.999,80	339.529,20	1.873.774	1.889.654
UKUPNO			9.041.999,60	1.595.646,40	9.515.507	9.688.896

Tablica 3.15. Pregled ugovorenih i realiziranih programa iz pretpripravnih fondova u 2017. godini-osnovni projekti

REALOKACIJE PO UGOVORIMA						
Program	Naziv projekta (grant ugovor)	Provedba	Udio EU	Udio RH	POVRŠINA RAZMINIRANJA NAKON REALOKACIJE	REALIZACIJA RAZMINIRANJA NA DAN 31.12.2017.
			(eur)	(eur)	(m ²)	(m ²)
IPA 2012	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Sisačko-moslavačkoj županiji GC 2012-01-23-0401	23.11.2016. - 23.02.2018.	1.170.000,00	206.471,00	17.502	17.502
IPA 2012	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Sisačko-moslavačkoj županiji GC 2012-01-23-0402	29.11.2016. - 28.02.2018.	2.711.999,80	478.588,20	42.032	42.032
IPA 2013	Razminiranje socio-gospodarske infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji (II.dio) GC 2013-01-36-0101	29.11.2016. - 28.02.2018.	1.161.000,00	204.882,00	19.115	19.115
Transition Facility (Prijelazni instrument)	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Ličko-senjskoj županiji GC TH/HR/P1/M3-O4-01	29.11.2016. - 28.02.2018.	2.075.000,00	366.176,00	25.880	25.880
Transition Facility (Prijelazni instrument)	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Ličko-senjskoj županiji GC TH/HR/P1-M3-O4-02	09.12.2016. - 09.03.2018.	1.923.999,80	339.529,20	74.981	74.981
UKUPNO			9.041.999,60	1.595.646,40	179.510	179.510

Tablica 3.16. Pregled ugovorenih i realiziranih programa iz pretpripravnih fondova u 2017. godini-realokacija

Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poslana je dopuna dokumentacije za proces zatvaranja programa IPA 2010 u okviru kojeg je HCR provodio 3 grant ugovora (2010-01-36-04, 2010-01-36-0401, 2010-01-36-0402).

Visibility materijali su nabavljeni za ugovore iz IPA 2013, IPA 2012 i Prijelaznog instrumenta. Uvodna konferencija za projekt „Razminiranje područja uz granicu s Bosnom i Hercegovinom u Sisačko-moslavačkoj županiji“ za oba grant ugovora iz programa IPA 2012 održana je 4. srpnja 2017. godine u Dvoru. Konferencija za ugovore iz programa IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta održana je 6. studenoga u Plitvičkim Jezerima.

Završna konferencija za ugovore iz programa IPA 2012 planirana je za kraj siječnja ili prvi dio veljače u Sisku, a završna konferencija za ugovore iz Prijelaznog instrumenta i programa IPA 2013 u veljači u Zagrebu.

Snimljen je kratki dokumentarni film „Put jedne mine“ o financiranju razminiranja iz programa IPA – I. komponenta i Prijelaznog instrumenta i prikazan na Konferenciji 6. Studenoga 2017. godine. Film je snimio 4film d.o.o. iz Zagreba.

3.6. Izrada zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. Ottawske konvencije-Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima

Potpisivanjem i ratifikacijom Konvencije o zabrani uporabe, stvaranju zaliha, proizvodnji i prijenosu protupješačkih mina i o njihovom uništenju (nadalje u tekstu: Ottawska konvencija) i Konvencije o kazetnom streljivu, Republika Hrvatska se obvezala utvrditi sva područja koja su zagađena protupješačkim minama i ukloniti sve protupješačke mine. Republika Hrvatska je utvrdila zagađena područja i zatražila produljenje roka za uklanjanje svih protupješačkih mina s 2009. za sljedećih deset godina. Republici Hrvatskoj je odobren produžetak do 1. ožujka 2019. godine. Republika Hrvatska se obvezala utvrditi područja zagađena kazetnim streljivom i do 1. kolovoza 2020. godine očistiti i uništiti ostatke kazetnog streljiva. Područja zagađena protupješačkim minama i područja kazetnim streljivom zajedno s područjima zagađenim ostalim utvrđenim eksplozivnim ostacima rata ili za koje postoji opravdana sumnja o zagađenosti istima čine MSP Republike Hrvatske.

U rujnu započelo se s izradom zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. Ottawske konvencije-Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima. Sukladno navedenom, intenzivirana je suradnja sa Ministarstvom obrane oko objedinjavanja potrebnih podataka, odnosno utvrđivanja cjelokupnog MSP-a Republike Hrvatske koji sadrži i površine i objekte za koje je nadležno Ministarstvo obrane te su do kraja prosinca izrađeni povijesni podatci,

presjek stanja s krajem 2017. godine i izrađena je projekcija potrebitih financijskih sredstava, obzirom na postojeće kapacitete te veličinu i složenost preostalog MSP-a.

4. Financiranje plana

Donošenjem Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, ukupan izvorni financijski plan Hrvatskog centra za razminiranje (glava u razdjelu 04035) za 2017. godinu iznosio je 362.697.744,00 kuna. Nakon Rebalansa Državnog proračuna za 2017. godinu i Preraspodjela odobrenih od strane ministra financija Tekući financijski plan za 2017. godinu iznosio je 280.687.015,00 kuna.

Izveštje o provedbi Plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu

04035 HCR - FINANCIJSKI PLAN 2017.						
Aktivnost Izvor	Opis	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 31.12.2017.		
		kn	kn	kn	% u odnosu na Izvorni plan	% u odnosu na Tekući plan
1	2	3	4	5	6	7
					(5/3)*100	(5/4)*100
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	362.697.744,00	280.687.015,00	262.137.881,00	72,27	93,39
04035	Hrvatski centar za razminiranje	362.697.744,00	280.687.015,00	262.137.881,00	72,27	93,39
A672007	RAZMINIRANJE	159.814.315,00	159.334.315,00	148.280.066,00	92,78	93,06
11	Opći prihodi i primici	157.314.315,00	156.634.315,00	146.113.560,00	92,88	93,28
52	Ostale pomoći	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	2.000.000,00	2.200.000,00	2.166.506,00	108,33	98,48
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.995.000,00	36.823.600,00	32.398.684,00	77,15	87,98
11	Opći prihodi i primici	41.995.000,00	36.820.500,00	32.395.656,00	77,14	87,98
52	Ostale pomoći	0,00	3.100,00	3.028,00		97,68
A672033	IPA 2013 RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LSŽ, SMŽ, ZŽ	10.408.000,00	10.408.000,00	9.209.782,00	88,49	88,49
12	Sredstva učešća za pomoći	1.560.000,00	1.560.000,00	1.550.000,00	99,36	99,36
51	Pomoći EU	8.848.000,00	8.848.000,00	7.659.782,00	86,57	86,57
T672037	IPA I 2012 - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO- MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI	34.801.800,00	34.801.800,00	34.200.692,00	98,27	98,27
12	Sredstva učešća za pomoći	10.401.700,00	10.401.700,00	5.153.000,00	49,54	49,54
51	Pomoći EU	24.400.100,00	24.400.100,00	29.047.692,00	119,05	119,05
T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU	5.240.000,00	4.095.000,00	2.643.668,00	78,15	64,56
12	Sredstva učešća za pomoći	95.000,00	0,00	0,00		
51	Pomoći EU	0,00	0,00	2.643.668,00		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	5.145.000,00	4.095.000,00	0,00		
T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO- SENJSKOJ ŽUPANIJI	35.845.800,00	34.787.000,00	34.969.154,00	97,55	100,52
12	Sredstva učešća za pomoći	5.377.500,00	5.377.500,00	5.320.000,00	98,93	98,93
51	Pomoći EU	30.468.300,00	29.409.500,00	29.649.154,00	97,31	100,81
T672040	NATURAVITA 2014-2020	74.592.829,00	0,00	0,00	-	-
12	Sredstva učešća za pomoći	4.592.829,00	0,00	0,00		
562	Pomoći EU	70.000.000,00	0,00	0,00		
T672041	REGIONALNI TEČAJ ZA VIŠI MENADŽMENT	0,00	437.300,00	435.835,00	-	99,66
52	Ostale pomoći	0,00	437.300,00	435.835,00		99,66

Pregled po izvorima sredstava

Izvor	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje/kn	IP %	TP %
11	Opći prihodi i primici	199.309.315,00	193.454.815,00	178.509.216,00	89,56	92,27
12	Sredstva učešća za pomoći	22.027.029,00	17.339.200,00	12.023.000,00	54,58	69,34
51	Pomoći EU	63.716.400,00	62.657.600,00	69.000.296,00	108,29	110,12
562	Kohezijski fond (KF)	70.000.000,00	0,00	0,00	-	-
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	5.145.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	500.000,00	940.400,00	438.863,00	87,77	46,67
61	Donacije	2.000.000,00	2.200.000,00	2.166.506,00	108,33	98,48
UKUPNO		362.697.744,00	280.687.015,00	262.137.881,00	72,27	93,39

Tablica 4.1. Pregled sredstava za protuminsko djelovanje iz Državnog proračuna

Prema izvorima financiranja sredstva su ostvarena iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) u iznosu 178.509.216,00 kuna, učešća proračuna Republike Hrvatske u pomoći Europske unije (izvor 12) u iznosu 12.023.000,00 kuna, pomoći Europske unije (izvor 51) u iznosu 69.000.296,00 kuna, pomoći vlada i međunarodnih organizacija (izvor 52) u iznosu od 438.863,00 kuna, te donacija trgovačkih društava, javnih poduzeća i ostalih izvan opće države, koji se ostvaruju kroz Državni proračun (izvor 61) u iznosu 2.166.506,00 kuna.

Od ukupno planiranih sredstava za 2017. godinu u iznosu 280.687.015,00 kuna, utrošeno je 262.137.881,00 kuna, što je 72,27% u odnosu na Izvorni financijski plan za 2017. godinu, odnosno 93,39% od Tekućeg financijskog plana za 2017. godinu (nakon rebalansa i preraspodjela).

4.1. Financiranje poslova razminiranja

Temeljem Plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu financiranje poslova razminiranja je planirano iz Državnog proračuna, iz sredstava pomoći EU, sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, sredstava Državnog proračuna s posebne pozicije naknade za Općekorisne funkcije šume koju prikuplja Ministarstvo poljoprivrede, sredstava donacija koje su uplaćivane u Državni proračun, direktnih donacija preko Međunarodne fondacije ITF, te iz Europskog poljoprivrednog fonda čiji korisnici su županije koje se neposredno plaćale obavljane poslove razminiranja.

IZVOR SREDSTAVA	PLANIRANA SREDSTVA	REALIZIRANA SREDSTVA
DRŽAVNI PRORAČUN HCR	297.280.829,00	210.369.876,00
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.200.000,00	129.274.655,00*
12 SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI	22.027.029,00	12.023.000,00
51 POMOĆI EU	63.168.800,00	66.905.715,00
562 KOHEZIJSKI FOND (Naturavita)	70.000.000,00	-
563 EU FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	385.000,00	-
52 OSTALE POMOĆI	500.000,00	-
61 DONACIJE	2.000.000,00	2.166.506,00
DRŽAVNI PRORAČUN Ministarstvo poljoprivrede	40.000.000,00	-
DONACIJE (putem ITF-a)	500.000,00	484.115,00
EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND	167.448.239,80	135.850.448,00
UKUPNO	505.229.068,80	346.704.439,00

Tablica broj 4.2 . Planirana i realizirana financijska sredstva

Napomena: *Od 129.274.655,00 kuna utrošenih za poslove razminiranja, 23.642.482,00 kuna je utrošeno za obavljanje poslova tehničkog izvida i pomoćne poslove u razminiranju. Za poslove tehničkog izvida koje je obavljala ovlaštena pravna osoba Mungos razminiranje d.o.o. Sisak utrošeno je 22.254.147,00 kuna i za poslove strojne pripreme terena u tehničkom izvidu i pomoćne poslove u razminiranju koje su obavljale ovlaštene pravne osobe 1.388.335,00 kuna.

Posebno treba istaknuti činjenicu da su 2017. godine sredstva koja su realizirana za poslove razminiranja iz EU izvora znatno veća od sredstava koja su osigurana iz Državnog proračuna i ostalih izvora, tj. da je iz EU sredstava ukupno realizirano 202.786.163,00 kuna, što je najveće povlačenje EU sredstava za razminiranje do sada.

4.1.1. Donacije

U 2017. godini planirana su donatorska sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a realizirani su, tj. obavljani su i plaćeni poslovi razminiranja u iznosu od 2.166.506,00 kuna.

Kao donatore treba posebno istaknuti Hrvatsku elektroprivredu d.d., Udrugu za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže, Grad Zagreb, Američku gospodarsku komoru u RH (AMCHAM) i Karlovačku županiju, Raiffaisen banku d.d. i Sisačko-moslavačku županiju, ali treba napomenuti da se s manjim donacijama uključio i veći broj pravnih i fizičkih osoba koje su na taj način pokazale senzibilitet prema protuminskom djelovanju.

Donacija Hrvatske elektroprivrede d.d. u iznosu od 1.966.506,00 kuna utrošena je na razminiranje površina prema idejnom planu „Područje Ljut i Vlaka u naselju Bila Vlaka“ u Zadarskoj županiji, a donacija Raiffaisen banke d.d. u iznosu od 200.000,00 kuna utrošena je na razminiranje površina prema idejnom planu „Površine uz rijeku Čikolu u Gradu Drnišu“ u Šibensko-kninskoj županiji.

Također, treba istaknuti i donacije koje su uplaćene HCR-u i za koje su ugovoreni poslovi razminiranja, ali još nisu dovršeni te će iste biti realizirane po završetku poslova razminiranja u 2018. godini. Američka gospodarska komora (AMCHAM) je u suradnji s Karlovačkom županijom organizirala donatorsku večeru Noć za siguran korak temeljem koje je uplaćena donacija u iznosu od 519.000,00 kuna, te su u tijeku poslovi razminiranja prema idejnom planu „Površine uz rijeku Tounjčicu“ u Karlovačkoj županiji. Udruga Hrvatska pomaže je u suradnji s Gradom Zagrebom organizirala akciju „Zagreb za život bez mina“ temeljem koje je prikupila i uplatila donaciju u iznosu od 324.348,00 kuna, zahvaljujući kojoj su ugovoreni poslovi razminiranja prema idejnom planu „Šuma u naselju Smiljan uz zaselak Bogdanić“ u Ličko-senjskoj županiji koji su u tijeku. Svojom donacijom u iznosu od 100.000,00 kuna uključila se i Sisačko-moslavačka županija, te su ugovoreni poslovi razminiranja prema idejnom planu „Područje oko nerazvrstane ceste Gore – G. Mokrice“ u Sisačko-moslavačkoj županiji.

4.1.2. ITF Enhancing Human Security

Donacije putem Međunarodne fondacije ITF iz Slovenije planirane su u iznosu od 500.000,00 kuna, a realizirane u iznosu od 484.115,00 kuna.

Razminirano je područje prema idejnom planu „Područje zaselka Klarići u naselju Bila Vlaka“ vrijednosti donacije 385.662,00 kuna i područje prema idejnom planu „Šumsko područje uz naselje Mošćenica, II dio“ vrijednosti donacije 98.453,00 kuna (bez PDV-a koji je podmiren iz Državnog proračuna).

4.1.3. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

Tijekom 2017. godine nastavljeno je razminiranje poljoprivrednog zemljišta te su Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Osječko-baranjska i Šibensko-kninska županija izvršile plaćanja obavljenih poslova razminiranja u vrijednosti od 135.850.448,00 kuna.

4.1.4. Razminiranje sredstvima Državnog proračuna (Ministarstvo poljoprivrede) s pozicije Općekorisne funkcije šuma

Sredstvima koja se prikupljaju kao naknada za općekorisne funkcije šuma planirano je obavljanje poslova razminiranja u vrijednosti do 40.000.000,00 kuna. Tijekom 2017. godine iz ovog izvora financiranja nije utrošeno ništa iz razloga što je Sporazum između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskog centra za razminiranje potpisan tek 14. rujna 2017. godine. Temeljem Sporazuma proveden je postupak javne nabave za ustupanje poslova razminiranja financiranih tim sredstvima, odabrani su izvoditelji, izvršen je dio poslova, dok će većina poslova biti dovršena u prvoj polovici 2018. godini, te će u tom razdoblju biti i realizirana navedena sredstva

4.1.5. Ukupno realizirana financijska sredstva

U Planu protuminskog djelovanja za 2017. godinu za poslove razminiranja planirano je iz svih izvora financiranja 505.229.068,80 kuna. Tijekom godine ukupno je za poslove razminiranja realizirano, tj. isplaćeno ovlaštenim pravnim osobama koje su obavljale poslove razminiranja 346.704.439,00 kuna.

4.1.6. Prosječna cijena poslova razminiranja

U 2017. godini poslovi razminiranja su obavljani na površini od 38.519.358 m² u vrijednosti od 293.632.909,00 kuna (bez PDV-a), što je prosječna cijena od 7,62 kn/m² (bez PDV-a).

Uočljiv je rast prosječne cijene poslova razminiranja u odnosu na prosječnu cijenu poslova u 2016. godini (6,13 kn/m²), što je posljedica stabilizacije tržišta u sustavu protuminskog djelovanja.

5. Zaključak

Planom protuminskog djelovanja za 2017. godinu planirano je izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida na površini od 58,3 km².

Ukupno smanjenje minski sumnjivog područja u 2017. godini iznosi 36,5 km², od čega je poslovima razminiranja smanjen MSP za 29,9 km², a tehničkim i općim izvidom za dodatnih 6,6 km².

Od osiguranih sredstava prilikom donošenja Plana u 2017. godini, koja su ukupno iznosila 505.229.068,80 kuna, realizirano je 346.704.439,00 kuna.

Naglašavamo da se nastavlja trend iz 2016. godine sa sredstvima za razminiranje osiguranim iz EU fondova (pretpristupni programi i EPFRR) tako da ista u 2017. godini iznose visokih 58,5% od ukupno osiguranih financijskih sredstava i izvora.

Razlog neizvršenja Plana u dijelu iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava je uvjetovano nemogućnosti korištenja 70 mil. kuna raspoloživih iz ESI fondove kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za projekt Naturavita jer su krajem 2017. godine Projektna aplikacija te Obrazac za prijavu projekta od tek poslani JASPERS-u te sukladno navedenome realizacija projekta započet će u 2018 godini.

Također, sredstvima koja se prikupljaju kao naknada za općekorisne funkcije šuma planirano je obavljanje poslova razminiranja u vrijednosti do 40.000.000,00 kuna. Tijekom 2017. godine iz ovog izvora financiranja nije utrošeno ništa iz razloga što je Sporazum između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskog centra za razminiranje potpisan tek 14. rujna 2017. godine.

Realizacija poslova razminiranja financiranih sredstvima EPFRR kroz Program ruralnog razvoja nije izvršena u skladu s planiranim jer su kapaciteti tvrtki za razminiranje bili u II. polugodištu zauzeti na dodatno ugovorenim poslovima razminiranja financiranim sredstvima pretpristupnog fonda IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta. Ovi poslovi su morali biti izvršeni u 2017. godini, da bi se sve ostale aktivnosti mogle završiti u dopuštenom vremenu provedbe.

Neispunjenje Plana u dijelu smanjenje MSP-a općim i tehničkim izvidom uvjetovano je nedovoljnim kapacitetima Hrvatskog centra za razminiranje. Planirano još za 2016. godinu, tek u prosincu 2017. godine Vlada je donijela odluku o zapošljavanju djelatnika tvrtke Mungos razminiranje d.o.o. u Hrvatski centar za razminiranje za izvršenje i ovog posla.

Tijekom obavljanja poslova razminiranja pronađeno je i uništeno 1.289 komada MES-a i 519 komada NUS-a. Najviše MES-a, 584 komada pronađeno je i uništeno na području Ličko-senjske županije.

Na dan 31. prosinac 2017. godine minski sumnjivo područje je obilježeno s 13.563 ploče ili s 33 ploče/km², što predstavlja 15% povećanje obilježenosti po km² minski sumnjivog područja u odnosu na 2016. godinu.

U 2017. godini nije se dogodio niti jedan minski incident, niti jedna minska nesreća što je najvažnije ostvarenje Plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu.

U skladu s planiranim za 2017. godinu obavljane su edukacije o opasnostima od MES-a, NUS-a.

6. Prilozi

6.1. Prikaz razminiranih područja u 2017. godini po županijama

R.br.	Županija	Naziv idejnog plana	Razminirano
1	BP	Šumske površine na području Širinaca, Žuberkovca i Mašičke Šagovine	516.211
2		Površine na području Jezera, Trešnjevog brda, Popovog kamena i Konjske glave	67.923
3		Prosjeke, putovi i šumske površine na području Bobara i Ivanovca	1.174.047
4		Šumske i poljoprivredne površine sjeverno od Širinaca	168.693
5		Površine na području Jezera i Čardaka	62.693
6	KA	Površina u Općini Lasinja	3.583
7		Površine kod Mateškog sela u Općini Generalski Stol te uz rijeku Mrežnicu u Općini Barilović	1.010.570
8	LS	Područje budućeg centra planinskog turizma "Sveto brdo" , 3. dio	132.494
9		Područja u zaselcima Vedro Polje Divoselsko, Podklisa i Vojinovići južno od Gospića	642.427
10		Područja uz šumske odjele od 1 do 7 u G.J. Lisac-Staparuša	69.150
11		G.J. Lisac-Staparuša, odjeli 1a do 13a	1.478.311
12		Površine na području Abdića brdo i Gola Plješevica u Općini Plitvička jezera	29.358
13		Poljoprivredne površine u naseljima Agbabe i Čanak	2.092.518
14	OB	Preostala minska polja na području Grada Valpova	355.643
15		Inundacijski pojas rijeke Dunav na području Općine Draž	511.492
16		Inundacijski pojas rijeke Drave na području Osječko - baranjske županije uz granicu s Mađarskom	948.849
17		Preostale poljoprivredne površine na području Osječko-baranjske županije, 1. dio	927.885
18	PS	Šumske površine na području naselja Kusunje	209.110
19		Područje Čardaka i Turskog groblja sjeverno od naselja Brusnik	139.706
20		Šumske površine na području naselja Kričke	216.149
21		Šumske površine, prosjeke i putovi na području Čukur istočno od Pakraca	287.099
22		Šumske površine sjeveroistočno od Pakraca	175.202
23		Šire područje naselja Subocka, Donji Čaglić i Kovačevac	721.732
24		Šumski odjeli u G.J. Sjeverni Psunj-Javornica na području Grada Pakraca	279.295
25		Šumske površine na području naselja Donji i Gornji Grahovljani	268.443

26		Slavonski planinarski put, dionica Velika poljana-Brezovo polje	482.312
27		Šumske površine u krajnjem sjeveroistočnom dijelu Pakraca	167.127
28		Šumski prostor sjeverno od naselja Velika Dereza	407.594
29	SD	Površine na području Dinare u Općini Hrvace	755.389
30		Poljoprivredne površine na području Općine Hrvace	1.016.836
31		Površine na području Grada Sinja	68.348
32	SM	G.J. Kotar-Stari Gaj	728.042
33		G.J. Grede - Kamare	728.999
34		10(20) kV DV Gora, dionica Župić - Gornje Mokrice	7.610
35		Površina uz naselje Bobovac u Općini Sunja	86.919
36		Poljoprivredne površine uz naselje Kričke i Kozarice	70.242
37		Poljoprivredne površine na području naselja Gora	408.855
38		Livade i šume na području naselja Gora i Župić	408.261
39		Šuma na području naselja Nova Drenčina	455.717
40		Poljoprivredne površine sjeverno od naselja Košutarice	260.556
41		Područje naselja Bović u Općini Gvozd i naselja Struga Banska u Općini Dvor	38.020
42		Šumsko područje uz naselje Mošćenica, II dio	16.540
43		Poljoprivredne površine uz naselje Kričke u Gradu Novska	761.149
44		Poljoprivredne površine na području Grada Gline i Općine Gvozd	2.086.603
45		Površina na području naselja Bestрма	109.945
46		ŠK	Površine na području naselja Razvođe i Lukar
47	Površine na području naselja Žitnić		177.959
48	Područje Grada Šibenika		95.333
49	Područje uvale Peralište u naselju Nos Kalik		4.080
50	Površine na području naselja Kričke		174.893
51	Površine na području naselja Kričke, II. dio		172.299
52	Površina uz rijeku Čikolu u Gradu Drnišu		39.097
53	Šire područje Grada Drniša		604.288
54	Područje naselja Perkovići i Goriš		42.037

55		Šire područje Općine Promina i Grada Drniša	198.988
56		Površine na području naselja Čista Mala i Lađevci u Šibensko-kninskoj županiji	180.526
57		Površine u gradovima Vodice i Skradin	214.037
58		Područje u naselju Dragišić	183.448
59		Poljoprivredne površine na području gradova Vodica, Skadina i Drniša te Općine Promina	676.226
60	ZD	Područje Trnovača i Vulića Dolac u Općini Jasenice	146.950
61		Područje naselja Kruševo u Gradu Obrovcu	173.105
62		Područje naselja Gorica	31.756
63		Površine na području naselja Prkos	34.707
64		Područje Ljut i Vlaka u naselju Bila Vlaka	176.231
65		Područje u naselju Velim	176.583
66		Područje Bukovice i uvale Prdelj u naselju Kruševo	86.438
67		Područje naselja Zemunik Gornji	354.830
68		Područje naselja Vukšić u Gradu Benkovcu	173.387
69		Šumske površine na području naselja Prović i zaselka Dobra Voda u naselju Pristeg	994.398
70		Cestovni pojas ŽC 5166 na dionici Sv. Rok - Jasenice, Mala Bobija i Maričići	268.844
71		Poljoprivredne površine u Zadarskoj županiji	715.125
72		Područje Općine Posedarje	670.950
73		Područje sjeverozapadno od naselja Bila Vlaka	1.298.214
UKUPNO:			29.885.067

6.2. Izvešće o provedbi plana razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina i utrošenim financijskim sredstvima za 2017. godinu

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZMINIRANJA VOJNIH
LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM
SREDSTVIMA ZA 2017. GODINU**

Zagreb, ožujak 2018.

1. UVOD

Razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina u 2017. godini provodila je inženjerijska postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske (Pionirska bojna Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske) u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju (Narodne novine, broj 110/15) koji uređuje razminiranje vojnih lokacija i građevina i planom razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2017. godini.

2. PREGLED IZVRŠENJA ZADAĆA RADOVA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2017. GODINI

U 2017. godini u provedbi zadaća razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina obavljeno je ukupno sedam radova razminiranja od kojih je šest bilo planskih aktivnosti te jedna izvanplanska aktivnost.

Razminiranje je provođeno na području jednog vojnog skladišta, dvije vojarne i tri vojna poligona.

Na provedbi ovih zadaća provedeno je ukupno 345 radnih dana u kojima je ostvareno 54 528 č/h rada ljudi, 723 m/h rada strojeva te 34 317 km rada vozila.

Vrsta objekta	Broj vojnih lokacija/radova	Vrijeme provedbe [r/d]	Rad ljudi [č/h]	Rad strojeva [m/h]	Rad vozila [km]
skladišta	2/1	50	7432	30	7 296
vojarne	2/2	136	31 336	387	7 715
poligoni	3/4	158	15 744	306	18 706
vježbališta	1/0	1	16	0	600
UKUPNO	8/7	345	54 528	723	34 317

Pri tome je razminirana površina od 481 900 m², te pronađeno, uklonjeno i uništeno 279 komada raznih neeksplozivnih ubojnih sredstava (NUS-a) protupješačke i protuoklopne mine nisu pronađene.

Vrsta objekta	Razminirana površina [m ²]	Uklonjeno Ppm [kom]	Uklonjeno P0m [kom]	Uklonjeno o NUS [kom]
skladišta	19 669	0	0	11
vojarne	300 000	0	0	202
poligoni	162 231	0	0	66
vježbališta	0	0	0	0
UKUPNO	481 900	0	0	279

2.1. RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U SKLADU S PLANOM RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2017. GODINI

Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina za 2017. godinu obuhvaćao je 11 radova na osam vojnih lokacija i predviđao razminiranje minski sumnjive površine ukupne veličine cca 1 588 500 m².

S provedbom plana započeto je 27. siječnja 2017., a završeno 12. prosinca 2017. Provedeno je šest radova razminiranja na šest lokacija, od kojih je pet razminiranja provedeno u cijelosti, a jedno razminiranje nastavlja se u 2018. godini.

Na razminiranju vojnih lokacija iz Plana provedeno je ukupno 338 radnih dana tijekom kojih je ostvareno 54 192 č/h rada, 723 m/h rada te prijeđeno 33 617 km puta s vozilima.

Vrsta objekta	Broj objekata/ radova	Vrijeme provedbe [r/d]	Rad ljudi [č/h]	Rad strojeva [m/h]	Rad vozila [km]
skladišta	2/1	50	7 432	30	7 296
vojarne	2/2	136	31 336	387	7 715
poligoni	3/3	151	15 408	306	18 006
vježbališta	1/0	1	16	0	600
UKUPNO:	8/6	338	54 192	723	33 617

Ukupno je razminirana površina od 479 260 m² te je uklonjeno i uništeno 279 NUS-a. Protupješačke i protuoklopne mine nisu pronađene.

Vrsta objekta	Razminirana površina [m ²]	Uklonjeno PPM [kom]	Uklonjeno POM [kom]	Uklonjeno NUS [kom]
skladišta	19 669	0	0	11
vojarne	300 000	0	0	202
poligoni	159 596	0	0	66
vježbališta	0	0	0	0
UKUPNO:	479 260	0	0	279

2.1.1. PROVEDENA RAZMINIRANJA

- (1) Vojni poligon „Eugen Kvaternik“ Slunj
- (2) Vojni poligon „Gašinci“ Gašinci
- (3) Vojna lokacija „Korešnica“ Žrnovnica
- (4) Vojarna „Pukovnik Mirko Vukušić“ Zemunik, Zadar
- (5) Vojarna „Josip Jović“ Udbina

2.1.2. RAZMINIRANJA U TIJEKU

Inženjerijski poligon „Cerovac“ Karlovac.

2.2. RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA IZVAN PLANA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I /ILI GRAĐEVINA

U 2017. godini provedena je jedna zadaća razminiranja koja nije bila obuhvaćena Planom.

Zadaća je provedena na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju za potrebe Ministarstva hrvatskih branitelja radi osiguranja uvjeta za pretraživanje četiri lokaliteta mogućih pojedinačnih i masovnih grobnica iz Domovinskog rata.

Zadaća je provedena u trajanju od sedam radnih dana u kojima je ostvareno 336 č/h rada ljudi i 700 km prijeđenog puta s vozilima.

Vrsta objekta	Broj objekata/radova	Vrijeme provedbe [r/d]	Rad ljudi [č/h]	Rad strojeva [m/h]	Rad vozila [km]
poligoni	1/4	7	336	0	700
UKUPNO	1/4	7	336	0	700

U sklopu zadaće pregledana je površina od ukupno 2 640 m², a nije pronađeno niti jedno ubojno sredstvo.

Vrsta objekta	Razminirana površina [m ²]	Uklonjeno Ppm [kom]	Uklonjeno P Om [kom]	Uklonjeno NUS [kom]
poligoni	2 640	0	0	0
UKUPNO:	2 640	0	0	0

3. TROŠKOVI IZVRŠENJA RADOVA RAZMINIRANJA I PRETRAŽIVANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2017. GODINI

Trošak postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske nastao provedbom razminiranja u 2017. godini iznosio je 473.842,32 kuna, a ukupni trošak razminiranja iznosio je 2.769.340,91 kuna.

Postrojba koja obavlja poslove razminiranja osim obavljanja tih zadaća ima obveze sudjelovanja u obukama i vježbama, unutarnjoj i stražarskoj službi, stručnim usavršavanja djelatnika, odavanju počasti umrlim hrvatskim braniteljima i drugim zadaćama.

Postrojba koja obavlja poslove razminiranja u mogućnosti je osigurati angažman tri voda istovremeno odnosno provoditi najviše tri zadaće u nekom presjeku vremena.

4. ZAKLJUČAK

Oružane snage Republike Hrvatske na provedbi planskih i izvan planskih radova razminiranja angažirale za to opremljenu i osposobljenu inženjerijsku postrojbu, optimalno koristeći dostupne resurse.

Pri tome je u odnosu na 2016. godinu ostvaren 9,64 % manji učinak razminirane površine.

Utrošeni rad je u dijelu rada ljudi bio manji za 17,66 %, ali je udjel rada strojeva za 23,80 % i udjel rada vozila za 26,45 % bio veći nego 2016. godine.

U odnosu na iskazane podatke i s obzirom na druge obveze postrojbe u 2017. godini ostvaren je zadovoljavajući učinak.

Razmini- ranje	Vrijeme provedbe [r/d]	ostvaren rad			razminirana površina [m ²]	uklonjeno			financijski troškovi [kn]
		ljudi [č/h]	strojeva [m/h]	vozila [km]		ppm [kom]	pom [kom]	nus [kom]	
2017.	345	54528	723	34 317	481900	0	0	279	2.769.340,91
2016.	504	66 224	584	27 138	533 322	56	2	5 452	3.635.709,59

Prioritet angažiranja bio je na razminiranju minski sumnjivih površina u vojarni Zemunik te na vojnim poligonima „Eugen Kvaternik“ i „Gašinci“ s ciljem zaštite korisnika tih lokacija te u vojnom skladištu „Korešnica“ radi pripreme prostora za predstojeću protupožarnu sezonu.

Udio neplaniranih zadaća bio je zadovoljavajući, a iznosio je u odnosu razminiranih površina svega 0,55 % te u odnosu ostvarenih troškova 0,70 %.

razminira- nje 2016.	vrijeme provedb e [r/d]	ostvaren rad			razminirana površina [m ²]	uklonjeno			financijski troškovi [kn]
		ljudi [č/h]	strojeva [m/h]	vozila [km]		ppm [kom]	pom [kom]	nus [kom]	
radovi iz plana	338	54.192	723	33.617	479.260	0	0	279	2.750.097
neplaniran i radovi	7	336	0	700	2.640	0	0	0	19.243,80
UKUPNO	345	54.528	723	34.317	481.900	0	0	279	2.769.340,91

Svi radovi razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina provedeni su na uspješan i učinkovit način bez ijednog izvanrednog događaja, što prvenstveno ukazuje na dobru obučenost i dosljednu primjenu propisanih procedura i standarda humanitarnog razminiranja.
