



**HRVATSKI SABOR**

KLASA: 022-03/13-01/324

URBROJ: 65-13-02

Zagreb, 5. prosinca 2013.

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA  
HRVATSKOGA SABORA**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA  
RADNIH TIJELA**

Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem *Izvešće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine*, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. prosinca 2013. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila prof. dr. sc. Branka Grčića, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dr. sc. Jakšu Puljiza, zamjenika ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, te Helgu Bubanović Devčić i Matiju Derka, pomoćnike ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

**PREDSJEDNIK**

Josip Leko



**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

**Klasa:** 022-03/13-14/27  
**Urbroj:** 50301-05/05-13-2

**Zagreb,** 5. prosinca 2013.

**PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA**

**Predmet:** Izvješće o korištenju prepristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

U skladu sa Zaključkom Hrvatskoga sabora, klase: 402-09/05-01/02, urbroja: 6511-05-07, donijetim na 16. sjednici, održanoj 6. listopada 2005. godine, Vlada Republike Hrvatske podnosi Izvješće o korištenju prepristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila prof. dr. sc. Branka Grčića, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dr. sc. Jakšu Puljiza, zamjenika ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, te Helgu Bubanović Devčić i Matiju Derka, pomoćnike ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

**PREDSJEDNIK**  
  
Zoran Milanović



**IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA  
POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE  
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE**

## SADRŽAJ

### Sadržaj

1.	UVOD.....	2
2.	SAŽETI PREGLED PROVEDBE PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE.....	4
2.1.	OSNOVNI FINANCIJSKI POKAZATELJI.....	4
2.2.	KLJUČNA ZBIVANJA.....	7
3.	DETALJNI PREGLED PROVEDBE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI PROGRAMA IPA, PO KOMPONENTAMA.....	10
3.1.	KOMPONENTA I PROGRAMA IPA - POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA....	10
3.1.1.	Nacionalni program Komponente I programa IPA 2007.....	13
3.1.2.	Komponenta I programa IPA 2008.....	16
3.1.2.1.	Nacionalni program .....	16
3.1.2.2.	Nuklearna sigurnost.....	20
3.1.3.	Nacionalni program komponente I programa IPA 2009.....	21
3.1.4.	Nacionalni program komponente I programa IPA 2010.....	26
3.1.5.	Komponenta I programa IPA 2011.....	30
3.1.5.1.	Nacionalni program .....	30
3.1.5.2.	Nuklearna sigurnost.....	33
3.2.	KOMPONENTA II PROGRAMA IPA – PREKOGRANIČNA SURADNJA.....	36
3.2.1.	Prekogranični programi s državama nečlanicama Europske unije .....	39
3.2.1.1.	Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina .....	39
3.2.1.2.	Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora .....	46
3.2.1.3.	Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija .....	52
3.2.1.	Transnacionalni programi: Program Jugoistočna Europa i Program Mediteran.....	59
3.2.1.1.	Transnacionalni program Jugoistočna Europa.....	59
3.2.1.2.	Program Mediteran .....	60
3.2.2.	Prekogranični programi s državama članicama Europske unije.....	65
3.2.2.1.	Program IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.....	66
3.2.2.2.	Program IPA prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.....	68
3.2.2.3.	Program IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013.....	69
3.3.	KOMPONENTA III PROGRAMA IPA – REGIONALNI RAZVOJ .....	72
3.3.1.	Komponenta III a programa IPA – Regionalni razvoj: Operativni program „Promet“ .....	72
3.3.2.	Komponenta III B programa IPA – Regionalni razvoj: Operativni program „Zaštita okoliša“.....	78
3.3.3.	Komponenta III C programa IPA – Regionalni razvoj: Operativni program „Regionalna konkurentnost“.....	83
3.4.	KOMPONENTA IV PROGRAMA IPA – RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA .....	89
3.5.	KOMPONENTA V PROGRAMA IPA – RURALNI RAZVOJ.....	98
4.	NEPRAVILNOSTI.....	104
5.	NASTAVAK PRIPREMA ZA KORIŠTENJE EU FONDOVA NAKON STUPANJA U ČLANSTVO U EUROPSKOJ UNJI .....	107
5.1	Jačanje administrativnih kapaciteta za upravljanje Europskim fondovima.....	107
5.2.	Osnivanje Radne skupine za fondove Europske unije.....	108
5.3.	Aktivnosti koje se odnose na programsko razdoblje Europske unije 2007.-2013.....	108
5.4.	Aktivnosti koje se odnose na programsko razdoblje Europske unije 2014.-2020.....	110
6.	ZAKLJUČAK.....	111
	Prilog 1 – Pregled traženih i dobivenih sredstava od Europske komisije, te izvršenih plaćanja po programima do 30. lipnja 2013.....	113

## Popis grafikona

Grafikon 1: Grafički prikaz napretka u ugovaranju pojedinih komponenti programa IPA u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	6
Grafikon 2: Grafički prikaz napretka u izvršavanju plaćanja pojedinih komponenti programa IPA u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	7
Grafikon 3: Grafički prikaz statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, zaključno s 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	12
Grafikon 4: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2008. godinu (IPA sredstva, u postocima).....	19
Grafikon 5: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2009. godinu .....	25
Grafikon 6: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2010. godinu .....	29
Grafikon 8: Grafički prikaz statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	38
Grafikon 9: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013.....	46
Grafikon 10: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. ....	59
Grafikon 11: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Transnacionalnog programa Mediteran od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. ....	62
Grafikon 12: Grafički prikaz statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje sa zemljama članicama, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	66
Grafikon 13: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	75
Grafikon 14: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	82
Grafikon 15: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa “Regionalna konkurentnost“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	87
Grafikon 16: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Operativnog programa “Regionalna konkurentnost“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. ....	88
Grafikon 17: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	92
Grafikon 18: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. ....	97
Grafikon 19: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava komponente V programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013.....	100
Grafikon 20: Grafički prikaz statusa provedbe komponente V programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	103

## Popis tablica

Tablica 1:	Financijski pokazatelji statusa provedbe svih komponenti programa IPA u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	4
Tablica 2:	Financijski pokazatelji statusa provedbe svih komponenti programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja (IPA sredstva, u milijunima eura).....	5
Tablica 3:	Usporedni pregled ugovorenih, doznačenih i isplaćenih sredstava pojedinih komponenti programa IPA u predmetnom i prethodnom izvještajnom razdoblju (IPA sredstva, u milijunima eura).....	6
Tablica 4:	Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	11
Tablica 5:	Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	11
Tablica 6:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA, iz godišnje alokacije za 2007. godinu, po Projektom sažetku (eng. Project Fiche – PF), u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	14
Tablica 7:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2007. godinu, po Projektom sažetku (eng. Project Fiche – PF), od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	15
Tablica 8:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2008. godinu, po Projektom sažetku (eng. Project Fiche – PF), u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	17
Tablica 9:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2008., po Projektom sažetku (eng. Project Fiche – PF), od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	18
Tablica 10:	Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA Nuklearna sigurnost iz godišnje alokacije za 2008. godinu u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	20
Tablica 11:	Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA Nuklearna sigurnost iz godišnje alokacije za 2008. od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	21
Tablica 12:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2009. godinu, po Projektom sažetku (eng. Project Fiche – PF), u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	23
Tablica 13:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2009. godinu, po Projektom sažetku (eng. Project Fiche – PF), od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	24
Tablica 14:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA, po Projektom sažetku (eng. Project Fiche – PF), iz godišnje alokacije za 2010. godinu u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	27
Tablica 15:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2010. od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	28
Tablica 16:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2011. godinu u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	31
Tablica 17:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2011. godinu od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	32
Tablica 18:	Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA Nuklearna sigurnost iz godišnje alokacije za 2011. godinu u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	33
Tablica 19:	Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA Nuklearna sigurnost iz godišnje alokacije za 2011. od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	34
Tablica 20:	Programi i agencije EU za koje je plaćena članarina iz komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2011. godinu (u eurima).....	35
Tablica 21:	Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje, u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	37

Tablica 22: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	37
Tablica 23: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2011., u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	43
Tablica 24: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2011., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	44
Tablica 25: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora 2007.-2011., u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	50
Tablica 26: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Crna Gora 2007.-2011., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	51
Tablica 27: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2007.-2011., u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	56
Tablica 28: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2007.-2011., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	57
Tablica 29: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Jugoistočna Europa i Mediteran 2007.-2009., u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	63
Tablica 30: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Jugoistočna Europa i Mediteran 2007.-2009., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	64
Tablica 31: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje sa zemljama članicama do 30. lipnja 2013. (u milijunima eura).....	65
Tablica 32: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (u milijunima eura) .....	67
Tablica 33: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (u milijunima eura) .....	69
Tablica 34: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (u milijunima eura) .....	71
Tablica 35: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	73
Tablica 36: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	74
Tablica 37: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	79
Tablica 38: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	81
Tablica 39: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa “Regionalna konkurentnost” u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	85
Tablica 40: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa “Regionalna konkurentnost” od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	86
Tablica 41: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente IV programa IPA u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	90
Tablica 42: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente IV programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura) .....	91
Tablica 43: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente V programa IPA, Operativnog programa „Ruralni razvoj“ 2007.-2012., u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	101
Tablica 44: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente V programa IPA, Operativnog programa „Ruralni razvoj“ 2007.-2012., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura).....	102
Tablica 45: Izvršeni povrati po komponentama programa IPA u razdoblju od početka provedbe programa zaključno do 30. lipnja 2013. godine (izražena u eurima).....	106

## 1. UVOD

Temeljem Zaključka Hrvatskoga sabora donesenog na 16. sjednici održanoj 6. listopada 2005. godine, Vlada Republike Hrvatske obvezna je Hrvatskom saboru podnositi redovna izvješća o korištenju prepristupnih programa pomoći Europske unije.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu resornog ministarstva za koordinaciju fondova Europske unije, u suradnji sa Sektorom za poslove Nacionalnog fonda Ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Nacionalni fond), prikuplja podatke od svih institucija uključenih u provedbu prepristupnih programa pomoći Europske unije u Republici Hrvatskoj, te izrađuje Izvješća o korištenju prepristupnih programa pomoći Europske unije u Republici Hrvatskoj na polugodišnjoj osnovi.

Izvješće o korištenju prepristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaća ključne podatke o provedbi svih komponenti Instrumenta prepristupne pomoći (u daljnjem tekstu: program IPA), polazeći od financijskih pokazatelja uspješnosti apsorpcije pojedine komponente, napose statusa ugovaranja, plaćanja i (tamo gdje je primjenjivo) ovjeravanja, s posebnim osvrtom na trendove koji se mogu identificirati u odnosu na informacije o statusu provedbe pojedine komponente programa IPA iz prethodnog izvještajnog razdoblja.

Financijski pokazatelji<sup>1</sup> iskorištenosti programa IPA strukturirani su na način da prikazuju podatke po važećim godišnjim alokacijama za razdoblje 2007.-2013. na dan 30. lipnja 2013. godine za svaku pojedinu komponentu, i to:

- po projektnom sažetku (eng. *Project Fiche*; u daljnjem tekstu: PF) za komponentu I programa IPA;
- po pojedinom programu za komponentu II programa IPA;
- po pojedinoj prioritetnoj osi (u daljnjem tekstu: PO) i mjeri (u daljnjem tekstu: M) za komponente III, IV i V programa IPA;

pokazujući s jedne strane status koji se odnosi na predmetno izvještajno razdoblje (od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine), te s druge strane status koji se odnosi na ukupno, kumulativno razdoblje od početka provedbe zaključno s 30. lipnjem 2013. godine.

Pored financijskih pokazatelja, Izvješće nudi opisni prikaz stanja provedbe svake od komponenata programa IPA, obuhvaćajući informacije o vrsti i broju natječaja u pripremi, ugovora u provedbi ili završenih ugovora, uz sažeti opis postignuća i ostvarenih rezultata u izvještajnom razdoblju. Također, Izvješće sadrži i informacije o regionalnoj pokrivenosti (na razini županija, izraženo u postocima) ugovorenih projekata, tamo gdje su predmetni podaci dostupni s obzirom na status provedbe.

---

<sup>1</sup> U svrhu sažetosti i praktičnosti prikaza, financijski pokazatelji prikupljeni od institucija uključenih u provedbu prepristupnih programa pomoći Europske unije u Republici Hrvatskoj zaokruživani su na dvije decimale. Eventualna odstupanja između podataka prikazanih u tekstu, tablicama i grafikonima u Izvješću i onih iz Priloga 1 Izvješća (Pregled traženih i dobivenih sredstava od Europske komisije, te izvršenih plaćanja po programima do 30. lipnja 2013.) odnosno ulaznih podataka, proizlaze iz zaokruživanja brojki na dvije decimale i veličinom su zanemarive za potrebe ovoga Izvješća.

U kontekstu pregleda područja ulaganja iz raspoloživih pretpristupnih sredstava, Izvješće nudi pregled udjela financiranja IPA sredstvima u nacionalnim godišnjim članarinama za sudjelovanje Republike Hrvatske u Programima i agencijama Europske unije, koji se uplaćuju za razdoblje sudjelovanja do datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. godine, od kada Republika Hrvatska sudjeluje u Općem proračunu Europske unije u svojstvu punopravne članice.

Također, Izvješće nudi sažeti pregled utvrđenih nepravilnosti i poduzetih postupanja po istima.

Naposljetku, Izvješće nudi pregled osnovnih informacija o statusu provedbe pripremnih aktivnosti za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, poduzetih u predmetnom izvještajnom razdoblju.

## 2. SAŽETI PREGLED PROVEDBE PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE

### 2.1. OSNOVNI FINACIJSKI POKAZATELJI

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine Europska komisija je na račun Nacionalnog fonda doznala iznos od 73,40 milijuna eura, što predstavlja 20,14% od ukupno doznatog iznosa od 364,43 milijuna eura od početka provedbe programa IPA.

U predmetnom izvještajnom razdoblju ugovoreno je 80,47 milijuna eura, odnosno 15,90% od ukupno ugovorenih sredstava programa IPA na dan 30. lipnja 2013. godine, koja iznose 506,05 milijuna eura, što čini 62,94% od ukupno dodijeljenog iznosa od 804,00 milijuna eura od početka provedbe programa IPA.

U izvještajnom razdoblju krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je ukupno 56,65 milijuna eura, odnosno 19,20% od ukupno plaćenog iznosa od početka provedbe programa IPA koji iznosi 295,11 milijuna eura. Slijedom toga, zaključno s 30. lipnja 2013. godine isplaćeno je 58,32% od ukupno ugovorenog iznosa svih komponenti programa IPA od početka njegove provedbe.

Podaci o provedbi Instrumenta pretpristupne pomoći na dan 30. lipnja 2013. godine pokazuju da se postotak ugovorenosti dodijeljenih sredstava po pojedinim komponentama programa IPA iz određenih financijskih alokacija kretao od 50,28% do 93,74%, a postotak isplaćenosti ugovorenih sredstava kretao se od 28,40% do 79,58%.

**Tablica 1: Financijski pokazatelji statusa provedbe svih komponenti programa IPA u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	IPA I	IPA II	IPA III	IPA IV	IPA V	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	237,46	12,46	330,26	94,42	129,40	804,00
UGOVORENA SREDSTVA	20,96	3,66	34,26 <sup>2</sup>	13,00	8,59	80,47
UGOVORENO/ UKUPNO DODIJELJENO	8,83%	29,37%	10,37%	13,77%	6,63%	10,01%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,34	0,90	55,50	6,96	9,70	73,40
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK/ UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,14%	7,22%	16,80%	7,37%	7,50%	9,13%
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	19,95	2,31	24,78	5,89	3,72	56,65
PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	12,86%	19,78%	11,37%	10,49%	5,72%	11,19%

<sup>2</sup> Ne uključuje povećane iznose sufinanciranja EU za projekte Mariščina i Kaštijun, koji proizlaze iz stupanja na snagu izmijenjenih Dvostranih sporazuma za navedene projekte.

**Tablica 2: Financijski pokazatelji statusa provedbe svih komponenti programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	IPA I	IPA II	IPA III	IPA IV	IPA V	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	237,46	12,46	330,26	94,42	129,40	804,00
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	155,18	11,68	217,96 <sup>3</sup>	56,17	65,06	506,05
UKUPNO UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	65,35%	93,74%	66,00%	59,49%	50,28%	62,94%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK *	132,77	7,65	144,14	40,08	39,79	364,43
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK/UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	55,91%	61,40%	43,64%	42,45%	30,75%	45,33%
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	123,49	8,08	105,16	39,90	18,48	295,11
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO UGOVORENO	79,58%	69,18%	48,25%	71,03%	28,40%	58,32%

*\*uključuje predujam za komponente III, IV i V*

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje kada je Europska komisija na račun Nacionalnog fonda doznala iznos od 60,60 milijuna eura (odnosno 20,82% od ukupno doznanih sredstava na dan 31. prosinca 2012. godine), u predmetnom izvještajnom razdoblju, s doznanih 73,40 milijuna eura, stopa doznivanja sredstava od Europske komisije ostaje na iznad 20% od ukupno doznanih sredstava, no u apsolutnom iznosu doznana sredstva unutar izvještajnog razdoblja bilježe porast od gotovo 13 milijuna eura.

Nadalje, u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje u kojemu je krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćen iznos od 77,92 milijuna eura (odnosno 32,67% od ukupno plaćenog iznosa na dan 31. prosinca 2012. godine), u predmetnom izvještajnom razdoblju krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je 56,65 milijuna eura, odnosno 19,20% od ukupno plaćenog iznosa na dan 30. lipnja 2013.

S ukupno ugovorenih 506,05 milijuna eura na dan 30. lipnja 2013. godine, odnosno ugovorenih 62,94% ukupno dodijeljenih sredstava, u predmetnom razdoblju ostvaren je napredak u ugovaranju nešto manji od 4% (u odnosu na status ugovorenosti od 59,11% u prethodnom izvještajnom razdoblju).

Valja napomenuti da u prikazu usporednih podataka o statusu ugovaranja, plaćanja i doznanih sredstava od Europske komisije, alokacije uzimane u obzir za predmetno izvještajno razdoblje obuhvaćaju i dodatne alokacije koje u prethodnome izvještajnom razdoblju nisu bile važeće, i time, zbog povećanja ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava, usporedni podaci pokazuju samo prividno smanjenje dinamike odnosno stopa ugovorenosti i plaćanja. Povećanje alokacija obuhvaća: alokaciju za 2012. godinu komponente I (Nacionalni program i programe Unije), alokaciju za 2011. godinu programa prekogranične suradnje sa zemljama nečlanicama (Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora i Hrvatska – Srbija) te alokacije za 2012. godinu i prvu polovicu 2013. godine za komponentu III. Slijedom navedenog, usporedni podaci prikazani su u apsolutnim iznosima a ne u postocima, budući da za potrebe postotnog prikaza podaci iz prošlog izvještajnog razdoblja nisu usporedivi.

<sup>3</sup> *Uključuje povećane iznose sufinanciranja EU za projekte Marišćina i Kaštijun, koji proizlaze iz stupanja na snagu izmijenjenih Dvostranih sporazuma za navedene projekte.*


**Tablica 3: Usporedni pregled ugovorenih, doznačenih i isplaćenih sredstava pojedinih komponenti programa IPA u predmetnom i prethodnom izvještajnom razdoblju (IPA sredstva, u milijunima eura)**

		IPA I	IPA II	IPA III	IPA IV	IPA V	UKUPNO
UGOVORENA SREDSTVA	na dan 30. lipnja 2013.	155,18	11,68	217,96	56,17	65,06	506,05
	na dan 31. prosinca 2012.	134,21	7,99	168,24	43,18	56,47	410,09
	razlika	20,97	3,69	49,72	12,99	8,59	95,96
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	na dan 30. lipnja 2013.	123,49	8,08	105,16	39,9	18,48	295,11
	na dan 31. prosinca 2012.	103,54	5,78	80,38	34,01	14,77	238,48
	razlika	19,95	2,30	24,78	5,89	3,71	56,63


U odnosu na prethodno razdoblje, najznačajniji napredak u ugovaranju ostvaren je u komponenti III programa IPA: na posljednji dan prethodnog izvještajnog razdoblja (31. prosinca 2012. godine) ukupno je ugovoreno 168,24 milijuna eura, dok ugovoreni iznos na posljednji dan predmetnog izvještajnog razdoblja (30. lipnja 2013. godine) iznosi 217,96 milijuna eura, što ukazuje na porast ugovaranja u apsolutnom iznosu od 49,72 milijuna eura ili gotovo 23% ukupno ugovorenih sredstava iz alokacija za razdoblje 2007.-2012.

Nadalje, promatrajući napredak u izvršenim plaćanjima, najveći napredak u odnosu na posljednji dan prethodnog izvještajnog razdoblja ostvaren je također u komponenti III programa IPA te iznosi 24,78 milijuna eura, odnosno 23,56% ukupno plaćenog iznosa iz alokacija za razdoblje 2007.-2012.

**Grafikon 1: Grafički prikaz napretka u ugovaranju pojedinih komponenti programa IPA u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (IPA sredstva, u milijunima eura)**

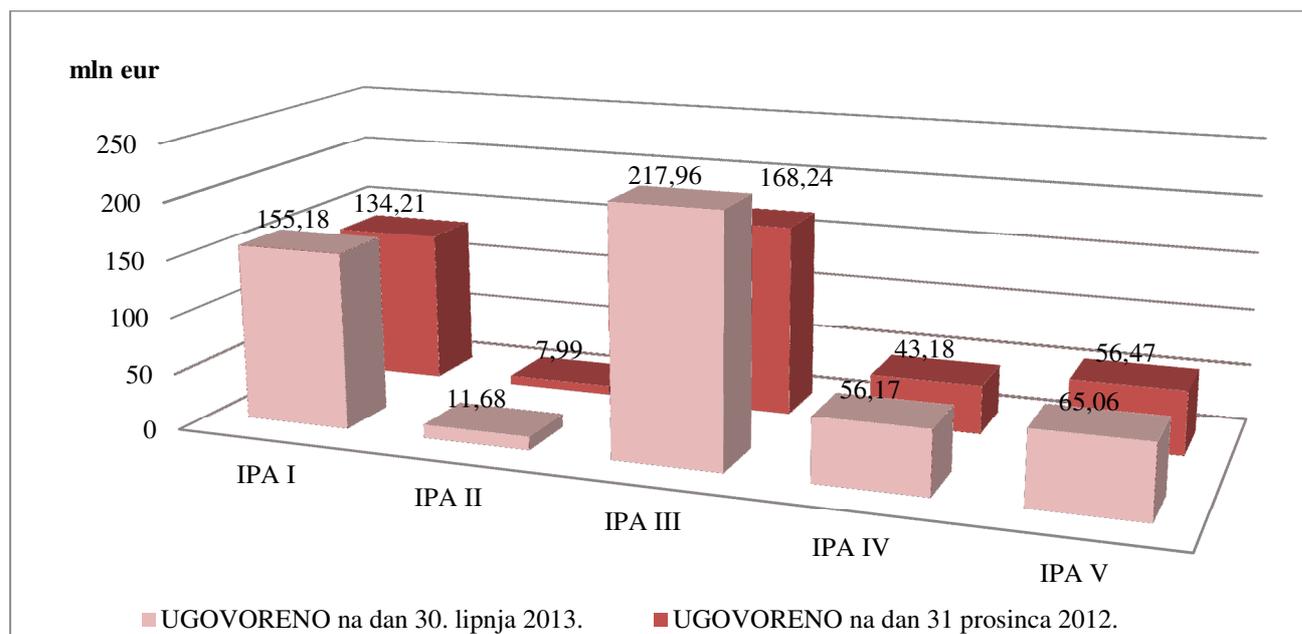

**Grafikon 2: Grafički prikaz napretka u izvršavanju plaćanja pojedinih komponenti programa IPA u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (IPA sredstva, u milijunima eura)**

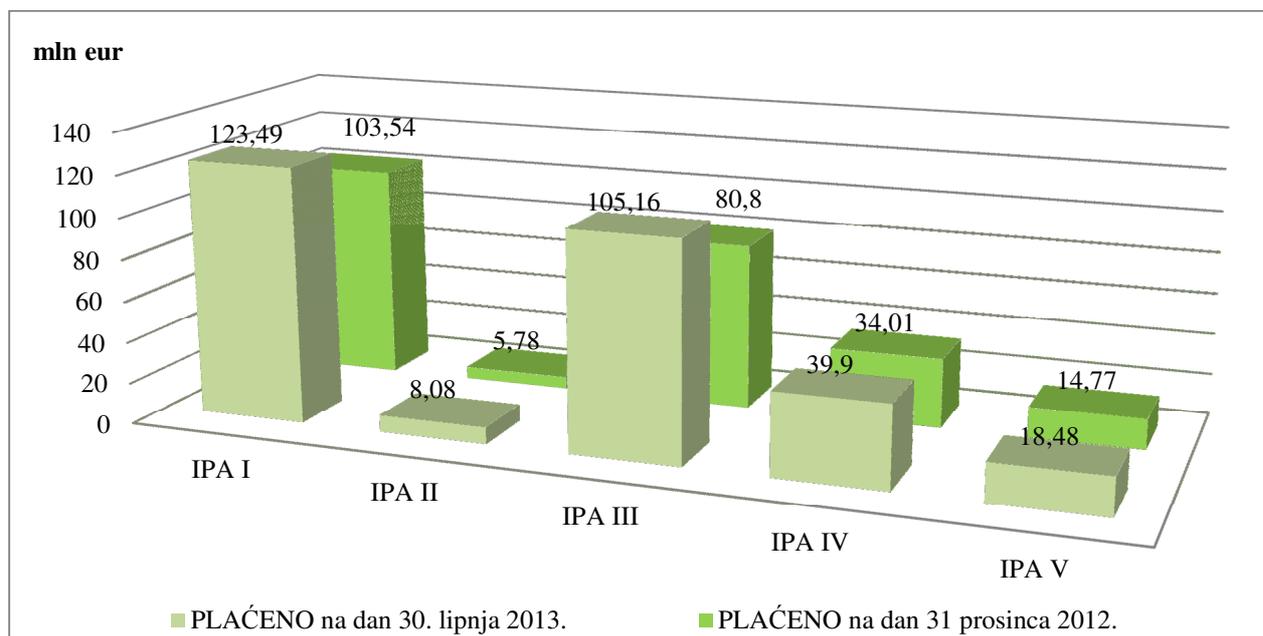

## 2.2. KLJUČNA ZBIVANJA

Slijedom priprema za dobivanje dozvole za rad bez prethodne (*ex-ante*) kontrole Delegacije Europske unije koje su završile u prethodnom izvještajnom razdoblju, ista je i dobivena za komponente I – IV programa IPA početkom 2013. godine: za komponentu I „Pomoć u tranziciji i jačanje institucija“ i za komponentu II programa IPA „Prekogranična suradnja“ 12. siječnja 2013. godine, za komponentu III programa IPA „Regionalni razvoj“ 24. siječnja 2013. godine te za komponentu IV programa IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ 19. veljače 2013. godine. Međutim, tijekom predmetnog izvještajnog razdoblja, odnosno do datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, Delegacija Europske unije nastavila je pratiti sve aspekte provedbe financijskih ugovora.

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru komponente I programa IPA za 2012. godinu potpisan je 9. svibnja 2013. godine, čime se ukupno dodijeljena sredstva za komponentu I programa IPA uvećavaju za alokaciju iz 2012. godine, u iznosu od 30,13 milijuna eura.

U okviru komponente II programa IPA - Prekogranična suradnja, potpisani su 13. lipnja 2013. godine s hrvatske strane, nakon što su prethodno potpisani od strane Europske komisije u travnju 2013., Sporazumi o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Operativne programe s državama nečlanicama Europske unije: Operativni program Hrvatska – Srbija, Operativni program Hrvatska - Bosna i Hercegovina te Operativni program Hrvatska - Crna Gora.

U predmetnom izvještajnom razdoblju došlo je do izmjena Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Operativne programe u sklopu komponente III programa IPA, i to:

- Izmjene Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Operativni program Promet (odnosno komponentu III A programa IPA), koje su potvrđene u Hrvatskom saboru Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji operativni program »Promet« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretprijetne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 2/2013);
- Izmjene Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Operativni program Zaštita okoliša (odnosno komponentu III B programa IPA), koje su potvrđene u Hrvatskom saboru Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program »Zaštita okoliša« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretprijetne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 2/2013); te
- Izmjene Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Operativni program Regionalna konkurentnost (odnosno komponentu III C programa IPA), koje su potvrđene u Hrvatskom saboru Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program »Regionalna konkurentnost« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretprijetne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 3/2013).

Također, došlo je do promjene u sustavu provedbe komponente III C programa IPA: temeljem Uredbe o izmjeni Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (Narodne novine, broj 76/2013), 21. lipnja 2013. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije preuzelo je od Ministarstva gospodarstva ovlasti Tijela nadležnog za Operativni program „Regionalna konkurentnost“.

Nastavno na dobivanje dozvole za rad bez prethodnih (ex-ante) kontrola Delegacije Europske unije, kao važnog koraka u kontekstu pripreme za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, u predmetnom izvještajnom razdoblju intenzivno su se nastavile provoditi pripremne aktivnosti za korištenje strukturnih fondova i Kohezijskog fonda: od rada na zajedničkim nacionalnim pravilima za upravljanje strukturnim instrumentima te rada na dokumentima potrebnima za procjenu usklađenosti sustava s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, do privođenja kraju procesa izrade programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2007.-2013. te intenziviranja procesa programiranja za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., kao i pokretanja dodatnih aktivnosti za jačanje administrativnih kapaciteta u tijelima odnosno institucijama u Sustavu upravljanja fondovima Europske unije.

U izvještajnom je razdoblju također osnovana Radna skupina za fondove Europske unije, u svrhu koordiniranja na visokoj razini svih aktivnosti koje se odnose na pripremu korištenja, unaprjeđenje korištenja i trajnog praćenja korištenja fondova Europske unije.

### **3. DETALJNI PREGLED PROVEDBE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI PROGRAMA IPA, PO KOMPONENTAMA**

#### **3.1. KOMPONENTA I PROGRAMA IPA - POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA**

Institucionalni okvir za provedbu komponente I programa IPA obuhvaća Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo za koordinaciju pripreme projektnih prijedloga te praćenje i vrednovanje programa, Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u svojstvu provedbenog tijela, te korisničke institucije iz državne i javne uprave.

Predmetna komponenta programa IPA namijenjena je izgradnji institucionalnih kapaciteta te ispunjavanju kriterija za članstvo u Europskoj uniji, a projekti nabave opreme, pružanja usluga, provedbe „twinning“ ugovora, izvođenja radova te dodjele bespovratnih sredstava odnose se na šest (6) sektorskih područja:

1. Reforma državne uprave, javne financije i javna nabava;
2. Pravda, sloboda i sigurnost;
3. Unutarnje tržište i gospodarstvo;
4. Poljoprivreda, ribarstvo, sigurnost hrane, veterinarstvo, fitosanitarni i sanitarni nadzor;
5. Kohezijska politika i rad;
6. Energetika, promet i zaštita okoliša.

Zaključno s 30. lipnja 2013. godine, ukupno ugovorena IPA sredstva komponente I<sup>4</sup> iznose 120,11 milijuna eura što čini 59,35% od ukupno dodijeljenog iznosa IPA sredstava (202,39 milijuna eura). U izvještajnom razdoblju krajnjim korisnicima i ugovarateljima isplaćeno je ukupno 15,57 milijuna eura, odnosno 17,30% od ukupno plaćenog iznosa (90,02 milijuna eura) od početka provedbe komponente I programa IPA. Slijedom navedenoga, do 30. lipnja 2013. godine plaćeno je 74,95% od ukupno ugovorenog iznosa IPA sredstava komponente I.

Na dan 30. lipnja 2013. godine, ukupno ugovorena sredstva nacionalnog sufinanciranja za komponentu I programa IPA iznosila su 22,72 milijuna eura, što čini 76,55% od ukupnog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja koje iznosi 29,68 milijuna eura. Do kraja izvještajnog razdoblja isplaćeno je ukupno 13,52 milijuna eura nacionalnih sredstava, što čini 59,51% ukupno ugovorenih sredstava nacionalnog sufinanciranja, dok za izvještajno razdoblje iznos isplaćenih nacionalnih sredstava iznosi 2,57 milijuna eura, ili 11,31% ukupno ugovorenih sredstava nacionalnog sufinanciranja.

---

<sup>4</sup> Nacionalni program i Nuklearna sigurnost.

**Tablica 4: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	2007.	2008.		2009.	2010.	2011.		2012.	UKUPNO
	NP	NP	NS	NP	NP	NP	NS	NP	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	39,95	35,8	0,95	36,8	31,18	26,77	0,81	30,13	202,39
UGOVORENA SREDSTVA	0	0	0	7,33	8,35	0,05	0,14	0	15,87
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	36,83	33,89	0,68	34,26	14,26	0,05	0,14	0	120,11
UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	0,00%	0,00%	0,00%	19,92%	26,78%	0,19%	17,28%	0,00%	7,84%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0	0	0,34	0	0	0	0	0	0,34
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,8	4,5	0,09	6,69	3,41	0	0,08	0	15,57
PLAĆENO./ UKUPNO UGOVORENO	2,17%	13,28%	13,24%	19,53%	23,91%	0,00%	57,14%	0,00%	12,96%
PLAĆENO / UKUPNO DODIJELJENO	2,00%	12,57%	9,47%	18,18%	10,94%	0,00%	9,88%	0,00%	7,69%
DOZNAČENO /UKUPNO DODIJELJENO	0,00%	0,00%	35,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%


NP - Nacionalni program; NS – Nuklearna sigurnost

**Tablica 5: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	2007.	2008.		2009.	2010.	2011.		2012.	UKUPNO
	NP	NP	NS	NP	NP	NP	NS	NP	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	39,95	35,8	0,95	36,8	31,18	26,77	0,81	30,13	202,39
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	36,83	33,89	0,68	34,26	14,26	0,05	0,14	0	120,11
UKUPNO UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	92,19%	94,66%	71,58%	93,10%	45,73%	0,19%	17,28%	0,00%	59,35%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA	34,91	32,2	0,44	23,92	9,35	2,68	0	0	103,5
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	34,19	27,18	0,39	20,7	7,48	0	0,08	0	90,02
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	92,83%	80,20%	57,35%	60,42%	52,45%	0,00%	57,14%	0,00%	74,95%
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	85,58%	75,92%	41,05%	56,25%	23,99%	0,00%	9,88%	0,00%	44,48%
UKUPNO DOZNAČENO/ UKUPNO DODIJELJENO	87,38%	89,94%	46,32%	65,00%	29,99%	10,01%	0,00%	0,00%	51,14%

NP - Nacionalni program; NS – Nuklearna sigurnost

**Grafikon 3: Grafički prikaz statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, zaključno s 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

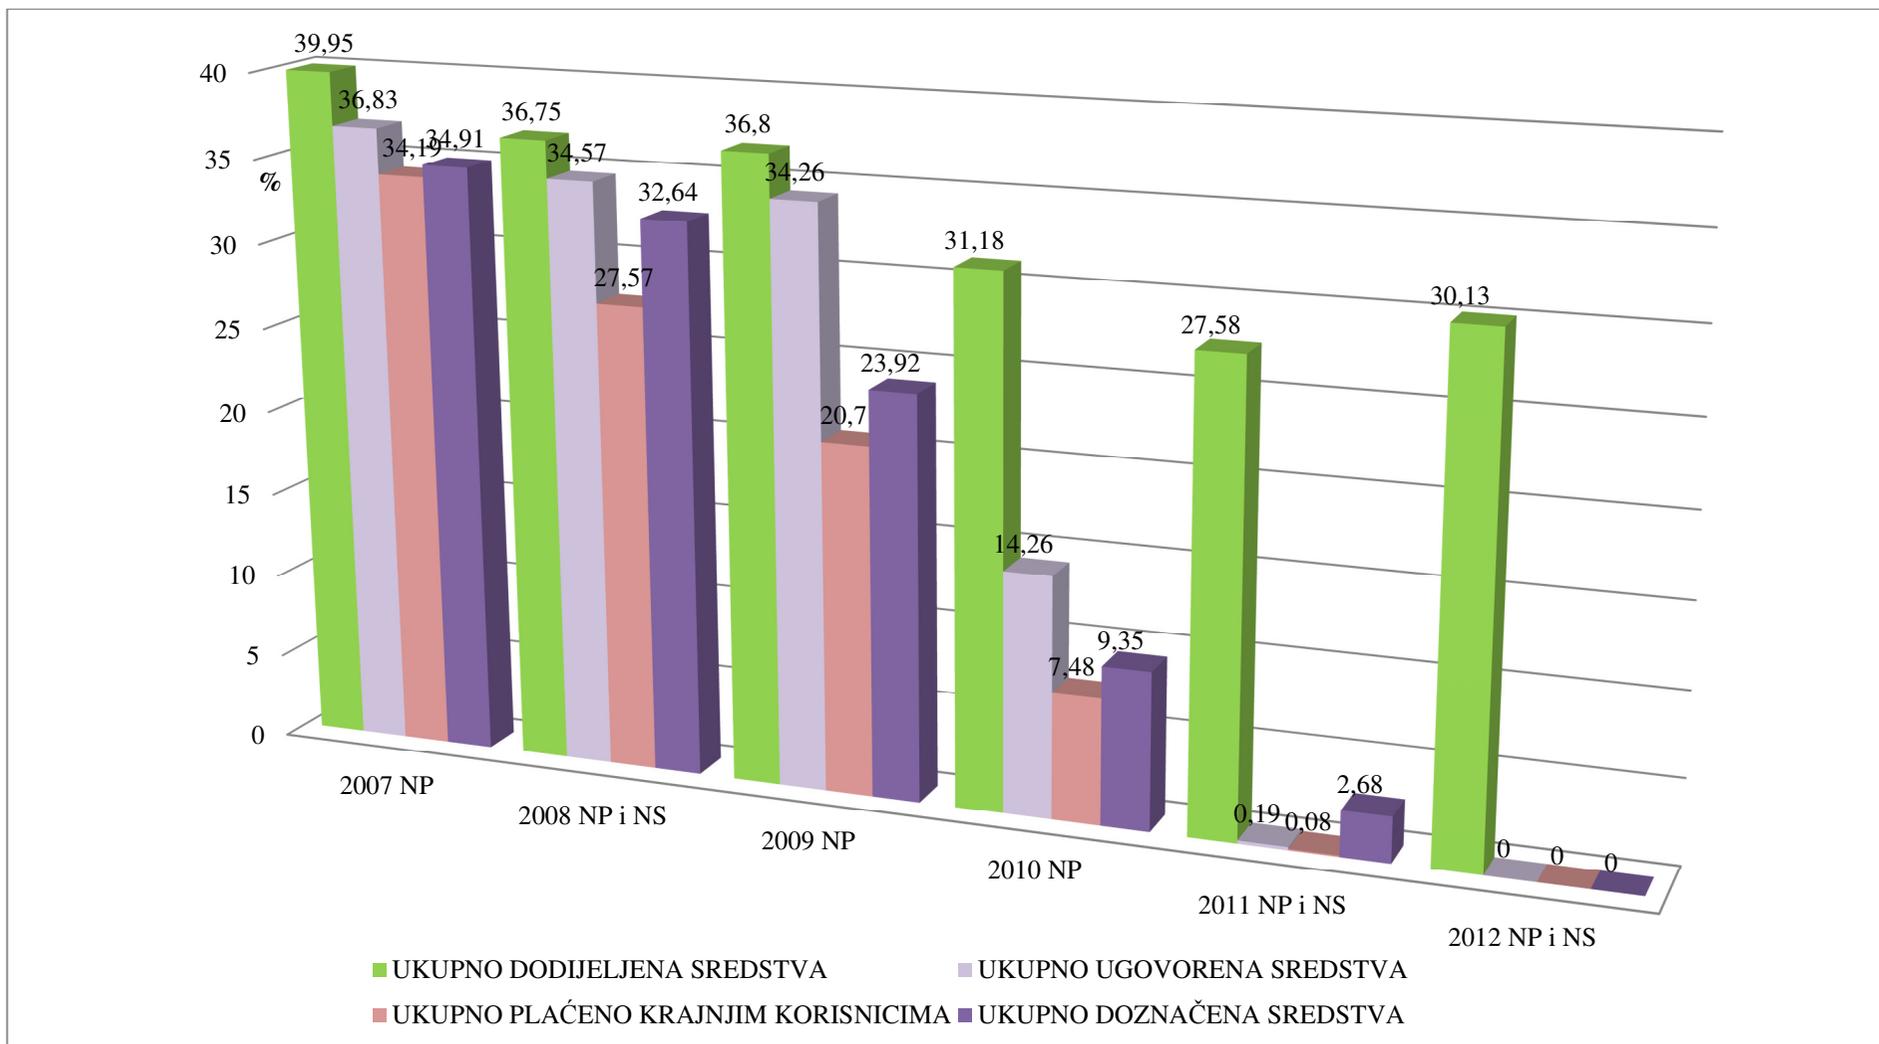

### **3.1.1. Nacionalni program Komponente I programa IPA 2007**

Dodijeljena sredstva za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2007. godinu iznose 39,95 milijuna eura, od čega je ugovoreno 36,83 milijuna eura ili 92,19% od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava. Krajnji rok za završetak provedbe projekata Nacionalnog programa istekao je 17. studenoga 2012. godine, a rok za izvršavanje plaćanja ističe 17. studenog 2013. godine.

Programska godina obuhvaća 15 projekata s 51 komponentom za koje su ukupno potpisana 73 ugovora (6 zasebnih okvirnih ugovora, 36 ugovora o nabavi roba, 12 „twinning“ ugovora, 10 „twinning light“ ugovora i 9 ugovora o uslugama). Do kraja izvještajnog razdoblja u provedbi je ostalo 15 ugovora (9 ugovora o nabavi roba je u jamstvenom roku, dok su 2 ugovora o nabavi usluga i 4 „twinning“ ugovora u fazi odobrenja završnih izvješća) te je 1 ugovor o uslugama otkazan zbog neispunjenja ugovornih obveza od strane ugovaratelja. Ostali ugovori, odnosno njih 57, završili su s provedbom u prethodnih izvještajnim razdobljima.

Od početka korištenja programa iz alokacije za 2007. godinu do zaključno 30. lipnja 2013. godine ukupno je isplaćeno 34,19 milijuna eura ili 92,83% od ukupno ugovorenog iznosa IPA sredstava. Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2007. godinu iznose 5,9 milijuna eura, a ugovoreno je 4,92 milijuna eura ili 83,39% od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja. Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2013. godine ukupno je isplaćeno 4,86 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja ili 98,78 % od ukupno ugovorenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja.

U izvještajnom razdoblju isplaćeno je 0,80 milijuna eura odnosno 2,17% od ukupno ugovorenog iznosa IPA sredstava te 0,01 milijun eura, odnosno 0,2% od ukupno ugovorenog iznosa nacionalnih sredstava.

**Tablica 6: Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA, iz godišnje alokacije za 2007. godinu, po Projektnom sažetku (eng. Project Fiche – PF), u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

Nacionalni program komponente I IPA 2007									
	UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UGOVORENA SREDSTVA	UGOVORENO/ UKUPNO DODIJELJENO	DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO
PF1	1,25	1,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
PF2	2,34	2,20		0,00%		0,27	12,27%	11,52%	
PF3	1,90	1,89		0,00%		0,31	16,39%	16,34%	
PF4	1,10	1,10		0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF5	1,84	1,84		0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF6	3,32	3,26		0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF7	5,65	5,39		0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF8	1,07	1,03		0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF9	2,24	1,82		0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF10	4,40	4,12		0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF11	1,90	1,47		0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF12	1,75	1,67		0,00%		0,06	3,76%	3,59%	
PF13	2,28	1,27		0,00%		0,08	6,65%	3,71%	
PF14	4,13	3,89		0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF15	4,78	4,63		0,00%		0,07	1,53%	1,48%	
<b>UKUPNO</b>	<b>39,95</b>	<b>36,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>2,17%</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00%</b>

PF1 Jačanje kapaciteta USKOK-a  
 PF2 Poboljšanje međuagencijske suradnje u području borbe protiv korupcije  
 PF3 Razvoj kapaciteta u području zaštite osobnih podataka  
 PF4 Razvoj sustava za procjenu učinka propisa  
 PF5 Provedba politike zaštite tržišnog natjecanja i politike državnih potpora u RH  
 PF6 Jačanje agencije za telekomunikacije  
 PF7 Upravljanje i kontrola sredstava za poljoprivredu

PF8 Upravljanje podacima iz energetskega sektora  
 PF9 Zdravstvo i zaštita na radu  
 PF10 Upravljanje sustavom informacija na graničnim prijelazima - Faza III  
 PF11 Borba protiv zlouporabe droga i trgovanja ljudima  
 PF12 Kemijska sigurnost  
 PF13 Razvoj sustava carinskih laboratorija  
 PF14 Opremanje jedinice za borbu protiv krijumčarenja  
 PF15 Tehnička pomoć

**Tablica 7: Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2007. godinu, po Projektnom sažetku (eng. Project Fiche – PF), od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

Nacionalni program komponente I IPA 2007								
	UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	UKUPNO PLAĆENO KRAJNJI KORISNICIMA	UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO
PF1	1,25	1,24	98,78%	34,91	0,89	71,71%	70,83%	87,38%
PF2	2,34	2,20	93,89%		2,00	90,85%	85,30%	
PF3	1,90	1,89	99,67%		1,44	76,35%	76,11%	
PF4	1,10	1,10	100,00%		0,99	90,00%	90,00%	
PF5	1,84	1,84	100,00%		1,71	92,70%	92,70%	
PF6	3,32	3,26	98,22%		3,25	99,55%	97,78%	
PF7	5,65	5,39	95,53%		5,21	96,55%	92,23%	
PF8	1,07	1,03	96,17%		0,95	91,98%	88,46%	
PF9	2,24	1,82	81,25%		1,65	90,66%	73,66%	
PF10	4,40	4,12	93,64%		4,11	99,76%	93,41%	
PF11	1,90	1,47	77,37%		1,37	93,20%	72,11%	
PF12	1,75	1,67	95,43%		1,62	97,01%	92,57%	
PF13	2,28	1,27	55,70%		1,25	98,43%	54,82%	
PF14	4,13	3,89	94,19%		3,77	96,92%	91,28%	
PF15	4,78	4,63	96,86%		3,99	86,18%	83,47%	
<b>UKUPNO</b>	<b>39,95</b>	<b>36,83</b>	<b>92,19%</b>	<b>34,91</b>	<b>34,19</b>	<b>92,83%</b>	<b>85,58%</b>	<b>87,38%</b>

PF1 Jačanje kapaciteta USKOK-a  
 PF2 Poboljšanje međuagencijske suradnje u području borbe protiv korupcije  
 PF3 Razvoj kapaciteta u području zaštite osobnih podataka  
 PF4 Razvoj sustava za procjenu učinka propisa  
 PF5 Provedba politike zaštite tržišnog natjecanja i politike državnih potpora u RH  
 PF6 Jačanje agencije za telekomunikacije  
 PF7 Upravljanje i kontrola sredstava za poljoprivredu

PF8 Upravljanje podacima iz energetskog sektora  
 PF9 Zdravstvo i zaštita na radu  
 PF10 Upravljanje sustavom informacija na graničnim prijelazima - Faza III  
 PF11 Borba protiv zlouporabe droga i trgovanja ljudima  
 PF12 Kemijska sigurnost  
 PF13 Razvoj sustava carinskih laboratorija  
 PF14 Opremanje jedinice za borbu protiv krijumčarenja  
 PF15 Tehnička pomoć

### **3.1.2. Komponenta I programa IPA 2008**

#### **3.1.2.1. Nacionalni program**

Dodijeljena sredstva za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2008. godinu iznose 35,80 milijuna eura, a ugovoreno je 33,89 milijuna eura ili 94,66% dodijeljenih sredstava. Rok za ugovaranje Nacionalnog programa istekao je 5. lipnja 2012. godine, krajnji rok za završetak provedbe je 5. lipanj 2014. godine, dok se sva plaćanja moraju izvršiti do 5. lipnja 2015. godine.

U tijeku su aktivnosti provedbe projekata, kao i izvršavanje plaćanja po potpisanim ugovorima.

Programska godina obuhvaća 16 projekata u sklopu kojih su potpisana 92 ugovora. U izvještajnom razdoblju u provedbi je ukupno 41 ugovor (4 zasebna okvirna ugovora, 13 ugovora o bespovratnim sredstvima, 9 ugovora o uslugama, 3 ugovora o nabavi robe, 5 „twinning“ ugovora, 5 „twinning light“ ugovora i 2 ugovora o radovima), dok je 49 ugovora (9 zasebnih okvirnih ugovora, 3 ugovora o bespovratnim sredstvima, 4 ugovora o uslugama, 22 ugovora o nabavi robe, 1 „twinning“ ugovor, 10 „twinning light“ ugovora) završilo s provedbom. Jedan ugovor o radovima je raskinut u izvještajnom razdoblju zbog neizvršavanja ugovornih obveza izvođača (pored jednog raskinutog u 2011. godini uslijed izmijenjenih okolnosti na lokaciji i posljedične nemogućnosti izvođenja radova).

Od ukupno ugovorenog iznosa od 33,89 milijuna eura IPA sredstava iz alokacije za 2008. godinu, kroz sheme bespovratnih sredstava ugovoreno je 2,51 milijun eura. Prikaz geografske rasprostranjenosti shema bespovratnih sredstava prikazan je na grafikonu 4.

Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2013. godine ukupno je isplaćeno 27,18 milijuna eura ili 80,20% ugovorenog iznosa IPA sredstava. Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2008. godinu iznose 6,91 milijuna eura, a ugovoreno je 6,41 milijuna eura ili 92,76% od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja. Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2013. godine ukupno je isplaćeno 5,24 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja ili 81,75% od ukupno ugovorenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine isplaćeno je 4,50 milijuna eura odnosno 13,28% od ukupno ugovorenog iznosa IPA sredstava. U istom razdoblju isplaćeno je 0,89 milijuna eura odnosno 13,88% od ukupno ugovorenog iznosa nacionalnih sredstava.

**Tablica 8: Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2008. godinu, po Projektnom sažetku (eng. Project Fiche – PF), u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

Nacionalni program komponente I IPA 2008									
	UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UGOVORENA SREDSTVA	UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO	PLAĆENO /UKUPNO DODIJELJENO	DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO
PF1	1,90	1,75	0,00	0,00%	0,00	0,08	4,65%	4,28%	0,00%
PF2	1,64	1,57		0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF3	3,00	2,93		0,00%		0,31	10,55%	10,30%	
PF4	1,47	1,47		0,00%		0,23	15,86%	15,86%	
PF5	1,44	1,44		0,00%		0,39	26,90%	26,90%	
PF6	0,96	0,96		0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF7	2,60	2,46		0,00%		0,60	24,39%	23,08%	
PF8	3,89	3,50		0,00%		0,16	4,68%	4,21%	
PF9	1,62	1,37		0,00%		0,12	8,90%	7,53%	
PF10	1,86	1,72		0,00%		0,19	11,00%	10,17%	
PF11	0,94	0,94		0,00%		0,42	44,89%	44,89%	
PF12	0,72	0,72		0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF13	4,00	3,93		0,00%		1,07	27,28%	26,81%	
PF14	3,45	3,21		0,00%		0,83	25,83%	24,03%	
PF15	1,04	1,04		0,00%		0,04	3,50%	3,50%	
PF16	5,27	4,88		0,00%		0,05	1,11%	1,03%	
<b>UKUPNO</b>	<b>35,80</b>	<b>33,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>13,28%</b>	<b>12,57%</b>	<b>0,00%</b>

PF1 Potpora reformi kaznenog postupka

PF2 Razvoj službi vezano uz probaciju

PF3 Jačanje kapaciteta civilnog društva u cilju nadzora provedbe pravne stečevine EU

PF4 Projekt podrške Romima - Faza 3

PF5 Provedba Zakona o Općem upravnom postupku

PF6 Tehnička pomoć razvoju odabranih područja statistike

PF7 Potpora jačanju kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspekcije

PF8 Podrška nadzoru/eradikaciji bolesti životinja

PF9 Jačanje tržišne komponente sektora ribarstva

PF10 Učinkovito djelovanje sustava nadzora prometnih inspekcija

PF11 Nadzor ovisnosti sustava energetske opskrbe u cilju sigurnosti opskrbe

PF12 Edukacijski centar HZZ-a za potrebe tržišta rada

PF13 Podrška upravljanju, nadzoru i evaluaciji strukturnih instrumenata u RH

PF14 Nadzor plave granice - Faza 2

PF15 Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša usklađenog s EU zakonodavstvom u slučajevima kaznenih djela protiv okoliša

PF16 Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnog kapaciteta (FPPRAC)

**Tablica 9: Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2008., po Projektom sažetku (eng. Project Fiche – PF), od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

Nacionalni program komponente I IPA 2008								
	UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	UKUPNO PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO
PF1	1,90	1,75	92,11%	32,20	1,15	65,71%	60,53%	89,94%
PF2	35,80	33,89	94,66%		27,18	80,20%	75,92%	
PF3	3,00	2,93	97,67%		2,27	77,47%	75,67%	
PF4	1,47	1,47	100,00%		1,04	70,75%	70,75%	
PF5	1,44	1,44	100,00%		0,95	65,97%	65,97%	
PF6	0,96	0,96	100,00%		0,72	75,00%	75,00%	
PF7	2,60	2,46	94,62%		1,82	73,98%	70,00%	
PF8	3,89	3,50	89,97%		2,84	81,14%	73,01%	
PF9	1,62	1,37	84,57%		0,96	70,07%	59,26%	
PF10	1,86	1,72	92,47%		1,60	93,02%	86,02%	
PF11	0,94	0,94	100,00%		0,71	75,53%	75,53%	
PF12	0,72	0,72	100,00%		0,71	98,61%	98,61%	
PF13	4,00	3,93	98,25%		3,18	80,92%	79,50%	
PF14	3,45	3,21	93,04%		3,05	95,02%	88,41%	
PF15	1,04	1,04	100,00%		0,98	94,23%	94,23%	
PF16	5,27	4,88	92,60%		3,79	77,66%	71,92%	
<b>UKUPNO</b>	<b>35,80</b>	<b>33,89</b>	<b>94,66%</b>	<b>32,20</b>	<b>27,18</b>	<b>80,20%</b>	<b>75,92%</b>	<b>89,94%</b>

PF1 Potpora reformi kaznenog postupka

PF2 Razvoj službi vezano uz probaciju

PF3 Jačanje kapaciteta civilnog društva u cilju nadzora provedbe pravne stečevine EU

PF4 Projekt podrške Romima - Faza 3

PF5 Provedba Zakona o Općem upravnom postupku

PF6 Tehnička pomoć razvoju odabranih područja statistike

PF7 Potpora jačanju kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspekcije

PF8 Podrška nadzoru/eradikaciji bolesti životinja

PF9 Jačanje tržišne komponente sektora ribarstva

PF10 Učinkovito djelovanje sustava nadzora prometnih inspekcija

PF11 Nadzor ovisnosti sustava energetske opskrbe u cilju sigurnosti opskrbe

PF12 Edukacijski centar HZZ-a za potrebe tržišta rada


PF13 Podrška upravljanju, nadzoru i evaluaciji strukturnih instrumenata u RH

PF14 Nadzor plave granice - Faza 2

PF15 Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša usklađenog s EU zakonodavstvom u slučajevima kaznenih djela protiv okoliša

PF16 Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnog kapaciteta (FPPRAC)

**Grafikon 4: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2008. godinu (IPA sredstva, u postocima)**

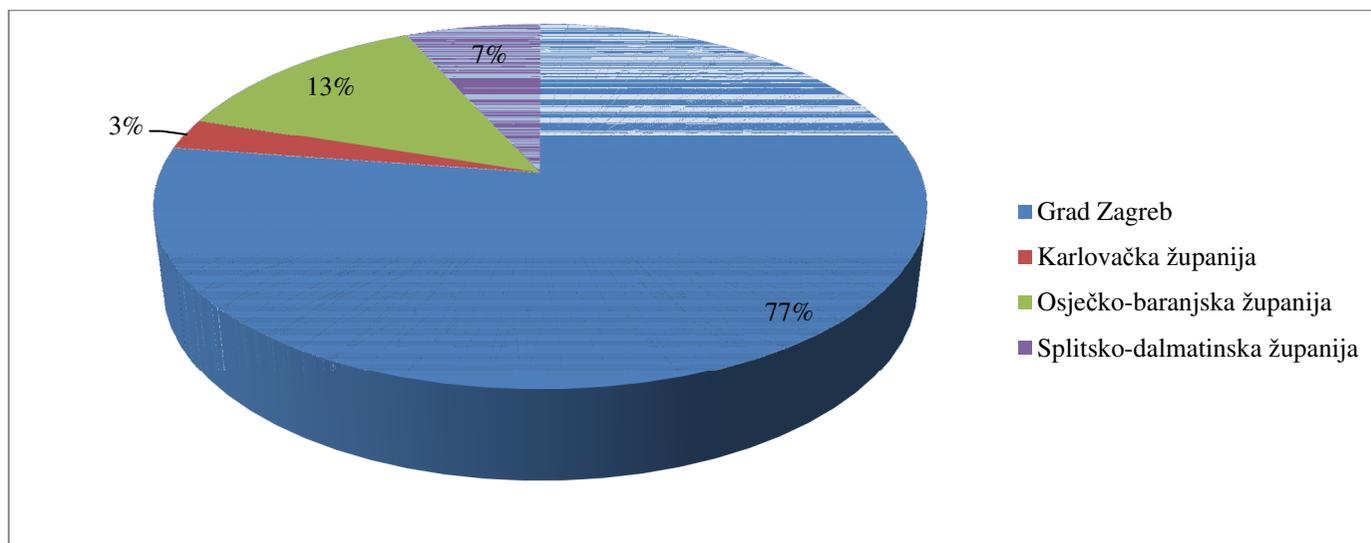

### 3.1.2.2. Nuklearna sigurnost

Dodijeljena sredstva za komponentu I programa IPA Nuklearna sigurnost iz alokacije za 2008. godinu iznose 0,95 milijuna eura, a ugovoreno je 0,68 milijuna eura odnosno 71,58% dodijeljenih sredstava. Rok za ugovaranje je istekao 30. rujna 2012. godine.

Ugovorena su ukupno 4 ugovora od čega 2 ugovora tehničke pomoći, te 2 ugovora za nabavu roba. Svi navedeni ugovori su u fazi provedbe.

Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za komponentu I programa IPA Nuklearna sigurnost iz alokacije za 2008. godinu iznose 0,21 milijun eura, a ugovoreno je 0,13 milijuna eura ili 61,90% od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja.

Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2013. godine ukupno je isplaćeno 0,39 milijuna eura IPA sredstava ili 57,35 % ukupno ugovorenog iznosa IPA sredstava. U istom razdoblju je isplaćen 0,1 milijun eura nacionalnog sufinanciranja ili 76,92% od ukupno ugovorenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja.

U izvještajnom razdoblju isplaćeno je 0,09 milijuna eura odnosno 13,24% od ukupno ugovorenog iznosa IPA sredstava te 0,03 milijuna eura odnosno 23,08% od ukupno ugovorenog iznosa nacionalnih sredstava.

**Tablica 10: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA Nuklearna sigurnost iz godišnje alokacije za 2008. godinu u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	IPA 2008 Nuklearna sigurnost		
	Tehnička pomoć za zaštitu od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja	Jačanje administrativnog kapaciteta Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, regulatornog tijela za nuklearno osiguranje i sigurnost	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,70	0,25	0,95
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,49	0,19	0,68
UGOVORENA SREDSTVA	0,00		0,00
UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	0,00%	0,00%	0,00%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,34		0,34
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,09	0,00	0,09
PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO	19,36%	0,00%	13,24%
PLAĆENO /UKUPNO DODIJELJENO	13,55%	0,00%	9,47%
DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	35,79%		35,79%

**Tablica 11: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA Nuklearna sigurnost iz godišnje alokacije za 2008. od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eurima)**

	IPA 2008 Nuklearna sigurnost		
	Tehnička pomoć za zaštitu od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja	Jačanje administrativnog kapaciteta Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, regulatornog tijela za nuklearno osiguranje i sigurnost	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,70	0,25	0,95
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,49	0,19	0,68
UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	70,00%	76,00%	71,58%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,44		0,44
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,31	0,08	0,39
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	63,27%	40,32%	57,35%
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	44,29%	30,64%	41,05%
UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	46,32%		46,32%

### 3.1.3. Nacionalni program komponente I programa IPA 2009

Dodijeljena sredstva za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2009. godinu iznose 36,80 milijuna eura, a ugovoreno je 34,26 milijuna eura ili 93,10% dodijeljenih IPA sredstava. Krajnji rok za ugovaranje istekao je 5. svibnja 2013. godine, završetak provedbe svih ugovora je 5. svibnja 2015. godine, a sva plaćanja se moraju izvršiti do 5. svibnja 2016. godine.

Tijekom ugovaranja projekata iz obuhvata predmetnog programa, zahvaljujući ostvarenom natjecanju u postupcima javne nabave ostvarene su uštede iznose 4,59% dodijeljenih sredstava. Preostali iznos od 2,15% predstavlja postotak dodijeljenih sredstava za projekte otkazane prije objave (u jednom slučaju projekt je već ranije ugovoren kroz nacionalni okvir financiranja, odnosno u drugom zahtjev za pregovaračkim postupkom nije bio primjenjiv) te postotak od 0,15% koji se odnosi na natječaje koji su otkazani nakon objave, budući da za njih nisu zaprimljene ponude ili pristigle ponude nisu bile u skladu s uvjetima samog natječaja.

Potrebno je naglasiti kako su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje smanjene uštede u okviru predmetnog programa sa 7,83% na konačnih 4,59% dodijeljenih sredstava na način da su se financirali novi projekti u skladu s utvrđenim prioritetima te su ponovljeni neuspješni natječaji.

Programska godina obuhvaća 20 projekata koji se sastoje od 43 komponente. Također, odobreno je 20 projekata unutar Instrumenta za pripremu projekata i jačanje administrativnih kapaciteta u vrijednosti 5,86 milijuna eura ili 15,92% dodijeljenih IPA sredstava. Sveukupno

unutar programske godine je potpisan 101 ugovor (od kojih 9 zasebnih okvirnih ugovora, 14 ugovora o uslugama, 14 „twinning“ ugovora, 8 „twinning light“ ugovora, 17 ugovora o bespovratnim sredstvima, 35 ugovora o nabavi roba i 4 ugovora o radovima) od čega je u izvještajnom razdoblju s provedbom završilo 8 ugovora (1 zasebni okvirni ugovor, 1 „twinning light“ ugovor i 6 ugovora o nabavi roba). U prethodnim izvještajnim razdobljima s provedbom je završilo 13 ugovora (7 ugovora o nabavi roba, 1 zasebni okvirni ugovor, 2 ugovora o nabavi usluga i 3 „twinning light“ ugovora). Ostali ugovori, njih 80 (7 zasebnih okvirnih ugovora, 12 ugovora o uslugama, 14 „twinning“ ugovora, 4 „twinning light“ ugovora, 17 ugovora o bespovratnim sredstvima, 22 ugovora o nabavi roba i 4 ugovora o radovima) su u fazi provedbe.

Od ukupno ugovorenog iznosa od 34,26 milijuna eura IPA sredstava iz alokacije za 2009. godinu, iznos od 5,54 milijuna eura odnosi se na ugovorene sheme bespovratnih sredstava. Prikaz geografske rasprostranjenosti shema bespovratnih sredstava prikazan je na grafikonu 5 pri čemu predmetni prikaz ne obuhvaća iznos od 3,16 milijuna eura koji se odnosi na Projektni sažetak 5 „Program razminiravanja u ratom zahvaćenim područjima“, s obzirom da isti obuhvaća područje cijele Republike Hrvatske.

Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2013. godine ukupno je isplaćeno 20,70 milijuna eura IPA sredstava ili 60,42% ugovorenog iznosa IPA sredstava. Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2009. godinu iznose 6,26 milijuna eura, a ugovoreno je 5,28 milijuna eura ili 84,35% od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja. Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2013. godine ukupno je isplaćeno 2,83 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja ili 53,60 % od ukupno ugovorenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja.

U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 7,33 milijuna eura, odnosno 19,92% dodijeljenih IPA sredstava, a isplaćeno je 6,69 milijuna eura ili 19,53% ukupno ugovorenog iznosa IPA sredstava.

U predmetnom izvještajnom razdoblju ugovoreno je 1,51 milijuna eura, odnosno 24,12% dodijeljenih nacionalnih sredstava, a isplaćeno je 1,25 milijuna eura odnosno 23,67% od ukupno ugovorenog iznosa nacionalnih sredstava.

**Tablica 12: Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2009. godinu, po Projektnom sažetku (eng. Project Fiche – PF), u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

Nacionalni program komponente I IPA 2009									
	UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UGOVORENA SREDSTVA	UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO	PLAĆENO /UKUPNO DODIJELJENO	DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO
PF1	1,00	0,92	7,33	19,92%	0,00	0,22	23,99%	22,07%	0,00%
PF2	2,60	2,54				0,35	13,78%	13,46%	
PF3	1,00	0,89				0,48	53,93%	48,00%	
PF4	1,37	1,12				0,02	1,55%	1,27%	
PF5	3,16	3,16				0,94	29,75%	29,75%	
PF6	0,91	0,84				0,28	33,33%	30,77%	
PF7	0,95	0,95				0,00	0,00%	0,00%	
PF8	0,74	0,72				0,00	0,00%	0,00%	
PF9	1,10	1,04				0,01	0,62%	0,59%	
PF10	1,86	1,79				0,43	24,02%	23,12%	
PF11	0,95	0,91				0,00	0,00%	0,00%	
PF12	2,00	1,21				0,62	50,99%	30,85%	
PF13	1,50	1,25				0,34	27,20%	22,67%	
PF14	0,80	0,77				0,08	9,83%	9,46%	
PF15	3,60	3,36				1,50	44,64%	41,67%	
PF16	1,30	1,23				0,04	3,20%	3,03%	
PF17	1,70	1,62				0,32	19,53%	18,61%	
PF18	2,03	1,98				0,02	0,89%	0,87%	
PF19	5,85	5,58				0,84	15,02%	14,33%	
PF20	2,38	2,38				0,22	9,27%	9,27%	
UKUPNO	36,80	34,26	7,33	19,92%	0,00	6,69	19,53%	18,18%	0,00%

PF1 Izgradnja kapaciteta za provedbu Direktive o onečišćenju određenim opasnim tvarima koje se ispuštaju u vodni okoliš i Okvirne direktive o vodama

PF2 Jačanje kapaciteta za primjenu okolišnog acquisa u području upravljanja otpadom, integrirano sprječavanje i nadzor onečišćenja i zaštitu od buke

PF3 Pripreme za eCTD i uvođenja digitalnog arhivskog informacijskog sustava

PF4 Izgradnja kapaciteta u području borbe protiv seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece, te o policijskoj pomoći ugroženim žrtvama kaznenih djela

PF5 Program razminiranja u ratom zahvaćenim područjima

PF6 Modernizacija nadzora državne granice

PF7 Jačanje administrativne sposobnosti Porezne uprave na području revizije

PF8 Uspostava cjelovitog sustava za anti-diskriminaciju

PF9 Stručno usavršavanje sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava izobrazbe

PF10 Daljnje poboljšanje institucionalnih kapaciteta svih prekršajnih sudova i razvoj ICMS kompatibilnih modula na odabranim prekršajnim sudovima

PF11 Jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih tijela i provedbenih agencija za koordinaciju shema socijalne sigurnosti

PF12 Jačanje institucionalnih kapaciteta za krv, tkiva i stanice

PF13 Nabava IT opreme za policijske stanice

PF14 Tehnička pomoć razvoju odabranih područja statistike

PF15 Nadogradnja četiri dugoročne veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspeksijske postaje

PF16 Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta s ciljem osiguravanja učinkovitog obavljanja djelatnosti Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo, te unapređenje administrativnih i tehničkih kapaciteta za istraživanje nesreća

PF17 Jačanje kapaciteta za pripremu planova upravljanja i jačanje inspekcije zaštite prirode za predložena NATURA 2000 područja

PF18 Rekonstrukcija Maškovića Han i gospodarska revitalizacija naselja Vrana

PF19 Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnih kapaciteta

PF20 Jačanje održivosti i razvoja organizacija civilnog društva kao proaktivnih društvenih aktera u provedbi pravne stečevine EU

**Tablica 13: Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2009. godinu, po Projektnom sažetku (eng. Project Fiche – PF), od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

Nacionalni program komponente I IPA 2009								
	UKUPNO DODIJELJEN A SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	UKUPNO PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO
PF1	1,00	0,92	92,00%	23,92	0,78	84,78%	78,00%	65,00%
PF2	2,60	2,54	97,69%		1,83	72,05%	70,38%	
PF3	1,00	0,89	89,00%		0,48	53,93%	48,00%	
PF4	1,37	1,12	81,75%		0,87	77,68%	63,50%	
PF5	3,16	3,16	100,00%		2,53	80,06%	80,06%	
PF6	0,91	0,84	92,31%		0,59	70,24%	64,84%	
PF7	0,95	0,95	100,00%		0,43	45,26%	45,26%	
PF8	0,74	0,72	97,30%		0,63	87,50%	85,14%	
PF9	1,10	1,04	94,55%		0,49	47,12%	44,55%	
PF10	1,86	1,79	96,24%		0,82	45,81%	44,09%	
PF11	0,95	0,91	95,79%		0,82	90,11%	86,32%	
PF12	2,00	1,21	60,50%		0,62	51,24%	31,00%	
PF13	1,50	1,25	83,33%		0,85	68,00%	56,67%	
PF14	0,80	0,77	96,25%		0,27	35,06%	33,75%	
PF15	3,60	3,36	93,33%		1,93	57,44%	53,61%	
PF16	1,30	1,23	94,62%		0,61	49,59%	46,92%	
PF17	1,70	1,62	95,29%		0,93	57,41%	54,71%	
PF18	2,03	1,98	97,54%		0,24	12,12%	11,82%	
PF19	5,85	5,58	95,38%		3,60	64,52%	61,54%	
PF20	2,38	2,38	100,00%		1,38	57,98%	57,98%	
UKUPNO	36,80	34,26	93,10%	23,92	20,70	60,42%	56,25%	65,00%

PF1 Izgradnja kapaciteta za provedbu Direktive o onečišćenju određenim opasnim tvarima koje se ispuštaju u vodni okoliš i Okvirne direktive o vodama

PF2 Jačanje kapaciteta za primjenu okolišnog acquisa u području upravljanja otpadom, integrirano sprječavanje i nadzor onečišćenja i zaštitu od buke

PF3 Pripreme za eCTD i uvođenja digitalnog arhivskog informacijskog sustava

PF4 Izgradnja kapaciteta u području borbe protiv seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece, te o policijskoj pomoći ugroženim žrtvama kaznenih djela

PF5 Program razminiravanja u ratom zahvaćenim područjima

PF6 Modernizacija nadzora državne granice

PF7 Jačanje administrativne sposobnosti Porezne uprave na području revizije

PF8 Uspostava cjelovitog sustava za anti-diskriminaciju

PF9 Stručno usavršavanje sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava izobrazbe

PF10 Daljnje poboljšanje institucionalnih kapaciteta svih prekršajnih sudova i razvoj ICMS kompatibilnih modula na odabranim prekršajnim sudovima

PF11 Jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih tijela i provedbenih agencija za koordinaciju shema socijalne sigurnosti

PF12 Jačanje institucionalnih kapaciteta za krv, tkiva i stanice

PF13 Nabava IT opreme za policijske stanice

PF14 Tehnička pomoć razvoju odabranih područja statistike

PF15 Nadogradnja četiri dugoročne veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspeksijske postaje

PF16 Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta s ciljem osiguravanja učinkovitog obavljanja djelatnosti Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo, te unapređenje administrativnih i tehničkih kapaciteta za istraživanje nesreća


PF17 Jačanje kapaciteta za pripremu planova upravljanja i jačanje inspekcije zaštite prirode za predložena NATURA 2000 područja

PF18 Rekonstrukcija Maškovića Han i gospodarska revitalizacija naselja Vrana

PF19 Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnih kapaciteta

PF20 Jačanje održivosti i razvoja organizacija civilnog društva kao proaktivnih društvenih aktera u provedbi pravne stečevine EU

**Grafikon 5: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2009. godinu<sup>5</sup>**

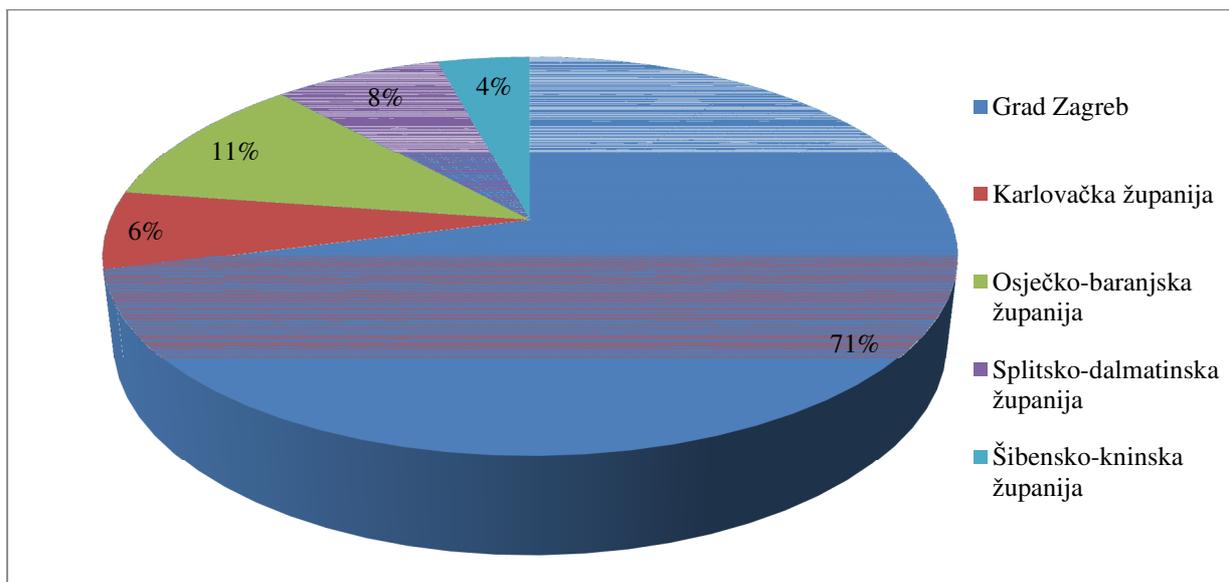

<sup>5</sup> Darovnica “Program razminiranja u ratom pogođenim područjima” (ukupne vrijednosti iznosa od 3,16 milijuna eura) nije obuhvaćena grafikonom 5, jer se odnosi na cijelu Republiku Hrvatsku

### 3.1.4. Nacionalni program komponente I programa IPA 2010

Dodijeljena sredstva za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2010. godinu iznose 31,18 milijuna eura. Zbog revizije pravnog sustava ovrhe koja je uvjetovala izmjenu projekta „Poboljšanje sustava ovrhe u Republici Hrvatskoj“, krajnji rok za ugovaranje je produžen do 7. travnja 2014. godine, čime se rok za završetak provedbe svih ugovora produžuje do 7. travnja 2016. godine i slijedom toga rok za izvršenje plaćanja do 7. travnja 2017. godine.

Program obuhvaća 11 projekata koji se sastoje od 23 komponente, dok se unutar Fleksibilnog instrumenta za jačanje administrativnih kapaciteta nalazi 17 projekata. Do 30. lipnja 2013. godine potpisano je ukupno 27 ugovora od čega 14 ugovora o bespovratnim sredstvima, 2 „twinning“ ugovora, 3 „twinning light“ ugovora, 4 ugovora o nabavi roba, 3 ugovora o uslugama i 1 zasebni okvirni ugovor. Svi ugovori su u fazi provedbe.

Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2013. godine ugovoreno je 14,26 milijuna eura ili 45,73% dodijeljenih IPA sredstava. Trenutno je objavljeno odnosno u postupku ugovaranja je 15 natječaja u vrijednosti 12,65 milijuna eura ili 40,57% dodijeljenih IPA sredstava, a u pripremi 5 natječaja u vrijednosti 2,34 milijuna eura ili 7,50% dodijeljenih IPA sredstava. Preostali dio od 1,92 milijuna eura odnosno 6,15% dodijeljenih IPA sredstava predstavljaju uštede koje su dosad ostvarene u postupcima javne nabave.

Od ukupno ugovorenog iznosa od 14,26 milijuna eura IPA sredstava iz alokacije za 2010. godinu, iznos od 5,10 milijuna eura odnosi se na ugovorene sheme bespovratnih sredstava. Prikaz geografske rasprostranjenosti shema bespovratnih sredstava prikazan je na grafikonu 6. Predmetni prikaz ne obuhvaća iznos 3,00 milijuna eura koji se odnosi na Projektni sažetak 4 „Program razminiravanja u ratom zahvaćenim područjima“, s obzirom da isti obuhvaća područje cijele Republike Hrvatske.

U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 8,35 milijuna eura, odnosno 26,78% dodijeljenih IPA sredstava. Do dana 30. lipnja 2013. godine isplaćeno je ukupno 7,48 milijuna eura odnosno 52,45% ugovorenog iznosa IPA sredstava. Ukoliko se promatra samo izvještajno razdoblje, isplaćeno je 3,41 milijuna eura ili 23,91% ukupno ugovorenog iznosa IPA sredstava.

Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2010. godinu iznose 5,95 milijuna eura, a ugovoreno je 1,31 milijun eura ili 22,02% od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja. Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2013. godine ukupno je isplaćeno 0,48 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja ili 36,64% od ukupno ugovorenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja.

U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 1,07 milijuna eura, odnosno 17,98% dodijeljenih nacionalnih sredstava, a isplaćeno je 0,38 milijuna eura odnosno 29,01% od ukupno ugovorenog iznosa nacionalnih sredstava.

**Tablica 14: Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA, po Projektnom sažetku (eng. Project Fiche – PF), iz godišnje alokacije za 2010. godinu u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

Nacionalni program komponente I IPA 2010									
	UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UGOVORENA SREDSTVA	UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO	PLAĆENO /UKUPNO DODIJELJENO	DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO
PF1	2,40	2,10	8,35	26,78%	0,00	1,06	40,84%	44,17%	0,00%
PF2	3,11	1,19				0,35		10,94%	
PF3	1,04	1,04				0,67		64,42%	
PF4	3,00	3,00				0,00		0,00%	
PF5	0,76	0,76				0,00		0,00%	
PF6	3,57	1,28				0,45		12,61%	
PF7	5,83	0,47				0,38		6,52%	
PF8	5,48	2,11				0,00		0,00%	
PF9	0,99	0,97				0,00		0,00%	
PF10	2,33	1,10				0,50		21,46%	
PF11	1,50	0,00				0,00		0,00%	
PF12	1,17	0,24				0,00		0,00%	
<b>UKUPNO</b>	<b>31,18</b>	<b>14,26</b>	<b>8,35</b>	<b>26,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>3,41</b>	<b>23,91%</b>	<b>10,94%</b>	<b>0,00%</b>

PF1 Pomoć organizacijama civilnog društva u razvoju, provedbi i nadzoru javnih politika i politika vezanih uz Acquis

PF2 Nastavak podrške kontroli/iskorjenjivanju bolesti životinja u Republici Hrvatskoj

PF3 Izrada karata opasnosti od poplava i rizika od poplava

PF4 Program razminiranja u ratom pogođenim područjima

PF5 Poboljšanje administrativnog i institucionalnog kapaciteta Porezne uprave RH u području primjene propisa o PDV-u vezanih uz zajedničko tržište EU

PF6 Fleksibilni instrument za jačanje administrativnog kapaciteta

PF7 Integrirano upravljanje granicom

PF8 Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije – ILAS implementacija

PF9 Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini

PF10 Jačanje učinkovitosti pravosuđa u Republici Hrvatskoj

PF11 Poboljšanje sustava ovrhe u Republici Hrvatskoj

PF12 Podrška nacionalnom viznom sustavu

**Tablica 15: Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2010. od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

Nacionalni program komponente I IPA 2010								
	UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	UKUPNO PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO
PF1	2,40	2,10	87,50%	9,35	1,06	50,48%	44,17%	29,99%
PF2	3,11	1,19	38,26%		0,35	29,41%	11,25%	
PF3	1,04	1,04	100,00%		0,67	64,42%	64,42%	
PF4	3,00	3,00	100,00%		2,98	99,33%	99,33%	
PF5	0,76	0,76	100,00%		0,19	25,00%	25,00%	
PF6	3,57	1,28	35,85%		0,86	67,19%	24,09%	
PF7	5,83	0,47	8,06%		0,38	80,85%	6,52%	
PF8	5,48	2,11	38,50%		0,00	0,00%	0,00%	
PF9	0,99	0,97	97,98%		0,29	29,90%	29,29%	
PF10	2,33	1,10	47,21%		0,50	45,45%	21,46%	
PF11	1,50	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF12	1,17	0,24	20,51%		0,19	79,17%	16,24%	
<b>UKUPNO</b>	<b>31,18</b>	<b>14,26</b>	<b>45,73%</b>	<b>9,35</b>	<b>7,48</b>	<b>52,45%</b>	<b>23,99%</b>	<b>29,99%</b>

PF1 Pomoć organizacijama civilnog društva u razvoju, provedbi i nadzoru javnih politika i politika vezanih uz Acquis

PF2 Nastavak podrške kontroli/iskorjenjivanju bolesti životinja u Republici Hrvatskoj

PF3 Izrada karata opasnosti od poplava i rizika od poplava

PF4 Program razminiranja u ratom pogođenim područjima

PF5 Poboljšanje administrativnog i institucionalnog kapaciteta Porezne uprave RH u području primjene propisa o PDV-u vezanih uz zajedničko tržište EU

PF6 Fleksibilni instrument za jačanje administrativnog kapaciteta

PF7 Integrirano upravljanje granicom

PF8 Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije – ILAS implementacija


PF9 Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini

PF10 Jačanje učinkovitosti pravosuđa u Republici Hrvatskoj

PF11 Poboljšanje sustava ovrhe u Republici Hrvatskoj

PF12 Podrška nacionalnom viznom sustavu

**Grafikon 6: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2010. godinu<sup>6</sup>**

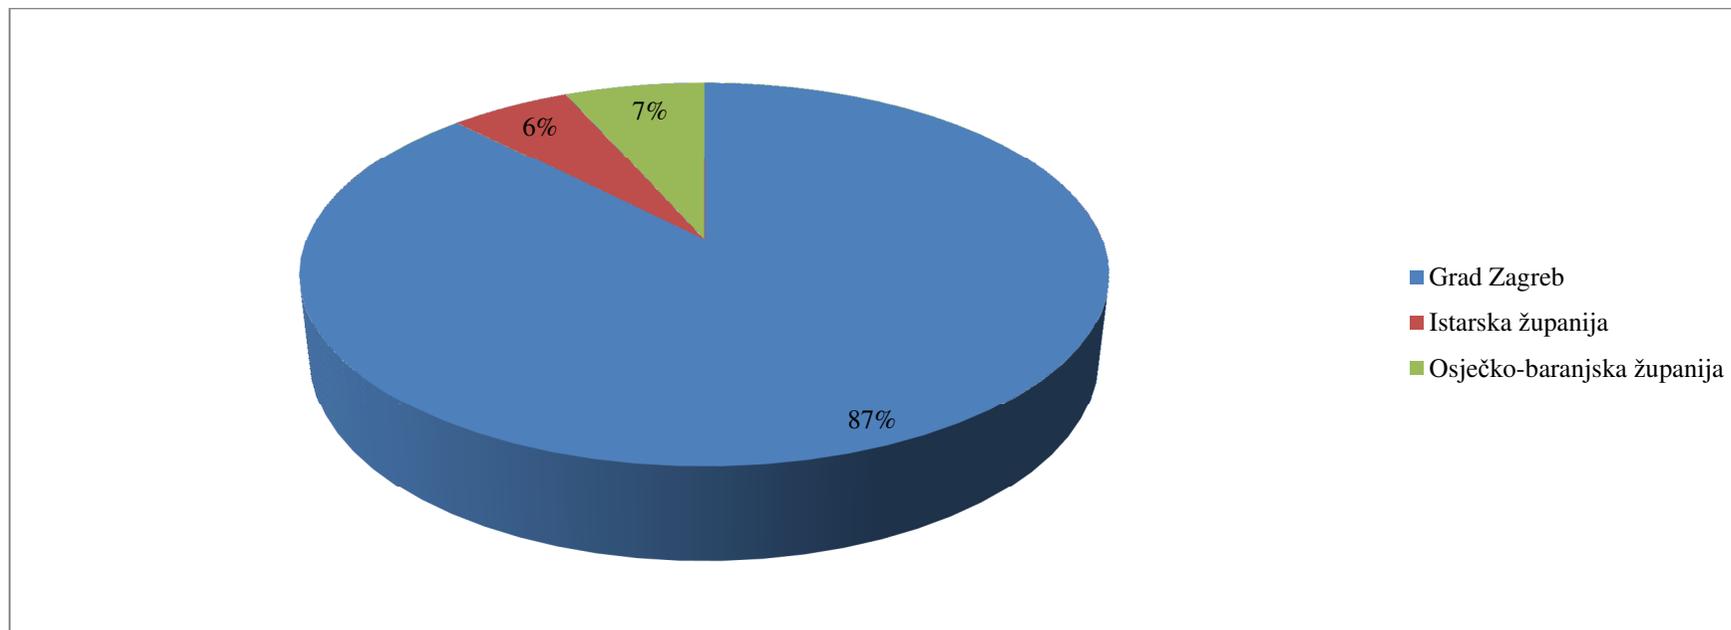

<sup>6</sup> Darovnica "Program razminiranja u ratom pogođenim područjima" (ukupne vrijednosti iznosa od 3,00 milijuna eura) nije obuhvaćena grafikonom 6, jer se odnosi na cijelu Republiku Hrvatsku

### **3.1.5. Komponenta I programa IPA 2011**

#### **3.1.5.1. Nacionalni program**

Dodijeljena sredstva za komponentu I programa IPA iz alokacije za 2011. godinu iznose 26,77 milijuna eura, a ugovaranje je započelo tijekom izvještajnog razdoblja. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je 21. svibnja 2015. godine, rok za završetak provedbe svih ugovora je 21. svibnja 2018. godine, dok je rok za izvršenje plaćanja 21. svibnja 2019. godine.

Programska godina obuhvaća 8 projekata koji se sastoje od 19 komponenti ukupne vrijednosti 24,03 milijuna eura (odnosno 89,76% dodijeljenih IPA sredstava) te 2,74 milijuna eura (odnosno 10,24% dodijeljenih IPA sredstava) u okviru Fleksibilnog instrumenta za jačanje administrativnih kapaciteta.

U razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine ugovoreno je 0,05 milijuna eura ili 0,19% dodijeljenih sredstava, što predstavlja ukupno ugovoreni iznos IPA sredstava na dan 30. lipnja 2013. godine. Do 30. lipnja 2013. godine je objavljeno je ili u postupku ugovaranja ukupno 12 natječajna vrijednih 11,54 milijuna eura, odnosno 43,11% dodijeljenih IPA sredstava, pri čemu natječajni objavljeni u izvještajnom razdoblju čine ukupno 8,87 milijuna eura ili 33,13% dodijeljenih IPA sredstava.

Ostalih 6 projektnih komponenti te 13 projektnih prijedloga u okviru Fleksibilnog instrumenta za jačanje administrativnih kapaciteta, u ukupnoj vrijednosti od 13,35 milijuna eura odnosno 49,87% dodijeljenih IPA sredstava, nalaze se u različitim stadijima pripreme i odobrenja natječajne dokumentacije.

Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2011. godinu iznose 4,30 milijuna eura, a ugovoreno je 0,01 milijuna eura ili 0,23% od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja. Do 30. lipnja 2013. godine nije bilo isplate sredstava po Nacionalnom programu komponente I programa IPA iz alokacije za 2011. godinu.

**Tablica 16: Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2011. godinu u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

Nacionalni program komponente I IPA 2011									
	UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UGOVORENA SREDSTVA	UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO	PLAĆENO /UKUPNO DODIJELJENO	DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO
PF1	2,86	0,05	0,05	1,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
PF2	2,31	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00%	
PF3	2,74	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00%	
PF4	1,79	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00%	
PF5	0,67	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00%	
PF6	4,18	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00%	
PF7	9,38	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00%	
PF8	0,69	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00%	
PF9	2,15	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00%	
<b>UKUPNO</b>	<b>26,77</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>

PF1 Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava radi osiguravanje trajnosti političkih reformi u postpristupnoj RH  
 PF2 Izgradnja i opremanje centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa  
 PF3 Fleksibilni instrument za jačanje administrativnog kapaciteta  
 PF4 Obnova i opremanje prostorija PN USKOK Osijek i Rijeka  
 PF5 Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova u borbi protiv kompjuterskog kriminala

PF6 Jačanje kapaciteta hrvatske Agencije za plaćanja u pripremi za nove ZPP i ZRP reforme za razdoblje nakon 2013. godine  
 PF7 Potpora racionalizaciji mreže sudova  
 PF8 Tehnička pomoć u razvoju poslovnih statistika i unapređivanju sustava prikupljanja podataka  
 PF9 Unapređenje kapaciteta Prihvatnog centra za strance

**Tablica 17: Financijski pokazatelji statusa provedbe Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2011. godinu od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

Nacionalni program komponente I IPA 2011								
	UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	UKUPNO PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO
PF1	2,86	0,05	1,80%	2,68	0,00	0,00%	0,00%	10,01%
PF2	2,31	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF3	2,74	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF4	1,79	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF5	0,67	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF6	4,18	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF7	9,38	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF8	0,69	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
PF9	2,15	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
<b>UKUPNO</b>	<b>26,77</b>	<b>0,05</b>	<b>0,19%</b>	<b>2,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,01%</b>

PF1 Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava radi osiguravanje trajnosti političkih reformi u postpristupnoj RH

PF2 Izgradnja i opremanje centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa

PF3 Fleksibilni instrument za jačanje administrativnog kapaciteta

PF4 Obnova i opremanje prostorija PN USKOK Osijek i Rijeka

PF5 Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova u borbi protiv kompjuterskog kriminala

PF6 Jačanje kapaciteta hrvatske Agencije za plaćanja u pripremi za nove ZPP i ZRP reforme za razdoblje nakon 2013. godine

PF7 Potpora racionalizaciji mreže sudova

PF8 Tehnička pomoć u razvoju poslovnih statistika i unapređivanju sustava prikupljanja podataka

PF9 Unapređenje kapaciteta Prihvatnog centra za strance

### 3.1.5.2. Nuklearna sigurnost

Dodijeljena sredstva za komponentu I programa IPA Nuklearna sigurnost iz alokacije za 2011. godinu iznose 0,81 milijuna eura.

U izvještajnom razdoblju ugovoren je zasebni okvirni ugovor u iznosu od 0,16 milijuna eura (0,14 milijuna eura IPA sredstava i 0,02 milijuna nacionalnih sredstava) te je isti u fazi provedbe. Ostale tri komponente su u pripremi, a ugovaranje je planirano kroz 2014. godinu. U izvještajnom razdoblju izvršeno je plaćanje u iznosu 0,08 milijuna eura IPA sredstava i 0,01 milijun eura nacionalnih sredstava.

**Tablica 18: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA Nuklearna sigurnost iz godišnje alokacije za 2011. godinu u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eurima)**

	IPA 2011 Nuklearna sigurnost		
	Poboljšanje spremnosti sustava za izvanredne situacije u Republici Hrvatskoj	Unaprjeđenje sustava za (van)mrežno nadziranje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u uobičajenim i izvanrednim situacijama	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,43	0,37	0,81
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,14	0,00	0,14
UGOVORENA SREDSTVA	0,14	0,00	0,14
UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	31,33%	0,00%	17,28%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,00		
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,08	0,00	0,08
PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO	60,00%	0%	57,14%
PLAĆENO /UKUPNO DODIJELJENO	18,80%	0,00%	9,88%
DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	0,00%		0,00%

**Tablica 19: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA Nuklearna sigurnost iz godišnje alokacije za 2011. od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	IPA 2011 Nuklearna sigurnost		
	Poboljšanje spremnosti sustava za izvanredne situacije u Republici Hrvatskoj	Unaprjeđenje sustava za (van)mrežno nadziranje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u uobičajenim i izvanrednim situacijama	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,43	0,37	0,81
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,14	0,00	0,14
UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	31,33%	0,00%	17,28%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,00		0,00
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJI KORISNICIMA	0,08	0,00	0,08
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	60,00%	0,00%	57,14%
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	18,80%	0,00%	9,88%
UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	0,00%		0,00%

### 3.1.6. Komponenta I programa IPA 2012

#### 3.1.6.1. Nacionalni program

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru komponente I programa IPA za 2012. godinu je potpisan 9. svibnja 2013. godine. Dodijeljena IPA sredstva za komponentu I programa IPA iz alokacije za 2012. godinu iznose 30,13 milijuna eura. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je 9. svibnja 2016. godine, rok za završetak provedbe svih ugovora je 9. svibnja 2018. godine, a za izvršenje plaćanja jest 9. svibnja 2019. godine.

Programska godina obuhvaća 9 projekata koji se sastoje od 28 komponenti ukupne vrijednosti 26,45 milijuna eura (odnosno 87,79% dodijeljenih IPA sredstava) te 3,68 milijuna eura (odnosno 12,21% dodijeljenih IPA sredstava) u okviru Fleksibilnog instrumenta za jačanje administrativnih kapaciteta. Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2012. godinu iznose 3,99 milijuna eura. Radnje vezane uz pripremu natječaja su u tijeku.

### 3.1.6.2. Članarina za Programe i agencije Europske unije

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama Europske unije.

Plaćanja članarina iz godišnjih alokacija za 2007., 2008., 2009., 2010. i 2011. godinu komponente I programa IPA završena su i obuhvaćena prijašnjim Izvješćima. U IPA I 2012 za plaćanje članarina osigurano je prema projektnom sažetku ukupno 5,09 milijuna eura. Do 30. lipnja 2013. isplaćeno je ukupno 4,43 milijuna eura (navedeni iznos isplaćen je u predmetnom izvještajnom razdoblju).

**Tablica 20: Programi i agencije EU za koje je plaćena članarina iz komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2011. godinu (u eurima)**

PROGRAM UNIJE IPA I 2012	PLANIRANO (prema projektnom sažetku)			PLAĆENO		
	IPA sredstva	Državni proračun	Ukupno	IPA sredstva	Državni proračun	Ukupno
<b>Fiscalis 2013.</b>	24.750,00	20.250,00	<b>45.000,00</b>	12.375,00	10.125,00	<b>22.500,00</b>
<b>Customs 2013.</b>	22.000,00	18.000,00	<b>40.000,00</b>	11.000,00	9.000,00	<b>20.000,00</b>
<b>Kultura 2007.-2013.</b>	46.750,00	38.250,00	<b>85.000,00</b>	46.750,00	38.250,00	<b>85.000,00</b>
<b>Media 2007.</b>	38.375,00	31.398,00	<b>69.773,00</b>	38.375,00	31.398,00	<b>69.773,00</b>
<b>Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7)</b>	2.500.000,00	4.004.000,00	<b>6.504.000,00</b>	2.402.160,12	3.919.313,90	<b>6.321.474,02</b>
<b>Europa za građane</b>	23.375,00	19.125,00	<b>42.500,00</b>	23.375,00	19.125,00	<b>42.500,00</b>
<b>PROGRESS</b>	82.500,00	67.500,00	<b>150.000,00</b>			
<b>Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), potprogrami:</b>						
- Program za poduzetništvo i inovacije (EIP)	330.000,00	270.000,00	<b>600.000,00</b>	379.757,95	310.711,05	<b>690.469,00</b>
- Inteligentna energija (IEE)	242.000,00	198.000,00	<b>440.000,00</b>			
- Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)	132.000,00	108.000,00	<b>240.000,00</b>			
<b>Financijski instrument civilne zaštite</b>	55.000,00	45.000,00	<b>100.000,00</b>	34.423,88	28.165,00	<b>62.588,88</b>
<b>Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravlja 2008.-2013.</b>	38.128,00	31.195,00	<b>69.323,00</b>			
<b>Marco Polo II</b>	59.125,00	48.375,00	<b>107.500,00</b>			
<b>ISA Program</b>	19.611,00	16.045,00	<b>35.656,00</b>			
<b>Program za cjeloživotno učenje</b>	1.052.500,00	3.947.500,00	<b>5.000.000,00</b>	1.052.500	3.947.500	<b>5.000.000,00</b>
<b>Program Mladi na djelu</b>	370.000,00	730.000,00	<b>1.100.000,00</b>	370.000,00	730.000,00	<b>1.100.000,00</b>
<b>Agencija za temeljna ljudska prava</b>	56.380,00	46.130,00	<b>102.510,00</b>	56.380,00	46.130,00	<b>102.510,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>5.092.494,00</b>	<b>9.638.768,00</b>	<b>14.731.262,00</b>	<b>4.427.096,95</b>	<b>9.089.717,95</b>	<b>13.516.814,90</b>

### **3.2. KOMPONENTA II PROGRAMA IPA – PREKOGRANIČNA SURADNJA**

Operativnu strukturu za provedbu ovog Operativnog programa čine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koje je zaduženo za upravljanje programom te Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske u svojstvu provedbenog tijela.

Komponenta II programa IPA predstavlja važan doprinos aktivnostima regionalnoga razvoja, čiji je cilj potaknuti stvaranje prekograničnih mreža, partnerstava i razvoj zajedničkog prekograničnog djelovanja, te izgradnja kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za upravljanje programima Europske unije, kao i priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar strukturnih fondova Europske unije.

Korištenje sredstava odvija se u proširenom decentraliziranom sustavu provedbu (eng. *Ex-post decentralized implementation system - EDIS*). Naime, 13. veljače 2013. godine, Europska komisija ukinula je prethodnu (*ex-ante*) kontrolu nad provođenjem procesa javne nabave i ugovaranja projekata sufinanciranih iz IPA komponente II - Prekogranična suradnja. Dozvola za rad bez prethodnih kontrola znači da nadležne hrvatske institucije potpuno samostalno nastavljaju proces ugovaranja IPA sredstava.


**Tablica 21: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje, u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

RAZDOBLJE	HR-BIH 2007-2011	HR-CG 2007-2011	HR-Srb 2007-2011	JIE 2007- 2009	MED 2007-2009	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	5,00	2,00	4,00	1,16	0,30	12,46
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	4,99	1,84	3,55	1,01	0,29	11,68
UGOVORENA SREDSTVA	1,90	1,00	0,76	0,00	0,00	3,66
UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	38,00%	50,00%	19,00%	0,00%	0,00%	29,37%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,10	0,04	0,76	0,00	0,00	0,9
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,942	0,59	0,80	-0,02	0,002	2,314
PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO	18,88%	32,07%	22,25%	n/a	0,69%	19,81%
PLAĆENO /UKUPNO DODIJELJENO	18,84%	29,50%	20%	n/a	0,67%	18,57%
DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	2,00%	2,00%	19,00%	0,00%	0,00	7,22%

**Tablica 22: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

KUMULATIVNO	HR-BIH 2007-2011	HR-CG 2007-2011	HR-Srb 2007-2011	JIE 2007- 2009	MED 2007-2009	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	5,00	2,00	4,00	1,16	0,30	12,46
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	4,99	1,84	3,55	1,01	0,29	11,68
UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	99,80%	92,00%	88,75%	87,07%	96,67%	93,74%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	2,60	0,96	2,88	1,21		7,65
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	3,20	1,18	2,66	0,80	0,24	8,08
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	64,13%	64,13%	74,93%	79,21%	82,76%	69,18%
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	64,00%	59,00%	66,50%	68,97%	80,00%	64,85%
UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	52,00%	48,00%	72,00%	n/a		61,40%

Grafikon 7: Grafički prikaz statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)

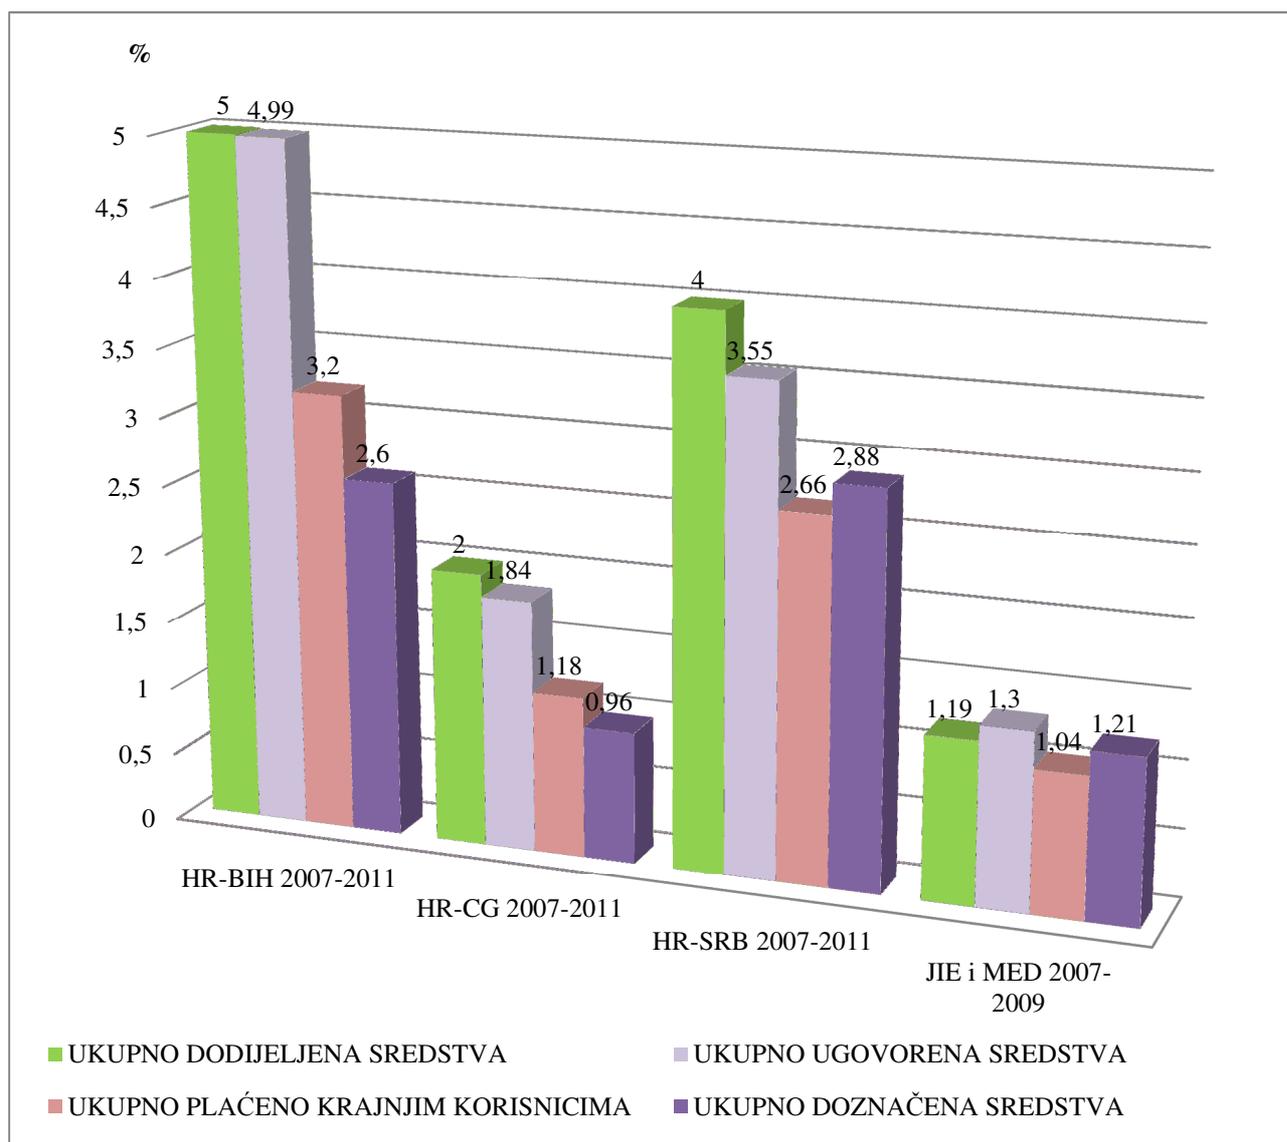

### **3.2.1. Prekogranični programi s državama nečlanicama Europske unije**

Republika Hrvatska sudjeluje u sljedećim Programima prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije:

- Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina;
- Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija;
- Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora.

Za sva tri Prekogranična programa IPA s državama nečlanicama Europske unije do sada je na snagu stupilo 5 Financijskih sporazuma koji se odnose na alokacije za 2007.–2011. godinu.

Sva tri Programa namijenjena su neprofitnim organizacijama i institucijama koje u okviru prekograničnog projekta žele ostvariti suradnju s najmanje jednim prekograničnim partnerom. Projektne aktivnosti moraju doprinositi ciljevima programa i njihovim prioritetima te se moraju odvijati u prihvatljivom području.

Projekti se financiraju do 85% bespovratnim sredstvima EU, dok sufinanciranje od strane korisnika iznosi najmanje 15%. Hrvatski partneri sufinanciraju projekte vlastitim sredstvima, sredstvima partnera na projektu te sredstvima iz drugih izvora (drugi donatori, banke itd.).

U navedenim se Programima koristi i metoda predfinanciranja od strane EU, prema kojoj korisnik bespovratnih sredstava dio sredstava (ovisno o njihovom iznosu i trajanju projekta) dobiva unaprijed.

#### **3.2.1.1. Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina**

Opći cilj Programa jest potaknuti stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava te razvoj zajedničkih prekograničnih djelovanja radi revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša te jačanja socijalne kohezije. Dodatni je cilj Programa izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje EU programima te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar 3. cilja strukturnih fondova Europske unije.

Navedeno se pokušava postići kroz sljedeće prioritete i pripadajuće mjere:

Prioritet 1. Stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora

Mjera 1.1. Zajednički razvoj turističke ponude

Mjera 1.2. Promicanje poduzetništva

Prioritet 2. Poboljšana kvaliteta života i društvena povezanost

Mjera 2.1. Zaštita prirode i okoliša

Mjera 2.2. Poboljšanje dostupnosti usluga iz Zajednice u pograničnom području

Prioritet 3. Tehnička pomoć

Mjera 3.1. Podrška upravljanju i provedbi Programa

Mjera 3.2. Podrška informiranju, promidžbi i evaluaciji Programa.

Republici Hrvatskoj je u okviru ovog Programa za svaku programsku godinu dodijeljen 1,0 milijun eura, od čega 10% odnosno 0,10 milijuna eura otpada na tehničku pomoć, a 90%, odnosno 0,9 milijuna eura namijenjeno je za projekte ugovorene putem poziva na dostavu projektnih prijedloga. Do sada je na snagu stupilo pet Financijskih sporazuma, koji se odnose na alokacije za godine 2007. – 2011.

U izvještajnom razdoblju ugovoren je jedan projekt tehničke pomoći iz alokacije za 2011. godinu, ukupne vrijednosti 0,12 milijuna eura, od čega EU dio iznosi 0,1 milijun eura, a nacionalno sufinanciranje (sufinanciranje korisnika) 0,02 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%. Pored spomenutog projekta, u izvještajnom je razdoblju ugovoreno i 13 projekata iz alokacije za 2010. i 2011. godinu odabranih putem poziva na dostavu projektnih prijedloga, i to 7 projekata u sklopu alokacije za 2010. godinu te 6 projekata u sklopu alokacije za 2011. godinu.

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u sklopu alokacije za 2010. godinu iznosi 1,09 milijuna eura, od čega na EU dio otpada 0,90 milijuna eura, a na sufinanciranje korisnika 0,19 milijuna eura. Stopa ugovaranja ugovoreno/dodijeljeno iznosi 90%. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u sklopu alokacije za 2011. godinu iznosi 1,08 milijuna eura, od čega na EU dio otpada 0,9 milijuna eura, a na sufinanciranje korisnika 0,18 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

Pored ugovaranja, u izvještajnom su razdoblju izvršena dva završna plaćanja (završno plaćanje u sklopu projekta iz alokacije za 2007. godinu u iznosu 2.220,84 eura te završno plaćanje za ugovor tehničke pomoći iz alokacije za 2009. godinu u iznosu 16.386,35 eura) te 13 avansnih plaćanja (1 u sklopu alokacije za 2009. godinu u iznosu 0,10 milijuna eura, 7 u sklopu alokacije za 2010. godinu u ukupnom iznosu 0,48 milijuna eura EU sredstava te 5 u sklopu alokacije za 2011. godinu u ukupnom iznosu 0,34 milijuna eura IPA sredstava). Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na ukupno dodijeljeno u sklopu 1. i 2. prioriteta alokacije za 2007. godinu iznosi 0,22%. U sklopu alokacije za 2008. godinu u izvještajnom razdoblju nije bilo plaćanja.

Plaćeno u odnosu na ugovoreno u izvještajnom razdoblju u sklopu 1. i 2. prioriteta alokacije za 2009. godinu iznosi 11,24%, a plaćeno u odnosu na dodijeljeno 11,11%. Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno u sklopu 3. prioriteta alokacije za 2009. godinu iznosi 20,00%. Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno u sklopu 1. i 2. prioriteta alokacije za 2010. godinu za cijeli period provedbe iznosi 53,33%, dok za 3. prioritet iste alokacije nije bilo izvršenih plaćanja. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno u sklopu 1. i 2. prioriteta alokacije za 2011. godinu iznosi 37,78%. U sklopu 3. prioriteta alokacije za 2011. godinu također nije bilo izvršenih plaćanja.

Od početka provedbe Programa u sklopu alokacije za 2007. godinu ugovoreno je 9 projekata, 8 putem poziva na dostavu projektnih prijedloga i 1 projekt tehničke pomoći. Ukupna vrijednost projekata ugovorenih u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1,08 milijuna eura, od čega je EU dio 0,9 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,18 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%. Ukupna vrijednost ugovora tehničke pomoći iznosi 0,12 milijuna eura, od čega je EU dio 0,10 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,02 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2008. godinu ugovoreno je 7 projekata, 6 putem poziva na dostavu projektnih prijedloga i 1 projekt tehničke pomoći. Ukupna vrijednost projekata ugovorenih u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1,13 milijuna eura, od čega je EU dio 0,90 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,23 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%. Ukupna vrijednost ugovora tehničke pomoći iznosi 0,12 milijuna eura, od čega je EU dio 0,10 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,02 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2009. godinu ugovoreno je 8 projekata, 7 putem poziva na dostavu projektnih prijedloga i 1 projekt tehničke pomoći. Ukupna vrijednost projekata ugovorenih u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1,06 milijuna eura, od čega je EU dio 0,89 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,17 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 98,89%. Ukupna vrijednost ugovora tehničke pomoći iznosi 0,12 milijuna eura, od čega je EU dio 0,10 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,02 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2010. godinu ugovoreno je 8 projekata, 7 putem poziva na dostavu projektnih prijedloga i 1 projekt tehničke pomoći. Ukupna vrijednost projekata ugovorenih u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1,09 milijuna eura, od čega je EU dio 0,9 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,19 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%. Ukupna vrijednost ugovora tehničke pomoći iznosi 0,12 milijuna eura, od čega je EU dio 0,10 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,02 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2011. godinu ugovoreno je 7 projekata, 6 putem poziva na dostavu projektnih prijedloga i 1 projekt tehničke pomoći. Ukupna vrijednost projekata ugovorenih u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1,08 milijuna eura, od čega je EU dio 0,90 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,18 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%. Ukupna vrijednost ugovora tehničke pomoći iznosi 0,12 milijuna eura, od čega je EU dio 0,10 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,02 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu prva dva prioriteta alokacije za 2007. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,74 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi 82,22%, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno. U sklopu 3. prioriteta alokacije za 2007. godinu (tehničke pomoći) izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,09 milijuna eura pri čemu plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 90,00%.

U sklopu prva dva prioriteta alokacije za 2008. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,73 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 81,11%. U sklopu 3. prioriteta alokacije za 2008. godinu (tehničke pomoći) izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,10 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 100%.

U sklopu prva dva prioriteta alokacije za 2009. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,54 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi 60,67%, a plaćeno u odnosu na dodijeljeno 60,00%. U sklopu 3. prioriteta alokacije za 2009. godinu (tehničke pomoći) izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,10 milijuna eura. Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 100%.

U sklopu prva dva prioriteta alokacije za 2010. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,48 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 53,33%. U sklopu 3. prioriteta alokacije za 2010. godinu (tehničke pomoći) izvršeno je plaćanje u iznosu 0,08 milijuna eura. Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 80,00%.

U sklopu prva dva prioriteta alokacije za 2011. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,34 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi 37,78%, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno. U sklopu 3. prioriteta alokacije za 2011. godinu (tehničke pomoći) nije bilo plaćanja.

**Tablica 23: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2011., u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	IPA komponenta IIB - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina															2007.- 2011.
	Godina alokacije 2007.			Godina alokacije 2008.			Godina alokacije 2009.			Godina alokacije 2010.			Godina alokacije 2011.			
	PO1	PO2	PO3	PO1	PO2	PO3	PO1	PO2	PO3	PO1	PO2	PO3	PO1	PO2	PO3	
	M1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,90		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	<b>5,00</b>
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,90		0,10	0,90		0,10	0,89		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	<b>4,99</b>
UGOVORENA SREDSTVA	0,00			0,00			0,00			0,90			1,00			<b>1,90</b>
UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	0,00%			0,00%			0,00%			90,00%			100,00%			<b>38,00%</b>
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,00			0,00			0,00			0,00			0,10			<b>0,10</b>
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,002		0,00	0,00		0,00	0,10		0,02	0,48		0,00	0,34		0,00	<b>0,942</b>
PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO	0,22%		0,00%	0,00%		0,00%	11,24%		20,00%	53,33%		0,00%	37,78%		0,00%	<b>18,88%</b>
PLAĆENO /UKUPNO DODIJELJENO	0,2%		0,00%	0,00%		0,00%	11,11%		20,00%	53,33%		0,00%	37,78%		0,00%	<b>18,84%</b>
DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			10,00%			<b>2,00%</b>

Prioritet 1 Stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora  
Mjera 1.1. Zajednički razvoj turističke ponude  
Mjera 1.2. Promicanje poduzetništva  
Prioritet 2 Poboljšana kvaliteta života i društvena povezanost  
Mjera 2.1. Zaštita prirode i okoliša

Mjera 2.2. Poboljšanje dostupnosti usluga iz Zajednice u pograničnom području  
Prioritet 3 Tehnička pomoć  
Mjera 3.1. Podrška upravljanju i provedbi programa  
Mjera 3.2. Podrška informiranju, promidžbi i evaluaciji Programa

**Tablica 24: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2011., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	IPA Komponenta IIB - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina															2007.- 2011.
	Godina alokacije 2007.			Godina alokacije 2008.			Godina alokacije 2009.			Godina alokacije 2010.			Godina alokacije 2011.			
	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	
	M1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M1.1 i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M1.1 i 1.2.	M 2.1i 2	M 3.1. i 3.2.	M1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,90		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	<b>5,00</b>
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,90		0,10	0,90		0,10	0,89		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	<b>4,99</b>
UKUPNO UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	98,89%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	<b>99,80%</b>
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,95			0,95			0,30			0,30			0,10			<b>2,60</b>
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,74		0,09	0,73		0,10	0,54		0,10	0,48		0,08	0,34		0,00	<b>3,20</b>
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	82,22%		90,00%	81,11%		100,00%	60,67%		100,00%	53,33%		80,00%	37,78%		0,00%	<b>64,13%</b>
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	82,22%		90,00%	81,11%		100,00%	60,00%		100,00%	53,33%		80,00%	37,78%		0,00%	<b>64,00%</b>
UKUPNO DOZNAČENO/UKUPNO DODIJELJENO	95,00%			95,00%			30,00%			30,00%			10,00%			<b>52,00%</b>

Prioritet 1 Stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora  
Mjera 1.1. Zajednički razvoj turističke ponude  
Mjera 1.2. Promicanje poduzetništva  
Prioritet 2 Poboljšana kvaliteta života i društvena povezanost  
Mjera 2.1. Zaštita prirode i okoliša

Mjera 2.2. Poboljšanje dostupnosti usluga iz Zajednice u pograničnom području  
Prioritet 3 Tehnička pomoć  
Mjera 3.1. Podrška upravljanju i provedbi programa  
Mjera 3.2. Podrška informiranju, promidžbi i evaluaciji Programa

Iako u sklopu ovog Programa u izvještajnom razdoblju nije objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga, isti se nalazi u fazi pripreme.

U ovom je razdoblju ugovoreno 14 projekata, i to 7 projekata u sklopu alokacije za 2010. godinu te 7 projekata u sklopu alokacije za 2011. godinu. Svi ugovoreni projekti nalaze se u fazi provedbe. Od preostalih 25 projekata, ugovorenih u prethodnim izvještajnim razdobljima, njih 20 se nalazi u fazi provedbe, dok je za 5 projekata provedba završila.

Projekti ugovoreni u izvještajnom razdoblju provode se u 9 županija, uz iznimku ugovora tehničke pomoći koji se odvija na području cijele Republike Hrvatske. Za njih 10, provedba se odvija na području jedne županije, dok se za 3 projekta provedba odvija na području više županija. Najviše projekata, njih 5, provodi se na području Splitsko – dalmatinske županije. Slijedi ju Zadarska županija sa 4 projekta te Sisačko – moslavačka županija s 3 projekta. Na području Karlovačke i Ličko – senjske županije provode se 2 projekta, dok se na području Brodsko – posavske, Vukovarsko – srijemske, Dubrovačko – neretvanske i Šibensko – kninske županije provodi po 1 projekt. Ukupna vrijednost projekata koji se provode na području Splitsko – dalmatinske županije iznosi 0,80 milijuna eura, na području Zadarske županije 0,51 milijuna eura, na području Sisačko – moslavačke županije 0,39 milijuna eura, na području Karlovačke županije 0,35 milijuna eura, na području Ličko – senjske županije 0,21 milijuna eura, na području Brodsko – posavske županije 0,30 milijuna eura, na području Vukovarsko – srijemske županije 0,20 milijuna eura te na području Dubrovačko – neretvanske i Šibensko – kninske županije 0,61 milijuna eura. Vrijednost 2 ugovora tehničke pomoći iznosi 0,20 milijuna eura.

Od početka provedbe do zadnjeg dana izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013., 3,6 milijuna eura (1,8 milijuna eura za prijavitelje iz Hrvatske, 1,8 milijuna eura za prijavitelje iz Bosne i Hercegovine) bilo je na raspolaganju za provedbu projekata u obje države. Ukupno je bilo zaprimljeno 110 projektnih prijedloga.


Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga bio je otvoren od 5. rujna do 5. prosinca 2011. godine (financijske alokacije za 2009., 2010. i 2011. godinu). U sklopu tog poziva, indikativni iznos od 5,4 milijuna eura (2,7 milijuna eura za prijavitelje iz Hrvatske, 2,7 milijuna eura za prijavitelje iz Bosne i Hercegovine) bio je na raspolaganju za provedbu projekata u obje države. Ukupno su zaprimljena 153 projektna prijedloga.

U pripremi je i treći poziv koji će obuhvaćati alokacije za 2012. i 2013. godinu. U sklopu tog poziva na dostavu projektnih prijedloga, indikativni iznos koji će biti na raspolaganju iznosi 3,82 milijuna eura (1,8 milijuna eura za prijavitelje iz Hrvatske, 2,02 milijuna eura za prijavitelje iz Bosne i Hercegovine).

Do 30. lipnja 2013. ukupno je ugovoreno 39 projekata, i to 9 projekata u sklopu alokacije za 2007. godinu, 7 projekata u sklopu alokacije za 2008. godinu, 8 projekata u sklopu alokacije za 2009. godinu, 8 projekata u sklopu alokacije za 2010. godinu te 7 projekata u sklopu alokacije za 2011. godinu. Od ukupnog broja ugovorenih projekata, 34 ih se nalazi u fazi provedbe, dok je za 5 projekata provedba završila. Ugovoreni se projekti provode na području 9 županija, uz iznimku projekata tehničke pomoći, koji obuhvaćaju teritorij cijele Republike Hrvatske. Po broju projekata prednjači Sisačko – moslavačka županija, u kojoj se provodi 11 projekata. Slijede ju Splitsko – dalmatinska i Vukovarsko – srijemska županija s 8 projekata, Brodsko – posavska i Zadarska županija sa 6 projekata, Karlovačka županija s 5 projekata te Dubrovačko – neretvanska, Šibensko – kninska i Ličko – senjska županija s 2 projekta. Ukupna vrijednost

projekata koji se provode u Sisačko – moslavačkoj županiji iznosi 1,36 milijuna eura, u Splitsko – dalmatinskoj županiji 1,48 milijuna eura, u Vukovarsko – srijemskoj županiji 1,06 milijuna eura, u Brodsko – posavskoj županiji 0,94 milijuna eura, u Zadarskoj županiji 0,87 milijuna eura, u Karlovačkoj županiji 0,53 milijuna eura, u Dubrovačko – neretvanskoj i Šibensko – kninskoj županiji 0,38 milijuna eura te u Ličko – senjskoj županiji 0,21 milijuna eura.

**Grafikon 8: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013.**

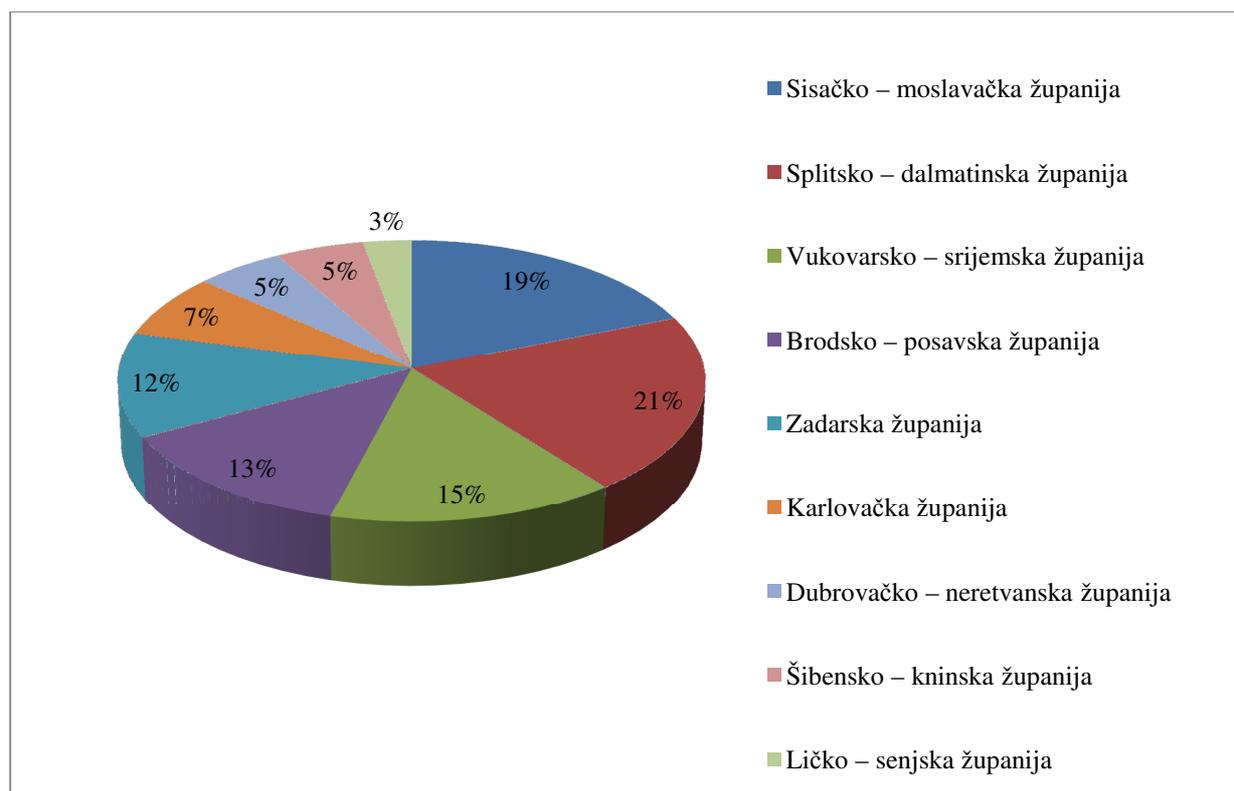

### 3.2.1.2. Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora

Opći je cilj Programa poboljšati kvalitetu života u prekograničnom području između Hrvatske i Crne Gore.

U sklopu Programa identificirani su sljedeći prioriteti i mjere:

Prioritet 1. Stvaranje povoljnih okolišnih i socioekonomskih uvjeta u programskom području kroz unapređenje suradnje u zajednički odabranim sektorima i dobrosusjedskih odnosa u prihvatljivim područjima

Mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine

Mjera 1.2. Zajedničke mjere u području turizma i kulturnog prostora

Mjera 1.3. Mali projekti razvoja prekograničnih zajednica

Prioritet 2. Tehnička pomoć (TP) za povećanje administrativnog kapaciteta u upravljanju i provedbi programa prekogranične suradnje

Mjera 2.1. Podrška upravljanju i provedbi Programa

Mjera 2.2. Podrška informiranju, promidžbi i evaluaciji Programa.

Republici Hrvatskoj je u okviru ovog programa za svaku programsku godinu dodijeljeno 0,40 milijuna eura, od čega 10% odnosno 0,04 milijuna eura otpada na tehničku pomoć, a 90%, odnosno 0,36 milijuna eura je namijenjeno za projekte ugovorene putem poziva na dostavu projektnih prijedloga. Do sada je na snagu stupilo 5 Financijskih sporazuma, koji se odnose na alokacije za 2007. – 2011. godinu.

U izvještajnom razdoblju ugovoren je 1 projekt tehničke pomoći iz alokacije za 2010. godinu ukupne vrijednosti 0,06 milijuna eura, od čega EU dio iznosi 0,04 milijuna eura, a nacionalno sufinanciranje (sufinanciranje korisnika) 0,02 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

Pored spomenutog projekta, u izvještajnom je razdoblju, ugovoreno i 8 projekata iz alokacije za 2009., 2010. i 2011. godinu odabranih putem poziva na dostavu projektnih prijedloga, i to 3 projekta u sklopu alokacije za 2009. godinu, 4 projekta u sklopu alokacije za 2010. godinu te 1 projekt u sklopu alokacije za 2011. godinu.

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata odabranih putem poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu alokacije za 2009. godinu iznosi 0,43 milijuna eura, od čega na EU dio otpada 0,36 milijuna eura, a na sufinanciranje korisnika 0,07 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata odabranih putem poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu alokacije za 2010. godinu iznosi 0,43 milijuna eura, od čega na EU dio otpada 0,36 milijuna eura, a na sufinanciranje korisnika 0,07 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

Ukupna vrijednost ugovorenog projekta odabranog putem poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu alokacije za 2011. godinu iznosi 0,29 milijuna eura, od čega na EU dio otpada 0,24 milijuna eura, a na sufinanciranje korisnika 0,05 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 66,67%.

Pored ugovaranja, u izvještajnom je razdoblju izvršeno 1 završno plaćanje u sklopu projekta iz alokacije za 2007. godinu u iznosu 0,01 milijuna eura IPA sredstava te 9 avansnih plaćanja (3 u sklopu alokacije za 2009. godinu u iznosu 0,26 milijuna eura IPA sredstava, 5 u sklopu alokacije za 2010. godinu u ukupnom iznosu 0,17 milijuna eura IPA sredstava te 1 u sklopu alokacije za 2011. godinu u ukupnom iznosu 0,15 milijuna eura IPA sredstava).

Plaćeno u odnosu na ugovoreno kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno u sklopu 1. prioriteta alokacije za 2007. godinu iznosi 2,78%. U sklopu alokacije za 2008. godinu u izvještajnom razdoblju nije bilo plaćanja. Plaćeno u odnosu na ugovoreno, te plaćeno u odnosu na dodijeljeno u sklopu 1. prioriteta alokacije za 2009. godinu iznosi 72,22%. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno u sklopu 1. prioriteta alokacije za 2010. godinu iznosi 38,89%, dok za 2. prioritet iste alokacije plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 75%. Plaćeno u odnosu na ugovoreno u sklopu 1. prioriteta alokacije za 2011. godinu iznosi 62,50%, a plaćeno u odnosu na dodijeljeno 41,67%.

Od početka provedbe programa u sklopu alokacije za 2007. godinu ugovorena su 4 projekata, 3 putem poziva na dostavu projektnih prijedloga i 1 projekt tehničke pomoći. Ukupna vrijednost projekata ugovorenih u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 0,46 milijuna eura, od čega je EU dio 0,36 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,10 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%. Ukupna vrijednost ugovora tehničke pomoći iznosi 0,07

milijuna eura, od čega je EU dio 0,04 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,03 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2008. godinu ugovorena su 3 projekta, 2 putem poziva na dostavu projektnih prijedloga i 1 projekt tehničke pomoći. Ukupna vrijednost projekata ugovorenih u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 0,47 milijuna eura, od čega je EU dio 0,36 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,11 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%. Ukupna vrijednost ugovora tehničke pomoći iznosi 0,06 milijuna eura, od čega je EU dio 0,04 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,02 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2009. godinu ugovorena su 4 projekata, 3 putem poziva na dostavu projektnih prijedloga i 1 projekt tehničke pomoći. Ukupna vrijednost projekata ugovorenih u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 0,43 milijuna eura, od čega je EU dio 0,36 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,07 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%. Ukupna vrijednost ugovora tehničke pomoći iznosi 0,06 milijuna eura, od čega je EU dio 0,04 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,02 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2010. godinu ugovoreno je 5 projekata, 4 putem poziva na dostavu projektnih prijedloga i 1 projekt tehničke pomoći. Ukupna vrijednost projekata ugovorenih u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 0,43 milijuna eura, od čega je EU dio 0,36 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,07 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%. Ukupna vrijednost ugovora tehničke pomoći iznosi 0,06 milijuna eura, od čega je EU dio 0,04 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,02 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2011. godinu ugovoren je 1 projekt putem poziva na dostavu projektnih prijedloga. Ukupna vrijednost ugovorenog projekta iznosi 0,29 milijuna eura, od čega je EU dio 0,24 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,05 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 66,67%.

U sklopu 1. prioriteta alokacije za 2007. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,27 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 75%. U sklopu 2. prioriteta alokacije za 2007. godinu (tehničke pomoći) izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,02 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 50,00%.

U sklopu 1. prioriteta alokacije za 2008. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,25 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 69,44%. U sklopu 2. prioriteta alokacije za 2008. godinu (tehničke pomoći) izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,03 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 75,00%.

U sklopu 1. prioriteta alokacije za 2009. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,26 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 72,22%. U sklopu 2. prioriteta alokacije za 2009. godinu (tehničke pomoći) izvršeno je plaćanje u iznosu 0,03 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 75,00%.

U sklopu 1. prioriteta alokacije za 2010. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,14 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 39,89%. U sklopu 2. prioriteta alokacije za 2010. godinu (tehničke pomoći) izvršeno je plaćanje u iznosu 0,03 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi 75,00% kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno.

U sklopu 1. prioriteta alokacije za 2011. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,15 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi 62,50% a plaćeno u odnosu na dodijeljeno 41,67%.

**Tablica 25: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora 2007.-2011., u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	IPA Komponenta IIB - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora										2007.-2011.
	Godina alokacije 2007.		Godina alokacije 2008.		Godina alokacije 2009.		Godina alokacije 2010.		Godina alokacije 2011.		
	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	
	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	<b>2,00</b>
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,24	0,00	<b>1,84</b>
UGOVORENA SREDSTVA	0,00		0,00		0,36		0,40		0,24		<b>1,00</b>
UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	0,00%		0,00%		90,00%		100,00%		60,00%		<b>50%</b>
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0		0		0		0		0,04		<b>0,04</b>
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,14	0,03	0,15	0,00	<b>0,59</b>
PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO	2,78%	0,00%	0,00%	0,00%	72,22%	0,00%	38,89%	75,00%	62,50%	0,00%	<b>32,07%</b>
PLAĆENO /UKUPNO DODIJELJENO	2,78%	0,00%	0,00%	0,00%	72,22%	0,00%	38,89%	75,00%	41,67%	0,00%	<b>29,50%</b>
DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		10,00%		<b>2,00%</b>

Prioritet 1 Stvaranje povoljnih okolišnih i socioekonomskih uvjeta u programskom području kroz unapređenje suradnje u zajednički odabranim sektorima i dobrosusjedskih odnosa u prihvatljivim područjima  
Mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine  
Mjera 1.2. Zajedničke mjere u području turizma i kulturnog prostora

Mjera 1.3. Mali projekti razvoja prekograničnih zajednica  
Prioritet 2 Tehnička pomoć (TP) za povećanje administrativnog kapaciteta u upravljanju i provedbi programa prekogranične suradnje  
Mjera 2.1. Podrška upravljanju i provedbi programa  
Mjera 2.2. Podrška informiranju, promidžbi i evaluaciji programa

**Tablica 26: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Crna Gora 2007.-2011., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	IPA Komponenta IIB - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora										2007.- 2011.
	Godina alokacije 2007.		Godina alokacije 2008.		Godina alokacije 2009.		Godina alokacije 2010.		Godina alokacije 2011.		
	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	
	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	<b>2,00</b>
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,24	0,00	<b>1,84</b>
UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,67%	0,00%	<b>92,00%</b>
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,38		0,38		0,12		0,04		0,04		<b>0,96</b>
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJI KORISNICIMA	0,27	0,02	0,25	0,03	0,26	0,03	0,14	0,03	0,15	0,00	<b>1,18</b>
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	75,00%	50,00%	69,44%	75,00%	72,22%	75,00%	38,89%	75,00%	62,50%	0,00%	<b>64,13%</b>
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	75,00%	50,00%	69,44%	75,00%	72,22%	75,00%	38,89%	75,00%	41,67%	0,00%	<b>59,00%</b>
UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	95,00%		95,00%		30,00%		10,00%		10,00%		<b>48,00%</b>

Prioritet 1 Stvaranje povoljnih okolišnih i socioekonomskih uvjeta u programskom području kroz unapređenje suradnje u zajednički odabranim sektorima i dobrosusjedskih odnosa u prihvatljivim područjima  
Mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine  
Mjera 1.2. Zajedničke mjere u području turizma i kulturnog prostora

Mjera 1.3. Mali projekti razvoja prekograničnih zajednica  
Prioritet 2 Tehnička pomoć (TP) za povećanje administrativnog kapaciteta u upravljanju i provedbi programa prekogranične suradnje  
Mjera 2.1. Podrška upravljanju i provedbi programa  
Mjera 2.2. Podrška informiranju, promidžbi i evaluaciji programa

Iako u sklopu ovog Programa u izvještajnom razdoblju nije objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga, isti se nalazi u fazi pripreme.

U ovom je razdoblju ugovoreno 9 projekata, i to 3 projekta u sklopu alokacije za 2009. godinu, 5 projekata u sklopu alokacije za 2010. godinu te 1 projekt u sklopu alokacije za 2011. godinu. Svi ugovoreni projekti nalaze se u fazi provedbe. Od preostalih 8 projekata, ugovorenih u prethodnim izvještajnim razdobljima, njih 5 se nalazi u fazi provedbe, dok je za 3 projekta provedba završila.

Svi se projekti ugovoreni u izvještajnom razdoblju provode u Dubrovačko – neretvanskoj županiji. Njihova ukupna vrijednost iznosi 1 milijun eura.

Od početka provedbe programa objavljena su 2 poziva na dostavu projektnih prijedloga. Prvi je poziv bio otvoren od 21. kolovoza do 18. studenoga 2009. godine (financijske alokacije za 2007. i 2008. godinu). U sklopu tog poziva, indikativni iznos od 1,62 milijuna eura (0,72 milijuna eura za prijavitelje iz Hrvatske, 0,9 milijuna eura za prijavitelje iz Crne Gore) bio je na raspolaganju za provedbu projekata u obje države. Ukupno su zaprimljena 24 projektna prijedloga.

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga bio je otvoren od 5. prosinca 2011. godine do 5. ožujka 2012. godine (financijske alokacije za 2009., 2010. i 2011. godinu). U sklopu tog poziva, indikativni iznos od 2,43 milijuna eura (1,08 milijuna eura za prijavitelje iz Hrvatske, 1,35 milijuna eura za prijavitelje iz Crne Gore) bio je na raspolaganju za provedbu projekata u obje države. Ukupno je zaprimljeno 49 projektnih prijedloga.

U pripremi je i treći poziv koji će obuhvaćati alokacije za 2012. i 2013. godinu.

Do 30. lipnja 2013. ukupno je ugovoreno 17 projekata, i to 4 projekta u sklopu alokacije za 2007. godinu, 3 projekta u sklopu alokacije za 2008. godinu, 4 projekta u sklopu alokacije za 2009. godinu, 5 projekata u sklopu alokacije za 2010. godinu te 1 projekt u sklopu alokacije za 2011. godinu. Od ukupnog broja ugovorenih projekata, 14 ih se nalazi u fazi provedbe, dok je za 3 projekta provedba završila. Provedba svih ugovorenih projekata se odvija ili se odvijala na području Dubrovačko – neretvanske županije. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata iznosi 1,84 milijuna eura.

### **3.2.1.3. Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija**

Cilj ovog Programa jest poticati prekograničnu suradnju pograničnih područja Republike Hrvatske i Republike Srbije radi povećanja raznolikosti i unapređenja regionalnog gospodarstva na socijalno i ekološki održiv način, uz istovremeno poboljšavanje dobrosusjedskih odnosa uzduž granice. Dodatni programski cilj jest izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje programima EU i pripremanje tih institucija za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar cilja teritorijalne suradnje strukturnih fondova EU.

Prioriteti i mjere Programa:

Prioritet 1. Održivi društveno – gospodarski razvoj

Mjera 1.1. Gospodarski razvoj

Mjera 1.2. Zaštita okoliša

Mjera 1.3. „People to people“

## Prioritet 2. Tehnička pomoć

Mjera 2.1. Podrška upravljanju i provedbi programa

Mjera 2.2. Podrška informiranju, promidžbi i evaluaciji programa.

Republici Hrvatskoj je u okviru ovog Programa za svaku programsku godinu dodijeljeno 0,80 milijuna eura, od čega 10% odnosno 0,08 milijuna eura otpada na tehničku pomoć, a 90%, odnosno 0,72 milijuna eura je namijenjeno za projekte ugovorene putem poziva na dostavu projektnih prijedloga. Do sada je na snagu stupilo 5 Financijskih sporazuma, koji se odnose na alokacije za 2007. – 2011. godinu.

U izvještajnom je razdoblju ugovoreno 8 projekata iz alokacije za 2010. i 2011. godinu odabranih putem poziva na dostavu projektnih prijedloga, i to 2 projekta u sklopu alokacije za 2010. godinu te 6 projekata u sklopu alokacije za 2011. godinu. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u sklopu alokacije za 2010. godinu iznosi 0,44 milijuna eura, od čega na EU dio otpada 0,37 milijuna eura, a na sufinanciranje korisnika 0,07 eura. Stopa ugovaranja iznosi 46,25%. Ukupna vrijednost ugovorenog projekta u sklopu alokacije za 2011. godinu iznosi 0,47 milijuna eura, od čega na EU dio otpada 0,39 milijuna eura, a na sufinanciranje korisnika 0,08 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 48,75%.

Pored ugovaranja, u izvještajnom je razdoblju izvršeno 7 završnih plaćanja (2 u sklopu projekata iz alokacije za 2007. godinu u ukupnom iznosu 0,06 milijuna eura IPA sredstava, 4 u sklopu projekata iz alokacije za 2008. godinu u ukupnom iznosu 0,09 milijuna eura te 1 u sklopu projekta tehničke pomoći iz alokacije za 2009. godinu u iznosu 0,01 milijun eura) te 11 avansnih plaćanja (1 u sklopu alokacije za 2009. godinu u iznosu 0,04 milijuna eura, 4 u sklopu alokacije za 2010. godinu u ukupnom iznosu 0,34 milijuna eura te 6 u sklopu alokacije za 2011. godinu u ukupnom iznosu 0,26 milijuna eura).

Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno u sklopu 1. prioriteta alokacije za 2007. godinu iznosi 8,33%. Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno u sklopu 1. prioriteta alokacije za 2008. godinu iznosi 12,50%. Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno u sklopu 1. prioriteta alokacije za 2009. godinu iznosi 5,56%. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno u sklopu 2. prioriteta alokacije za 2009. godinu iznosi 12,50%. Plaćeno u odnosu na ugovoreno u sklopu 1. prioriteta alokacije za 2010. godinu iznosi 50%, a plaćeno u odnosu na dodijeljeno 47,22%. Plaćeno u odnosu na ugovoreno u sklopu 1. prioriteta alokacije za 2011. godinu iznosi 66,67%, a plaćeno u odnosu na dodijeljeno 36,11%.

Od početka provedbe Programa u sklopu alokacije za 2007. godinu ugovoreno je 6 projekata, 5 putem poziva na dostavu projektnih prijedloga i 1 projekt tehničke pomoći. Ukupna vrijednost projekata ugovorenih u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 0,86 milijuna eura, od čega je EU dio 0,72 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,14 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%. Ukupna vrijednost ugovora tehničke pomoći iznosi 0,12 milijuna eura, od čega je EU dio 0,08 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,04 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2008. godinu ugovoreno je 7 projekata, 6 putem poziva na dostavu projektnih prijedloga i 1 projekt tehničke pomoći. Ukupna vrijednost projekata ugovorenih u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 0,87 milijuna eura, od čega je EU dio 0,72 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,15 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%. Ukupna vrijednost ugovora tehničke pomoći iznosi 0,12 milijuna eura, od čega je EU

dio 0,08 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,04 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2009. godinu ugovoreno je 9 projekata, 8 putem poziva na dostavu projektnih prijedloga i 1 projekt tehničke pomoći. Ukupna vrijednost projekata ugovorenih u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 0,87 milijuna eura, od čega je EU dio 0,72 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,15 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%. Ukupna vrijednost ugovora tehničke pomoći iznosi 0,12 milijuna eura, od čega je EU dio 0,08 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,04 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2010. godinu ugovoreno je 5 projekata, 4 putem poziva na dostavu projektnih prijedloga (od čega 2 u prethodnom izvještajnom razdoblju, a 2 u ovom izvještajnom razdoblju) i 1 projekt tehničke pomoći. Ukupna vrijednost projekata ugovorenih u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 0,81 milijuna eura, od čega je EU dio 0,68 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,13 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 94,44%, dok je u prethodnom izvještajnom razdoblju iznosila 42,04%. Ukupna vrijednost ugovora tehničke pomoći iznosi 0,12 milijuna eura, od čega je EU dio 0,08 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,04 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2011. godinu ugovoreno je 6 projekata putem poziva na dostavu projektnih prijedloga. Ukupna vrijednost ugovorenog projekta iznosi 0,47 milijuna eura, od čega je EU dio 0,39 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,08 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 54,17%.

U sklopu 1. prioriteta alokacije za 2007. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,64 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 88,89%. U sklopu 2. prioriteta alokacije za 2007. godinu (tehničke pomoći) izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,06 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 75,00%.

U sklopu 1. prioriteta alokacije za 2008. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,66 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 91,67%. U sklopu 2. prioriteta alokacije za 2008. godinu (tehničke pomoći) izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,08 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno 100%.

U sklopu 1. prioriteta alokacije za 2009. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,49 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznose 68,06%. U sklopu 2. prioriteta alokacije za 2009. godinu (tehničke pomoći) izvršeno je plaćanje u iznosu 0,07 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi 87,50%, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno.

U sklopu 1. prioriteta alokacije za 2010. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,34 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi 50%, a plaćeno u odnosu na dodijeljeno 47,22%. U sklopu 2. prioriteta alokacije za 2010. godinu (tehničke pomoći) izvršeno je plaćanje u iznosu 0,06 milijuna eura IPA sredstava pri čemu plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 75%.

U sklopu 1. prioriteta alokacije za 2011. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,26 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi 66,67%, dok plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 36,11%.

**Tablica 27: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2007.-2011., u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	IPA Komponenta IIB - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija										2007.-2011.
	Godina alokacije 2007.		Godina alokacije 2008.		Godina alokacije 2009.		Godina alokacije 2010.		Godina alokacije 2011.		
	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	
	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	<b>4,00</b>
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,68	0,08	0,39	0,00	<b>3,55</b>
UGOVORENA SREDSTVA	0,00		0,00		0,00		0,37		0,39		<b>0,76</b>
UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	0,00%		0,00%		0,00%		46,25%		48,75%		<b>19,00%</b>
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0		0		0,24		0,44		0,08		<b>0,76</b>
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,06	0,00	0,09	0,00	0,04	0,01	0,34	0,00	0,26	0,00	<b>0,80</b>
PLAĆENO /UKUPNO UGOVORENO	8,33%	0,00%	12,50%	0,00%	5,56%	12,50%	50%	0,00%	66,67%	0,00%	<b>22,54%</b>
PLAĆENO /UKUPNO DODIJELJENO	8,33%	0,00%	12,50%	0,00%	5,56%	12,50%	47,22%	0,00%	36,11%	0,00%	<b>20%</b>
DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	0,00%		0,00%		30,00%		55,00%		10,00%		<b>19,00%</b>

Prioritet 1 Održivi društveno - gospodarski razvoj  
Mjera 1.1. Gospodarski razvoj  
Mjera 1.2. Zaštita okoliša  
Mjera 1.3. "People to people"

Prioritet 2 Tehnička pomoć  
Mjera 2.1. Upravljanje i provedba programa  
Mjera 2.2. Informiranje, promidžba i evaluacija programa

**Tablica 28: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2007.-2011., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	IPA Komponenta IIB - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija										2007.- 2011.
	Godina alokacije 2007.		Godina alokacije 2008.		Godina alokacije 2009.		Godina alokacije 2010.		Godina alokacije 2011.		
	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	
	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	<b>4,00</b>
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,68	0,08	0,39	0,00	<b>3,55</b>
UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94,44%	100,00%	54,17%	0,00%	<b>88,75%</b>
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,76		0,76		0,76		0,52		0,08		<b>2,88</b>
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,64	0,06	0,66	0,08	0,49	0,07	0,34	0,06	0,26	0,00	<b>2,66</b>
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	88,89%	75,00%	91,67%	100,00%	68,06%	87,50%	50,00%	75,00%	66,67%	0,00%	<b>74,93%</b>
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	88,89%	75,00%	91,67%	100,00%	68,06%	87,50%	47,22%	75,00%	36,11%	0,00%	<b>66,50%</b>
UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	95,00%		95,00%		95,00%		65,00%		10,00%		<b>72,00%</b>

Prioritet 1 Održivi društveno - gospodarski razvoj

Mjera 1.1. Gospodarski razvoj

Mjera 1.2. Zaštita okoliša

Mjera 1.3. "People to people"

Prioritet 2 Tehnička pomoć

Mjera 2.1. Upravljanje i provedba programa

Mjera 2.2. Informiranje, promidžba i evaluacija programa

Iako u sklopu ovog Programa u izvještajnom razdoblju nije objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga, isti se nalazi u fazi pripreme.

U ovom je razdoblju ugovoreno 8 projekata, i to 2 projekta u sklopu alokacije za 2010. godinu te 6 projekata u sklopu alokacije za 2011. godinu. Svi ugovoreni projekti nalaze se u fazi provedbe. Od preostalih 25 projekata, ugovorenih u prethodnim izvještajnim razdobljima, 21 se nalazi u fazi provedbe, dok je za 4 projekta provedba završila.

Projekti ugovoreni u izvještajnom razdoblju provode se na području dvije županije: Osječko – baranjske i Vukovarsko – srijemske. Četiri se projekta provode na području samo jedne županije (3 na području Osječko – baranjske i 1 na području Vukovarsko – srijemske), dok se preostala 4 provode na području obje županija. Ukupna vrijednost projekata s područja Osječko – baranjske županije iznosi 0,7 milijuna eura, a s područja Vukovarsko – srijemske županije 0,51 milijuna eura.

Od početka provedbe Programa objavljena su 2 poziva na dostavu projektnih prijedloga. Prvi je poziv bio otvoren od 17. srpnja do 16. listopada 2009. godine (financijske alokacije za 2007. i 2008. godinu). U sklopu tog poziva, indikativni iznos od 3,24 milijuna eura (1,44 milijuna eura za prijavitelje iz Hrvatske, 1,8 milijuna eura za prijavitelje iz Srbije) bio je na raspolaganju za provedbu projekata u obje države. Ukupno je zaprimljeno 110 projektnih prijedloga.


Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga bio je otvoren od 18. kolovoza 2011. do 15. studenog 2011. godine (financijske alokacije za 2009., 2010. i 2011. godinu). U sklopu tog poziva, indikativni iznos od 5,35 milijuna eura (2,16 milijuna eura za prijavitelje iz Hrvatske, 3,19 milijuna eura za prijavitelje iz Srbije) bio je na raspolaganju za provedbu projekata u obje države. Ukupno je zaprimljeno 146 projektnih prijedloga.

U pripremi je i treći poziv koji će obuhvaćati alokacije za 2012. i 2013. godinu.

Do 30. lipnja 2013. ukupno su ugovorena 33 projekta, i to 6 projekata u sklopu alokacije za 2007. godinu, 7 projekata u sklopu alokacije za 2008. godinu, 9 projekata u sklopu alokacije za 2009. godinu, 5 projekata u sklopu alokacije za 2010. godinu te 6 projekata u sklopu alokacije za 2011. godinu. Od ukupnog broja ugovorenih projekata, 29 ih se nalazi u fazi provedbe, dok je za 4 projekta provedba završila.

Ugovoreni se projekti provode na području 3 županije, i to Osječko – baranjske, Vukovarsko – srijemske i Brodsko – posavske. Dvadeset projekata se provodi na području samo jedne županije (11 na području Osječko – baranjske, 8 na području Vukovarsko – srijemske te 1 na području Brodsko – posavske), dok se preostali projekti provode na području više županija. Ukupna vrijednost projekata s područja Osječko – baranjske županije iznosi 2,70 milijuna eura, s područja Vukovarsko – srijemske županije 1,94 milijuna eura, a s područja Brodsko – posavske županije 0,46 milijuna eura.

**Grafikon 9: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013.**

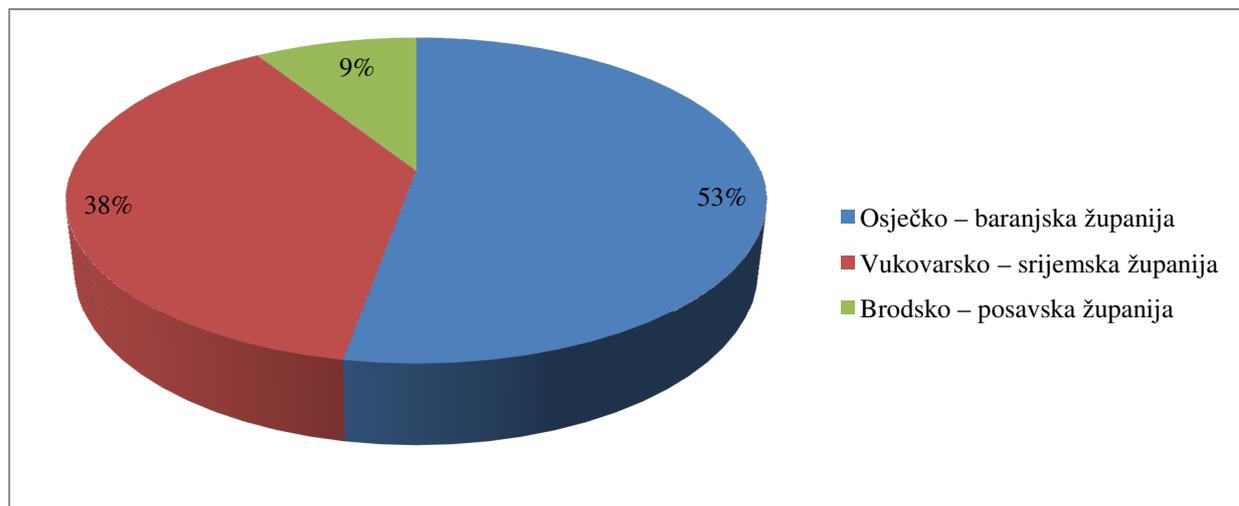

### **3.2.1. Transnacionalni programi: Program Jugoistočna Europa i Program Mediteran**

Navedenim se programima nastoji povezati partnere iz zemalja kandidatkinja/potencijalnih kandidatkinja s partnerima iz država članica kako bi kroz zajedničku provedbu aktivnosti stekli iskustvo s programima teritorijalne suradnje u okviru strukturnih fondova EU. Kroz navedene bi se programe, nadalje, trebala uspostaviti i razviti transnacionalna suradnja i to kroz sljedeća područja: inovativnost, okoliš, dostupnost i održivi urbani razvoj.

I ovi su programi namijenjeni neprofitnim organizacijama i institucijama. U projektnom partnerstvu moraju se nalaziti partneri iz najmanje tri različite države, od kojih jedna mora biti država članica EU. Svaki partner mora razraditi projekt na način da provedbom projektnih aktivnosti doprinosi ciljevima definiranim u samom programu. Osim neprofitnim organizacijama, Program Mediteran namijenjen je i odabranim lokalnim i regionalnim tijelima, gradovima, državnim tijelima, gospodarskim subjektima i istraživačkim institucijama, suradničkim strukturama malih i srednjih poduzeća.

#### **3.2.1.1. Transnacionalni program Jugoistočna Europa**

Republici Hrvatskoj je u okviru ovog Programa u sklopu alokacije za 2007., kao i za 2008. godinu dodijeljeno 0,4 milijuna eura, dok je u sklopu alokacije za 2009. godinu dodijeljeno 0,36 milijuna eura.

Svi su projekti ugovoreni u prethodnim izvještajnim razdobljima.

U izvještajnom su razdoblju izvršena 2 završna plaćanja u sklopu projekata iz alokacije za 2008. godinu u ukupnom iznosu 0,02 milijuna eura te 2 povrata od strane korisnika zbog neutrošenih/krivo utrošenih sredstava u iznosu od 0,04 milijuna eura.

Od početka provedbe programa u sklopu alokacije za 2007. godinu ugovorena su 3 projekta ukupne vrijednosti 0,41 milijuna eura, od čega je EU dio 0,35 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,06 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 87,50%.

U sklopu alokacije za 2008. godinu ugovoreno je 6 projekata ukupne vrijednosti 0,48 milijuna eura, od čega je EU dio 0,40 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,08 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2009. godinu ugovorena su 3 projekta ukupne vrijednosti 0,31 milijun eura, od čega je EU dio 0,26 milijun eura, a sufinanciranje korisnika 0,05 milijun eura. Stopa ugovaranja iznosi 72,22%.

U sklopu alokacije za 2007. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja IPA sredstava u ukupnom iznosu 0,31 milijun eura. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi 88,57%, a plaćeno u odnosu na dodijeljeno 77,50%.

U sklopu alokacije za 2008. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,31 milijun eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznose 77,50%.

U sklopu alokacije za 2009. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,18 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi 69,23%, a plaćeno u odnosu na dodijeljeno 50,00%.

Svi su projekti u sklopu ovog programa ugovoreni u prethodnim izvještajnim razdobljima. Od ukupno 12 ugovorenih projekata u izvještajnom se razdoblju u fazi provedbe nalazi njih 8, dok je za 4 projekta provedba završila.

Za razliku od projekata ugovorenih u sklopu programa prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU, ugovoreni projekti u sklopu ovog Programa provode se na području cijele Republike Hrvatske.

Od početka provedbe Programa objavljena su 2 poziva na dostavu projektnih prijedloga. Prvi je poziv obuhvaćao alokacije za 2007. i 2008. godinu, dok je drugi poziv obuhvatio alokaciju za 2009. godinu.

Do 30. lipnja 2013. ukupno je ugovoreno 12 projekata, i to 3 projekta u sklopu alokacije za 2007. godinu, 6 projekata u sklopu alokacije za 2008. godinu te 3 projekta u sklopu alokacije za 2009. godinu. Od ukupnog broja ugovorenih projekata, 8 ih se nalazi u fazi provedbe, dok je za 4 projekta provedba završila.

Projekti ugovoreni u sklopu ovog Programa provode se na području cijele Republike Hrvatske.

### **3.2.1.2. Program Mediteran**

Republici Hrvatskoj je u okviru ovog programa u sklopu alokacije za 2007. godinu dodijeljeno 0,05 milijuna eura, u sklopu alokacije za 2008. godinu 0,11 milijuna eura te u sklopu alokacije za 2009. godinu 0,14 milijuna eura. Svi su projekti ugovoreni u prethodnim izvještajnim razdobljima.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 1 završno plaćanje u sklopu projekata iz alokacije za 2008. godinu u iznosu 0,002 milijuna eura. Plaćeno u odnosu na ugovoreno, kao i plaćeno u odnosu na dodijeljeno u sklopu alokacije za 2008. godinu iznosi 1,82%. Od početka provedbe programa u sklopu alokacije za 2007. godinu ugovoren je 1 projekt ukupne vrijednosti 0,05

milijuna eura, od čega je EU dio 0,046 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,008 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2008. godinu ugovorena su 2 projekta ukupne vrijednosti 0,13 milijuna eura, od čega je EU dio 0,11 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,02 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2009. godinu ugovorena su 3 projekta ukupne vrijednosti 0,15 milijuna eura, od čega je EU dio 0,13 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,02 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 92,86%.

U sklopu alokacije za 2007. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,04 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 80%.

U sklopu alokacije za 2008. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,09 milijuna eura IPA sredstava. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 81,82%.

U sklopu alokacije za 2009. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,11 milijuna eura. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi 84,62%, a plaćeno u odnosu na dodijeljeno 78,57%.

Svi su projekti u sklopu ovog Programa ugovoreni u prethodnim izvještajnim razdobljima. Od ukupno 6 ugovorenih projekata u izvještajnom se razdoblju u fazi provedbe nalazi njih 4, dok je za 2 projekta provedba završila.


Ugovoreni se projekti provode na području 3 županije: Istarske, Varaždinske te Grada Zagreba. Tri se projekta provode u jednoj županiji (u svakoj od spomenutih županija po jedan), dok se četvrti projekt provodi na području 2 županije – Istarske i grada Zagreba. Ukupna vrijednost projekata s područja Istarske županije iznosi 0,11 milijuna eura, s područja Varaždinske županije 0,06 milijuna eura te s područja Grada Zagreba 0,08 milijuna eura.

Od početka provedbe Programa objavljena su 2 poziva na dostavu projektnih prijedloga. Prvi je poziv obuhvaćao alokacije za 2007. i 2008. godinu, dok je drugi poziv obuhvatio alokaciju za 2009. godinu.

Do 30. lipnja 2013. ukupno je ugovoreno 6 projekata, i to 1 projekt u sklopu alokacije za 2007. godinu, 2 projekta u sklopu alokacije za 2008. godinu te 3 projekta u sklopu alokacije za 2009. godinu.

Od ukupnog broja ugovorenih projekata, 4 se nalaze u fazi provedbe, dok je za 2 projekta provedba završila. Ugovoreni se projekti provode na području 4 županije: Istarske, Dubrovačko – neretvanske, Varaždinske te Grada Zagreba. Pet se projekata provodi na području samo jedne županije (2 na području Istarske, 1 na području Dubrovačko – neretvanske, 1 na području Varaždinske i 1 na području Grada Zagreba), dok se 1 projekt provodi na području 2 županije – Istarske i Grada Zagreba. Ukupna vrijednost projekata s područja Istarske županije iznosi 0,17 milijuna eura, s područja Dubrovačko – neretvanske županije 0,05 milijuna eura, s područja Varaždinske županije 0,06 milijuna eura te s područja Grada Zagreba 0,08 milijuna eura.

**Grafikon 10: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Transnacionalnog programa Mediteran od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013.**

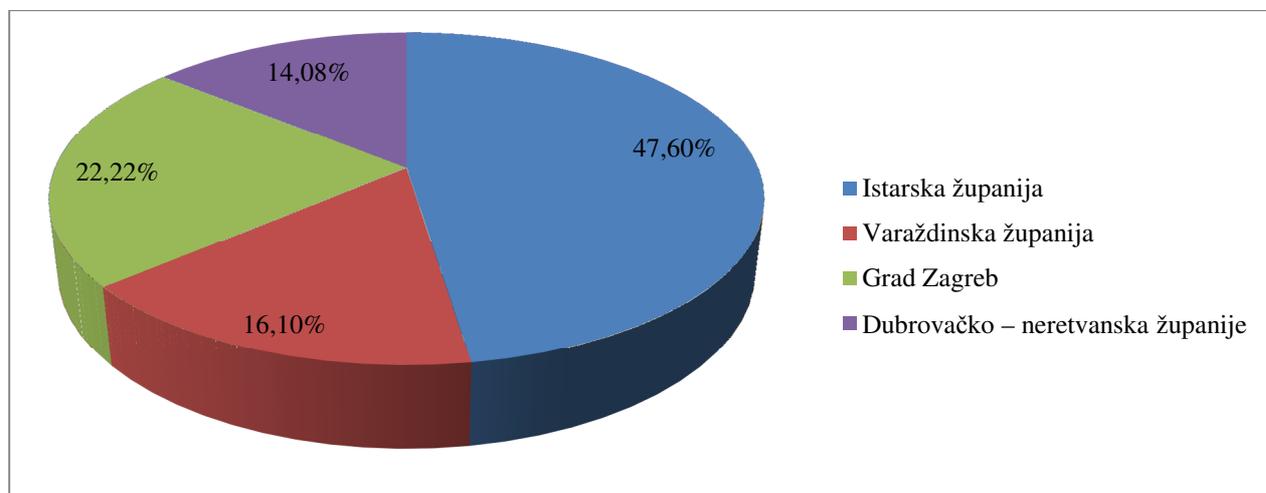

**Tablica 29: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Jugoistočna Europa i Mediteran 2007.-2009., u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	IPA Komponenta IIB - Transnacionalni programi Jugoistočna Europa i Mediteran						Jugoistočna Europa	Mediteran
	Godina alokacije 2007.		Godina alokacije 2008.		Godina alokacije 2009.			
	Jugoistočna Europa	Mediteran	Jugoistočna Europa	Mediteran	Jugoistočna Europa	Mediteran		
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,40	0,05	0,40	0,11	0,36	0,14	<b>1,16</b>	<b>0,30</b>
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,35	0,05	0,40	0,11	0,26	0,13	<b>1,01</b>	<b>0,29</b>
UGOVORENA SREDSTVA	0,00		0,00		0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	0,00%		0,00%		0,00%		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,00		0,00		0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,00	0,00	-0,02 <sup>7</sup>	0,002	0,00	0,00	<b>-0,02</b>	<b>0,002</b>
PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO	0,00%	0,00%	N/A	1,82%	0,00%	0,00%	<b>N/A</b>	<b>0,69%</b>
PLAĆENO /UKUPNO DODIJELJENO	0,00%	0,00%	N/A	1,82%	0,00%	0,00%	<b>N/A</b>	<b>0,67%</b>
DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	0,00%		0,00%		0,00%		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

<sup>7</sup> Navedeni iznos odnosi se na sredstva umanjena za izvršene povrate sredstava.

**Tablica 30: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Jugoistočna Europa i Mediteran 2007.-2009., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	IPA Komponenta IIB - Transnacionalni programi Jugoistočna Europa i Mediteran							
	Godina alokacije 2007.		Godina alokacije 2008.		Godina alokacije 2009.		Jugoistočna Europa	Mediteran
	Jugoistočna Europa	Mediteran	Jugoistočna Europa	Mediteran	Jugoistočna Europa	Mediteran	2007.-2009.	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,40	0,05	0,40	0,11	0,36	0,14	<b>1,16</b>	<b>0,30</b>
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,35	0,05	0,40	0,11	0,26	0,13	<b>1,01</b>	<b>0,29</b>
UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	87,50%	100,00%	100,00%	100,00%	72,22%	92,86%	<b>87,07%</b>	<b>96,67%</b>
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,37		0,48		0,36		<b>1,21</b>	
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,31	0,04	0,31	0,09	0,18	0,11	<b>0,80</b>	<b>0,24</b>
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	88,57%	80,00%	77,50%	81,82%	69,23%	84,62%	<b>79,21%</b>	<b>82,76%</b>
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	77,50%	80,00%	77,50%	81,82%	50,00%	78,57%	<b>68,97%</b>	<b>80,00%</b>
UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	82,22%		94,12%		72,00%		N/A	

### 3.2.2. Prekogranični programi s državama članicama Europske unije

Zajednička karakteristika programa s državama članicama Europske unije jest specifičan način provedbe takozvanim zajedničkim upravljanjem (*eng. shared management*) i organizacije provedbenih tijela sukladno članku 102. Provedbene uredbe Europske komisije za program IPA broj 718/2007: zemlje sudionice prekograničnog programa imaju zajednička tijela - upravljačko tijelo, zajedničko tijelo za ovjeravanje te zajedničko tijelo za reviziju.

Republika Hrvatska sudjeluje u sljedećim Programima prekogranične suradnje s državama članicama Europske unije:

- Program IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.
- Program IPA prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.
- Program IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013.

Prethodno Izvješće o korištenju pretpristupne pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine je po prvi puta obuhvatilo projekte Prekograničnih programa s državama članicama Europske unije, stoga se podaci nastavljaju prikazivati i u ovom Izvješću.

Podaci prikazani za navedene programe prekogranične suradnje sa zemljama članicama iskazuju zbirne iznose, odnosno uključuju IPA sredstva i sredstva nacionalnog sufinanciranja zbog različitog modaliteta provedbe od ostalih komponenti programa IPA.

**Tablica 31: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje sa zemljama članicama do 30. lipnja 2013. (u milijunima eura)**

	Program IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.	Program IPA prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.	Program IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013.	UKUPNO PREKOGRANIČNI PROGRAMI SA ZEMLJAMA ČLANICAMA
DODIJELJENA SREDSTVA <sup>8</sup>	226,04	40,89	43,51	310,44
UGOVORENA SREDSTVA <sup>9</sup>	30,77	13,58	17,12	61,47
UGOVORENO/ DODIJELJENO	13,61%	32,21%	39,35%	19,80%
VERIFICIRANA SREDSTVA <sup>10</sup>	3,39	7,57	2,69 <sup>11</sup>	13,65


<sup>8</sup> Ukupan raspoloživi iznos za sve države sudionice (IPA + nacionalno sufinanciranje)

<sup>9</sup> Za korisnike iz RH (IPA sredstva+ nacionalno sufinanciranje)

<sup>10</sup> Odobreno krajnjim RH korisnicima od strane FLC-a do 30. lipnja 2013. godine

<sup>11</sup> Razdoblje od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013.

**Grafikon 11: Grafički prikaz statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje sa zemljama članicama, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

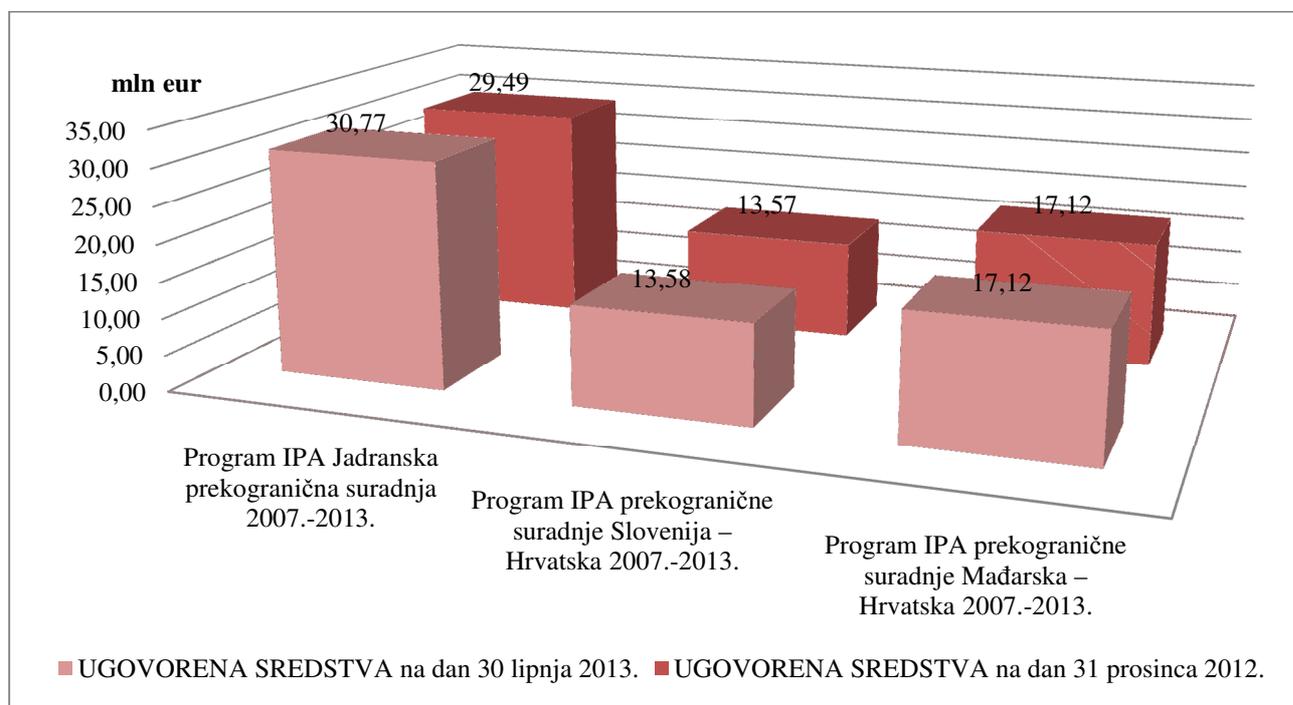

### 3.2.2.1. Program IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.

Program IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013 bazira se na tri prioriteta i pripadajućim im mjerama: Prioritet 1 – Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja (Istraživanje i inovacije; Novčana potpora inovativnim malim i srednjim poduzećima; Društvene, socijalne i zdravstvene mreže; Institucionalna suradnja), Prioritet 2 - Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika (Zaštita i unaprjeđenje morskog i obalnog područja; Upravljanje prirodnim i kulturnim bogatstvima i sprječavanje prirodnih i tehnoloških rizika; Štednja energije i obnovljivi izvori energije; Održivi turizam) i Prioritet 3 - Pristupačnost i mreže (Fizička infrastruktura; Sustavi održive pokretljivosti; Komunikacijske mreže). U Programu trenutno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Grčka, Italija, Hrvatska i Slovenija.

Program je namijenjen pravnim osobama javnog ili privatnog prava, s uredom registriranim na programskom području (izuzetak su nacionalna ili regionalna tijela javne vlasti, ili tijela koja djeluju u okviru javnog prava, koja na programskom području imaju upravnu nadležnost, a locirana su izvan njega (npr. ministarstva, regionalni uredi itd.). U okviru svake od mjera Programa neprofitne privatne organizacije se mogu javiti i u ulozi krajnjih korisnika i u ulozi vodećih korisnika.

Za razdoblje 2007.-2013. Programu je na raspolaganju iznos od 0,29 milijuna eura. Alokacije IPA sredstava po projektu kretale su se od 0,5 do 5 milijuna eura.

Sustav provedbe je „podijeljeno upravljanje“, što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu alokaciju Programa bez ograničenja. Upravljačko tijelo programa je regija Abruzzo sa sjedištem u L'Aquili, Italija. Tijelo odgovorno za upravljanje programom na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Podršku Upravljačkom tijelu u upravljanju Programom, informiranju javnosti i pružanju savjetodavnih usluga predlagateljima projekata pruža Zajedničko tehničko tajništvo koje čine zaposlenici iz svih država sudionica Programa. Podršku potencijalnim prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj pruža osoba zaposlena kao Info točka sa sjedištem u Zagrebu.

U okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga IPA Programa Jadranske prekogranične suradnje koji je raspisan u srpnju 2009. godine u iznosu od 73,83 milijuna eura, financirana su ukupno 33 projekta, od kojih u 27 projekata sudjeluje 52 hrvatska projektna partnera u ukupnom iznosu od 13,06 milijuna eura.

U okviru drugog poziva ukupne vrijednosti 79,71 milijuna eura iz 2011. godine za financiranje su odobrena 33 projekta, od čega 29 projekta sa 61 hrvatskim projektnim partnerom. Većina odobrenih projekata ugovorena je u listopadu 2012. godine, a ukupna ugovorena vrijednost koja se odnosi na hrvatske partnere iznosi 15,33 milijuna eura.

U 2011. godini odlukom Zajedničkog nadzornog odbora Programa donesena je odluka o financiranju strateškog projekta „Alterenergy“ koji proizlazi izravno iz Operativnog programa. Ukupna vrijednost ugovorena za hrvatske partnere u okviru ovog projekta je 1,25 milijuna eura, a do 31. prosinca 2012. godine ovjereno je troškova u iznosu od 0,57 milijuna eura. Prvi poziv za strateške projekte, raspisan je u rujnu 2012. godine u ukupnom iznosu od 60,00 milijuna eura, a kojim će se omogućiti financiranje projekata hrvatskih projektnih partnera.

Konačnu odluku o odabiru projekata koji će se financirati kroz Program donosi Zajednički odbor za praćenje (Joint Monitoring Committee - JMC) Programa koji čine predstavnici svih država s nacionalne i regionalne razine.

**Tablica 32: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (u milijunima eura)**

	1. poziv - alokacije 2007.-2009.	2. poziv - alokacije 2010.-2011.	Strateški projekt „Alterenergy“	1. strateški poziv - alokacije 2012.-2013.	Tehnička pomoć
DODIJELJENA SREDSTVA	73,83	79,71	12,50	60,00	n/a
UGOVORENA SREDSTVA	13,06	15,33	1,25	u postupku ugovaranja	1,13
UGOVORENO/DODIJELJENO	17,69%	19,24%	9,99%	n/a	n/a
VERIFICIRANA SREDSTVA	2,94	0,39	0,06	n/a	n/a

### **3.2.2.2. Program IPA prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.**

Program IPA prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. bazira se na dva prioriteta (Gospodarski i društveni razvoj te Održivo upravljanje prirodnim resursima) i 5 odgovarajućih mjera (Turizam i ruralni razvoj, Razvoj poduzetništva, Društvena integracija, Zaštita okoliša i Očuvanje zaštićenih područja).

Program je namijenjen neprofitnim organizacijama i institucijama koje žele raditi na prekograničnom projektu s najmanje jednim prekograničnim partnerom: kao korisnici i podnositelji prijave mogu se javiti neprofitne pravne osobe, osnovane u skladu s javnim ili privatnim pravom koje djeluju u javnom i općem interesu.

Za razdoblje 2007.-2013. Programu je na raspolaganju iznos od 42,70 milijuna eura. Alokacije IPA sredstava po projektu kretale su se od 0,08 do 2 milijuna eura, ovisno o prioritetu i pozivu.

Sustav provedbe je „podijeljeno upravljanje“, što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu alokaciju programa bez ograničenja. Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo gospodarskog razvoja i tehnologije Republike Slovenije, Uprava za regionalni razvoj i europsku teritorijalnu suradnju, sa sjedištem u Ljubljani. Tijelo odgovorno za upravljanje Programom na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo regionalnoga razvoj i fondova Europske unije.

Podršku Upravljačkom tijelu u upravljanju Programom, informiranju javnosti i pružanju savjetodavnih usluga predlagateljima projekata pruža Zajedničko tehničko tajništvo koje čine zaposlenici iz obje države sudionice Programa. Podršku potencijalnim prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj pruža osoba zaposlena kao Info-točka sa sjedištem u Zagrebu.

Konačnu odluku o odabiru projekata koji će se financirati kroz Program donosi Zajednički odbor za praćenje (*Joint Monitoring Committee - JMC*) Programa koji čine predstavnici obje država s nacionalne i regionalne razine.

Prvi poziv za prijavu projekata u sklopu Programa, u iznosu od 14,15 milijuna eura, objavljen je 20. lipnja 2008. godine, a po završetku procesa evaluacije ugovoren je 21 projekt. Drugi poziv za prijavu projektnih prijedloga, s raspoloživih 11,90 milijuna eura, bio je otvoren od 23. travnja do 30. lipnja 2010. godine: od 183 pristigle prijave odobrena su 24 projekta prekogranične suradnje. Treći poziv otvoren je 3. veljače, a rok za predaju prijave je bio 16. travnja 2012. godine. Ukupna IPA alokacija namijenjena za 3. poziv iznosi 13,76 milijuna eura. Projekti prihvatljivi za sudjelovanje u programu su oni čiji ukupni zahtijevani iznos IPA sredstava iznosi od 0,08 do 1 milijun eura za 1. prioritet (Ekonomski i društveni razvoj), te od 0,08 do 1,5 milijuna eura za 2. prioritet (Održivo upravljanje prirodnim resursima).

**Tablica 33: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (u milijunima eura)**

	1. poziv - alokacije 2007.-2009.	2. poziv - alokacije 2010.-2011.	3. poziv - alokacije 2012.-2013.	Tehnička pomoć
DODIJELJENA SREDSTVA	14,15	11,90	13,76	n/a
UGOVORENA SREDSTVA	6,22	6,28	evaluacija u tijeku	1,08
UGOVORENO/ DODIJELJENO	43,96%	52,77%	n/a	100%
VERIFICIRANA SREDSTVA	4,17	3,40	n/a	n/a

### **3.2.2.3. Program IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013.**

Program IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013. bazira se na sljedećim prioritetima i mjerama: Održivi okoliš i turizam (mjere: Održiv i atraktivan okoliš; Održiv turizam na području rijeka Mure, Drave i Dunava) i Razvoj gospodarske suradnje i zajedničkih ljudskih kapaciteta (Gospodarska suradnja; Razvoj zajedničkih ljudskih kapaciteta).

Program je namijenjen neprofitnim organizacijama i institucijama koje žele raditi na prekograničnom projektu s najmanje jednim prekograničnim partnerom: kao korisnici i podnositelji prijave mogu se javiti neprofitne pravne osobe, osnovane u skladu s javnim ili privatnim pravom koje djeluju u javnom i općem interesu.

Sredstva su dostupna u programski prihvatljivom području za projekte zaštite okoliša, projekte koji jačaju gospodarsku i socijalnu koheziju, kao i zajednička istraživanja, razvoj i inovacije te projekte promocije prekogranične mobilnosti tržišta rada. Značajni dio sredstava namijenjen je razvojnim projektima iz područja turizma, uključujući razvoj turističke infrastrukture, kao i aktivnosti s ciljem očuvanja zajedničke kulturne baštine.

Prihvatljiva područja za financiranje obuhvaćaju sljedeće hrvatske županije: Međimursku, Kopriivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku. Pridružena područja koja mogu koristiti najviše 20% od ukupnog financiranja iz sredstava Unije su: Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija.

Vrijednost Programa za razdoblje 2007. – 2013. godine je 52,43 milijuna eura IPA sredstava. Kao i u svim ostalim programima prekogranične suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, projekti se financiraju do 85% bespovratnim EU (IPA) sredstvima, dok sufinanciranje korisnika (tzv. nacionalno sufinanciranje) iznosi najmanje 15%. Neprofitne organizacije i udruge koje kao pravne osobe nisu izravni korisnici sredstava državnog proračuna RH imaju pravo na nacionalno sufinanciranje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Predfinanciranje nije predviđeno. Sufinanciranje od strane EU kreće se od 0,01 do 3 milijuna eura po projektu, ovisno o prioritetu i mjeri.

Sustav provedbe je „podijeljeno upravljanje“, što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu alokaciju Programa bez ograničenja. Upravljačko tijelo Programa je Nacionalna razvojna agencija u Budimpešti, Mađarska. Tijelo odgovorno za upravljanje Programom na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalno tijelo pruža podršku Upravljačkom tijelu u koordinaciji programskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Zajednički odbor za praćenje (Joint Monitoring Committee - JMC) koji se sastoji od predstavnika objiju država s lokalne/regionalne i središnje razine, nadzire provedbu Programa i tijelo je koje odlučuje o odabiru projekata unutar pojedinog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Podršku potencijalnim prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj pruža osoba zaposlena kao Info-točka sa sjedištem u Osijeku.

Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga bio je otvoren od 26. ožujka do 24. lipnja 2009. godine. Ukupno je bilo raspoloživo 11,67 milijuna eura. Od pristiglih 67 prijave, za financiranje su odabrana 42 projekta s ukupno 74 hrvatska projektna partnera. Odobreni projekti ugovoreni su u drugom tromjesečju 2010. godine, a ukupna ugovorena vrijednost koja se odnosi na hrvatske partnere iznosi 7,18 milijuna eura.

Drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga bio je otvoren od 10. lipnja do 15. rujna 2010. godine. Ukupno je bilo raspoloživo 11,07 milijuna eura. Od pristigla 94 projektna prijedloga, za financiranje je odobreno 60 projekata, s ukupno 84 hrvatska partnera. Odobreni projekti ugovoreni su u drugoj polovici 2011. godine, a ukupna ugovorena vrijednost projekata koja se odnosi na hrvatske partnere iznosi 7,81 milijuna eura.

Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga bio je otvoren od 22. studenog 2011. do 12. ožujka 2012. godine. Ukupno je bilo raspoloživo 20,77 milijuna eura. Od pristigla 154 projektna prijedloga za financiranje je odobreno 39 projekata s ukupno 79 hrvatskih projektnih partnera.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine Kontrolno tijelo za prvostupanjsku kontrolu troškova IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u projektima iz 1. poziva ovjerilo je troškova u iznosu od 1,25 milijuna eura dok je u projektima iz 2. poziva ovjerilo troškova u iznosu od 1,44 milijuna eura. Odobravanje troškova iz 3. poziva za dostavu projektnih prijedloga je započelo tek u srpnju 2013. godine.

**Tablica 34: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (u milijunima eura)**

	<b>1. poziv - alokacije 2007.-2009.</b>	<b>2. poziv - alokacije 2010.-2011.</b>	<b>3. poziv</b>	<b>Tehnička pomoć</b>
DODIJELJENA SREDSTVA	11,67	11,07	20,77	n/a
UGOVORENA SREDSTVA	7,18	7,81	n/a	2,13
UGOVORENO/ DODIJELJENO	61,52%	70,56%	0,00%	n/a
VERIFICIRANA SREDSTVA <sup>12</sup>	1,25	1,44	n/a	n/a

<sup>12</sup> Odobreno krajnjim RH korisnicima od strane FLC-a od 1/1/2013 do 30/6/2013

### **3.3. KOMPONENTA III PROGRAMA IPA – REGIONALNI RAZVOJ**

Komponenta III programa IPA obuhvaća tri resora odnosno pod-komponente – promet, zaštitu okoliša i regionalnu konkurentnost. U okviru te komponente izrađena su tri Operativna programa, a u tijeku su natječajni postupci i provedba ugovorenih projekata.

U izvještajnom razdoblju došlo je do izmjena Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Operativne programe u sklopu komponente III programa IPA, kojima se između ostaloga ukupno dodijeljena sredstva uvećavaju za alokacije iz 2012. i prve polovice 2013. godine.

Izmjene Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Operativne programe Promet, Zaštita okoliša i Regionalna konkurentnost (odnosno komponente III A, B i C programa IPA) potvrđene su u Hrvatskome saboru u ožujku odnosno svibnju 2013. godine.

#### **3.3.1. Komponenta III a programa IPA – Regionalni razvoj: Operativni program „Promet“**

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog Operativnog programa uključuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zaduženo za upravljanje Operativnim programom, te HŽ Infrastrukturu d.o.o. i Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u svojstvu provedbenih tijela.

IPA sredstva dodijeljena Operativnom programu „Promet“ za razdoblje 2007.–2013. iznose 116,98 milijuna eura (u prethodnom izvještajnom razdoblju dodijeljena sredstva iznosila su 96,75 milijuna eura, a u predmetnom izvještajnom razdoblju povećana su do iznosa navedenog u Izmjenama Sporazuma o financiranju), dok nacionalno sufinanciranje iznosi 20,65 milijuna eura, čime ukupna vrijednost Operativnog programa „Promet“ iznosi 137,63 milijuna eura.

Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2013. godine ugovoreno je ukupno 81,12 milijuna eura (od čega 68,95 milijuna eura IPA sredstava i 12,17 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja), odnosno 58,94% dodijeljenih sredstava. Do kraja lipnja 2013. godine korisnicima je ukupno isplaćeno 47,62 milijuna eura (od čega 40,47 milijuna eura IPA sredstava i 7,15 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja), odnosno 58,69% ukupno ugovorenih bespovratnih sredstva.

U izvještajnom razdoblju potpisano je 5 novih ugovora i jedan dodatak ugovoru vrijednosti 4,38 milijun eura, te je krajnjim korisnicima plaćeno 8,96 milijuna eura. Od početka provedbe Operativnog programa ugovorena su ukupno 23 ugovora dok ih je u provedbi 13. S provedbom je završeno 10 ugovora vrijednosti 13,57 milijuna eura (od čega 11,49 milijuna eura IPA sredstava), dok je u fazi ugovaranja 8 ugovora.

**Tablica 35: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	PO 1		PO 2	PO 3	UKUPNO
	M 1.1	M 1.2			
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	93,76	13,72	6,50	3,00	116,98
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	52,18	10,53	5,16	1,21	68,95
UGOVORENA SREDSTVA	0,17	0,47	3,46	0,28	4,38
UGOVORENO/ UKUPNO DODIJELJENO	0,18%	3,43%	53,23%	9,33%	3,74%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	25,55				25,55
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJI KORISNICIMA	5,55	1,99	1,26	0,16	8,96
PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO	10,64%	18,90%	24,42%	13,22%	12,99%
PLAĆENO/ UKUPNO DODIJELJENO	5,92%	14,50%	19,38%	5,33%	7,66%
OVJERENO	5,55	1,99	1,26	0,16	8,96
DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	21,84%				21,84%
OVJERENO/UKUPNO UGOVORENO	10,64%	18,90%	24,42%	13,22%	12,99%
OVJERENO/UKUPNO DODIJELJENO	5,92%	14,50%	19,38%	5,33%	7,66%

Prioritetna os 1: Unapređenje željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj  
Mjera 1.1.: Nadogradnja i modernizacija pruga  
Mjera 1.2.: Povećanje sigurnosti i učinkovitosti rada željeznice

Prioritetna os 2: Unapređenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj  
Prioritetna os 3: Tehnička pomoć

**Tablica 36: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**


	PO 1		PO 2	PO 3	UKUPNO
	M 1.1	M 1.2			
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	93,76	13,72	6,50	3,00	116,98
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	52,18	10,53	5,16	1,21	68,95
UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	55,65%	76,75%	79,38%	40,33%	58,94%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	55,86				55,86
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJIJIM KORISNICIMA	27,32	9,91	2,45	0,79	40,47
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	52,36%	94,11%	47,48%	65,29%	58,69%
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	29,14%	72,23%	37,69%	26,33%	34,60%
UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	47,75%				47,75%
UKUPNO OVJERENO	27,32	9,91	2,45	0,79	58,98*
UKUPNO OVJERENO/ UKUPNO UGOVORENO	52,36%	94,11%	47,48%	65,29%	58,69%
UKUPNO OVJERENO/ UKUPNO DODIJELJENO	29,14%	72,23%	37,69%	26,33%	34,60%

\* Uključen avans 1 u iznosu 16,05 milijuna eura i avans 2 u iznosu 2,46 milijuna eura.

Prioritetna os 1: Unapređenje željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj  
Mjera 1.1.: Nadogradnja i modernizacija pruga  
Mjera 1.2.: Povećanje sigurnosti i učinkovitosti rada željeznice

Prioritetna os 2: Unapređenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj  
Prioritetna os 3: Tehnička pomoć

**Grafikon 12: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

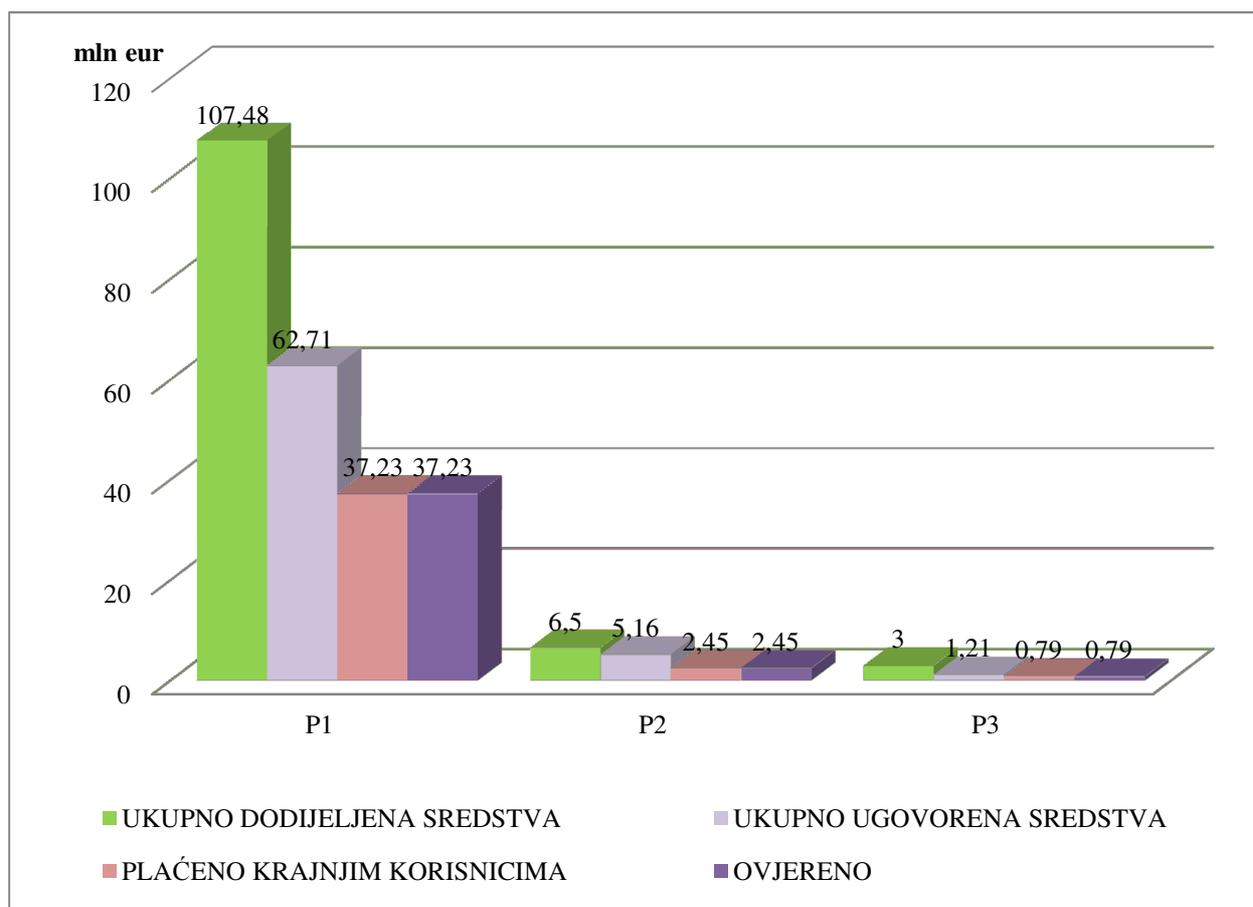

U okviru **Prioritetne osi 1** Unapređenje željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj, u prvoj polovici 2013. godine objavljena su dva natječaja za ugovore o uslugama, i to za projekte:

- Modernizacija i rekonstrukcija kolosijeka, izgradnja drugog kolosijeka te izgradnja dvostrukog kolosijeka pruge Dugo Selo – Novska, faza 2 i 3, priprema projektne dokumentacije;
- Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za projekt Rekonstrukcija i elektrifikaciju željezničke pruge Vinkovci – Vukovar.

U istom razdoblju potpisan je jedan novi ugovor o uslugama za projekt Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovne zgrade Agencije za sigurnost željezničkog prometa.

U izvještajnom razdoblju u fazi provedbe bilo je 8 ugovora:

1. Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani – Novska, ugovor o izvođenju radova na građevinskim i elektrotehničkim postrojenjima pruge;
2. Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani – Novska, ugovor o izvođenju radova na signalno sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima;
3. Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani – Novska, ugovor o nadzoru radova;
4. Modernizacija i rekonstrukciju željezničke pruge Dugo Selo – Novska, faza 1- Priprema projektne dokumentacije, ugovor o uslugama;
5. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za projekt Izgradnja nove dvokolosiječne željezničke pruge Goljak – Skradnik, ugovor o uslugama;
6. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za projekt Nadogradnja i rekonstrukcija dionice Križevci – Koprivnica – državna granica s izgradnjom drugog kolosijeka, ugovor o uslugama;
7. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za projekt Nadogradnja, izgradnja nove dvokolosiječne željezničke pruge te drugog kolosijeka na dionici željezničke pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac, ugovor o uslugama;
8. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovne zgrade Agencije za sigurnost željezničkog prometa, ugovor o uslugama.

U istom razdoblju završena je provedba velikog infrastrukturnog projekta „Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru“.

Od početka provedbe Operativnog programa do zadnjeg dana izvještajnog razdoblja s provedbom su završila četiri ugovora:

1. Potpora HŽ Infrastrukturi u ocjeni natječajne dokumentacije za radove, ugovor o uslugama;
2. Sustav signalnosigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru - Izvođenje radova, ugovor o radovima;
3. Sustav signalnosigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru - Nadzor radova, ugovor o uslugama;
4. Sustav signalnosigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru - Isporuka skretnica, ugovor o nabavi roba.

U okviru **Prioritetne osi 2** Unapređenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj, u prvoj polovici 2013. godine objavljena su tri natječaja, od kojih dva za ugovore o uslugama, i to za projekte:

- Izgradnja i rekonstrukcija Južne obale luke Osijek - Tehnička pomoć za pripremu projektne dokumentacije;

- Puna implementacija riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi - implementacija RIS i govornih VHS sustava na rijeci Savi;

te jedan za ugovor za nabavu roba naziva Puna implementacija riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi - implementacija RIS i govornih VHS sustava na rijeci Savi.

U istome razdoblju potpisana su tri nova ugovora, dva ugovora o uslugama, i to za projekte:

- Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save;
- Tehnička pomoć za obnovu luke Vukovar – nova luka istok“;

te jedan okvirni ugovor za projekt Riječna luka Slavonski Brod - terminal za prihvata opasnog tereta.

U izvještajnom razdoblju u fazi provedbe bila su 4 ugovora:

1. Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save, ugovor o uslugama;
2. Tehnička pomoć za obnovu luke Vukovar – nova luka istok, ugovor o uslugama;
3. Riječna luka Slavonski Brod – terminal za prihvat opasnog tereta; okvirni ugovor;
4. Master plan za Novu luku Sisak – Tehnička pomoć za pripremu projektne dokumentacije, ugovor o uslugama.

Od početka provedbe Operativnog programa do zadnjeg dana izvještajnog razdoblja s provedbom su završila tri ugovora:

1. Tehnička pomoć za pregled dokumentacije za obnovu i poboljšanje plovnog puta rijeke Save, okvirni ugovor;
2. Tehnička pomoć za pregled dokumentacije za obnovu luke Vukovar – nova luka istok, okvirni ugovor;
3. Tehnička pomoć za pregled dokumentacije za obnovu južnog pristana riječne luke Osijek, okvirni ugovor.

U okviru **Prioritetne osi 3** Tehnička pomoć, u prvoj polovici 2013. godine objavljena su tri natječaja za ugovore o uslugama, i to za projekte:

- Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata;
- Potpora u pripremi Strategije prometnog razvitka RH - Prometni model za Republiku Hrvatsku;
- Potpora u pripremi strateške procjene utjecaja na okoliš za strategiju prometnog razvitka Republike Hrvatske.

U istom razdoblju potpisan je jedan novi ugovor o uslugama za projekt Potpora u pripremi Strategije prometnog razvitka RH - Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske.

U izvještajnom razdoblju u fazi provedbe bio je jedan projekt Potpora u pripremi Strategije prometnog razvitka RH - Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske, a od početka provedbe Operativnog programa do zadnjeg dana izvještajnog razdoblja ukupno su s provedbom završila tri ugovora:

1. Potpora Operativnoj strukturi za promet u samostalnoj identifikaciji, ocjenjivanju i pripremi projekata - ugovor o uslugama;
2. Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata – ugovor o uslugama;
3. Potpora u pripremi Strategije prometnog razvitka RH - Tehnička pomoć pri osnivanju tehničkog tajništva za organizaciju i upravljanje procesom izrade sektorskih prometnih razvojnih strategija – okvirni ugovor.

### **3.3.2. Komponenta III B programa IPA – Regionalni razvoj: Operativni program „Zaštita okoliša“**

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog Operativnog programa uključuje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode te Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Krajnji primatelji pomoći odnosno korisnici za Prioritetnu os 1 su županijske komunalne tvrtke (mjera 1.1) i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (mjera 1.2), za Prioritetnu os 2 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, operateri vodnokomunalne infrastrukture (komunalne tvrtke) i Hrvatske vode te za Prioritetnu os 3 tijela Operativne strukture.

IPA sredstva dodijeljena Operativnom programu „Zaštita okoliša“ iznose 131,30 milijuna eura za razdoblje 2007.-2013. (u prethodnom izvještajnom razdoblju dodijeljena sredstva iznosila su 96,70 milijuna eura, a u predmetnom izvještajnom razdoblju povećana su do iznosa navedenog u Izmjenama Sporazuma o financiranju).

Na razini Operativnog programa, u izvještajnom razdoblju ugovoreno je 8,90% sredstava u odnosu na ukupno dodijeljena sredstva, plaćeno je 6,44% od ukupno dodijeljenih sredstava, te je ovjereno 7,34% od dodijeljenih sredstava.

**Tablica 37: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	PO 1		PO 2	PO 3	UKUPNO
	M 1.1	M 1.2	M 2.1 i 2.2	M 3.1	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	41,91	0,47	86,84	2,07	131,29
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	45,14	0,46	36,62	1,92	84,14
UGOVORENA SREDSTVA	0*	0	10,58	1,09	11,68
UGOVORENO/ UKUPNO DODIJELJENO	0%	0%	12,18%	52,66%	8,90%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	18,02				18,02
UKUPNO PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	2,90	0	5,53	0,03	8,46
PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO	6,42%	0	15,10%	1,56%	10,05%
PLAĆENO/ UKUPNO DODIJELJENO	6,92%	0	6,37%	1,45%	6,44%
OVJERENO	2,46	0	7,15	0,03	9,64
DOZNAČENO/ UKUPNO DODIJELJENO	13,72%				13,73%
OVJERENO/UKUPNO UGOVORENO	5,45%	0	19,52 %	1,56%	11,46%
OVJERENO/UKUPNO DODIJELJENO	5,87%	0	8,23 %	1,45%	7,34%

\* u izvještajnom razdoblju nije bilo ugovaranja u okviru PO1. Međutim, pod mjerom 1.1. u izvještajnom razdoblju stupili su na snagu Dvostrani sporazumi za projekte Marišćina i Kaštijun, te je time u izvještajnom razdoblju došlo do povećanja ukupno ugovorenog iznosa za 15.483.826 eura.

Prioritetna os 1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj

Mjera 1.1.: Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini

Mjera 1.2.: Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom (crne točke)

Prioritetna os 2: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama

Mjera 2.1.: Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža

Mjera 2.2.: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za otpadne vode iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže

Prioritetna os 3: Tehnička pomoć

Mjera 3.1.: Upravljanje programom

U području **Prioritetne osi 1** gospodarenja otpadom, u izvještajnom razdoblju za Prioritetnu os 1, Mjeru 1.1, u ožujku 2013. potpisani su izmijenjeni Dvostrani sporazumi za projekte izgradnje Županijskih centara za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina (ukupne vrijednosti 36,06 milijuna eura) i Kaštijun (ukupne vrijednosti 35,07 milijuna eura), nastavno na Odluke Europske komisije donesene krajem 2012. godine, kojima se udjeli sufinanciranja EU povećavaju za projekt Marišćina s 45,3% na 70,9%, a za projekt Kaštijun s 48,3% na 71,4%. Stoga ukupni iznos IPA sredstava za projekt ŽCGO Marišćina iznosi 25,6 milijuna eura, a za projekt ŽCGO Kaštijun 25,1 milijuna eura. Projekti izgradnje ŽCGO Marišćina i ŽCGO Kaštijun provode se kroz 5 ugovora (1 ugovor za radove, 3 ugovora za usluge i 1 ugovor za nabavu opreme). U prvoj polovici 2013. godine pripremljena su i objavljena dva preostala natječajna za nabavu opreme za oba projekta, a u provedbi su u istom razdoblju bila dva ugovora za radove i pet ugovora za usluge (od čega su dva ugovora za usluge završila u lipnju 2013.).

U prvoj polovici 2013. godine za mjeru 1.1 ukupno je isplaćeno 2,90 milijuna eura što iznosi 6,92% dodijeljenih sredstava. U istom razdoblju ovjereno je 2,46 milijuna eura što iznosi 5,87% dodijeljenih sredstava. Za Prioritetnu os 1, Mjeru 1.2, nastavljena je provedba ugovora o uslugama za pripremu projektne dokumentacije za sanaciju visokoonečišćene lokacije jame Sovjak (ukupne vrijednosti 0,54 milijuna eura). Za ovu mjeru nije bilo plaćanja u prvoj polovici 2013.

U području **Prioritetne osi 2** gospodarenja vodama, u izvještajnom razdoblju za Prioritetnu os 2\_ upravljanje vodama, za tri projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture zaključeni su svi predviđeni ugovori te je provedba projekata u završnoj fazi. Riječ je o sljedećim projektima:

- Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavenskog Broda (projekt vrijednosti 29,65 milijuna eura, provodi se kroz 4 ugovora - dva ugovora za radove, ugovor za usluge i ugovor za nabavu opreme);
- Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina (projekt vrijednosti 15,68 milijuna eura, provodi se kroz 5 ugovora - dva ugovora za radove, dva ugovora za usluge i ugovor za nabavu opreme);
- Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Drniša (projekt vrijednosti 6,45 milijuna eura, provodi se kroz 4 ugovora - dva ugovora za radove, ugovor za usluge i ugovor za nabavu opreme).

Projekt Program za otpadne vode Sisak (ukupne vrijednosti 32,71 milijuna eura) će se provoditi kroz pet ugovora (3 ugovora za radove, ugovor za usluge i ugovor za nabavu opreme), od kojih su zaključena tri ugovora (za radove, usluge i nabavu opreme), jedan ugovor za radove je u fazi zaključivanja, a za preostali ugovor za radove u tijeku je natječajni postupak.

Za projekt Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama zaključena su 2 ugovora za usluge. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 7,40 milijuna eura u okviru kojeg će biti pripremljena dokumentacija za daljnjih 16 infrastrukturnih projekata koji će biti predloženi za financiranje iz strukturnih fondova u idućem programskom razdoblju.

U lipnju 2013. godine Odlukom Europske komisije odobreno je sufinanciranje 2 projekta:

- Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča (ukupno procijenjene vrijednosti 67,2 milijuna eura);

- Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku (ukupno procijenjene vrijednosti 72,5 milijuna eura).

U prvoj polovici 2013. godine za Prioritetnu os 2 ugovoreno je 10,58 milijuna eura što predstavlja 12,18 % dodijeljenih sredstava, plaćeno je ukupno 5,53 milijuna eura što iznosi 6,37% dodijeljenih sredstava, a ovjereno je 7,15 milijuna eura što iznosi 8,23 % dodijeljenih sredstava.

U pogledu **Prioritetne osi 3** tehničke pomoći, u izvještajnom razdoblju potpisan je ugovor o uslugama, Tehnička pomoć za upravljanje IPA/SF Operativnim programom, namijenjen jačanju administrativnog kapaciteta u provedbi tranzicije iz IPA u SF provedbeni modalitet, te je pripremljen i objavljen natječaj za ugovor za nabavu opreme. U prvoj polovici 2013. godine ugovoreno je 1,09 milijuna eura što iznosi 52,66% dodijeljenih sredstava, a plaćeno je i ovjereno ukupno 0,03 milijuna eura što iznosi 1,45% dodijeljenih sredstava.

**Tablica 38: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	PO 1		PO 2	PO 3	UKUPNO
	M 1.1	M 1.2	M 2.1 i 2.2	M 3.1	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	41,91	0,47	86,84	2,07	131,29
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	45,14	0,46	36,62	1,92	84,14
UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	107,70%	97,87%	42,17%	92,75%	64,09%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	52,25				52,25
UKUPNO PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	8,68	0,27	19,58	0,82	29,35
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	19,23%	58,70%	53,47%	42,71%	34,88%
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	20,71%	57,45%	22,55%	39,61%	22,36%
UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	39,80%				39,80%
UKUPNO OVJERENO	13,31	0,27	26,54	0,82	59,18*
UKUPNO OVJERENO/ UKUPNO UGOVORENO	29,49%	58,70%	72,47%	42,71%	48,66%
UKUPNO OVJERENO/ UKUPNO DODIJELJENO	31,76%	57,45%	30,56%	39,61%	31,18%

\* Uključen avans 1 u iznosu 16,05 milijuna eura i avans 2 u iznosu 2,46 milijuna eura

Prioritetna os 1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj

Mjera 1.1.: Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini

Mjera 1.2.: Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom (crne točke)

Prioritetna os 2: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama


Mjera 2.1.: Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža

Mjera 2.2.: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za otpadne vode iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže

Prioritetna os 3: Tehnička pomoć

Mjera 3.1.: Upravljanje programom

**Grafikon 13: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

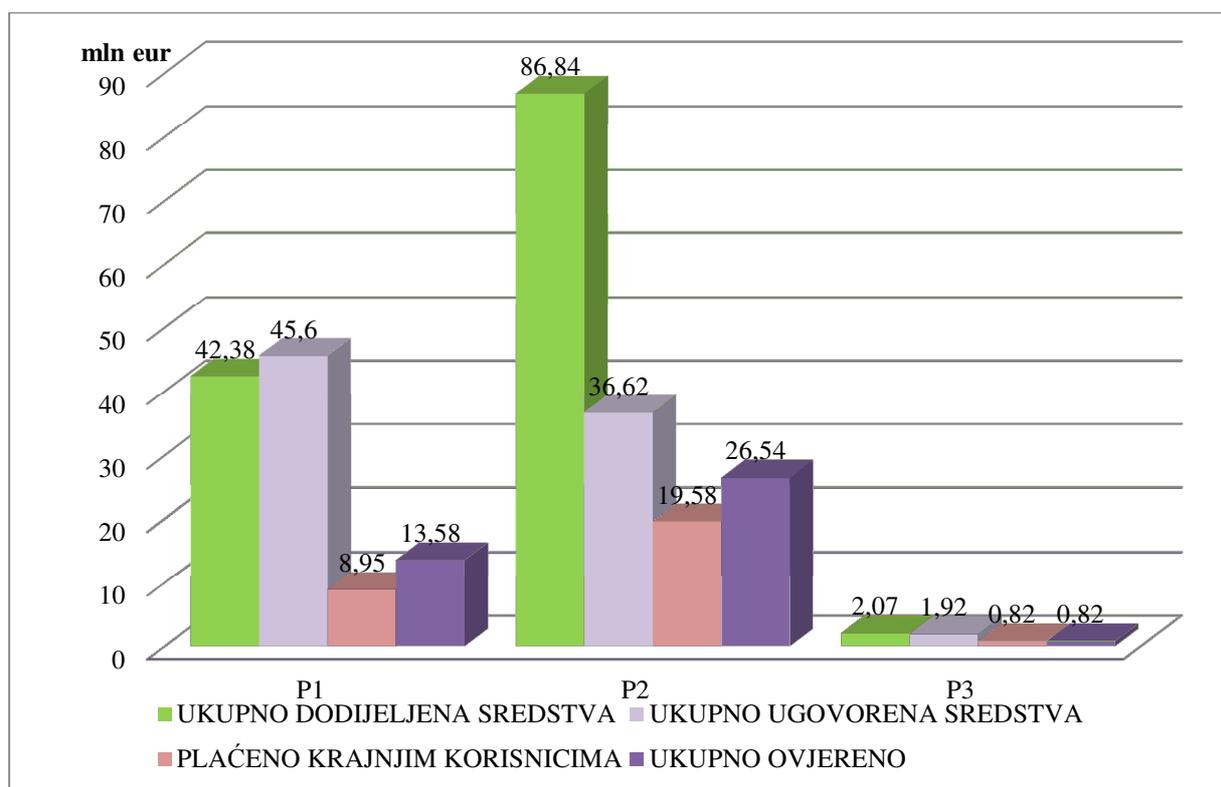

U području **Prioritetne osi 1** koja se odnosi na gospodarenje otpadom, u Mjeri 1.1, za projekte ŽCGO Marišćina i ŽCGO Kaštijun ukupno je dosad sklopljeno 8 ugovora (2 za radove, 6 za usluge), od čega su s provedbom završila 3 ugovora za usluge. Za mjeru 1.2 sklopljen je ugovor za usluge koji će završiti krajem ove godine. Dosad je ugovoreno 45,14 milijuna eura, odnosno 107,70% od dodijeljenih sredstava. Isplaćeno je 8,68 milijuna eura, što iznosi 19,23% od ugovorenih, odnosno 20,71 % od dodijeljenih sredstava. Ovjereno je 13,31 milijun eura, odnosno 29,49 % od ugovorenog i 31,76% od dodijeljenog iznosa.

Razlika između dodijeljenog i ugovorenog za Prioritetne osi 1, mjera 1.1, nastala je krajem 2012. godine, nakon što je Europska komisija donijela odluku o izmjeni financijskih odluka za projekte ŽCGO Marišćina i ŽCGO Kaštijun, čime se povećala stopa EU sufinanciranja. Nakon odobrenja nove financijske alokacije iz Kohezijskog fonda za drugu polovicu 2013. godine za Operativni program „Okoliš“, iznos dodijeljenih sredstava za mjeru 1.1. bit će viši od ugovorenih iznosa.

Za Mjeru 1.2 ugovoreno je 0,46 milijuna eura, što iznosi 97,87% dodijeljenih sredstava. Isplaćeno je 0,27 milijuna eura, što iznosi 58,70% od ugovorenog i 57,45% od dodijeljenog iznosa. Ukupni ovjereni iznos za Mjeru 1.2 je 0,27 milijuna eura.

U području **Prioritetne osi 2** koja se odnosi na gospodarenje vodama, za četiri infrastrukturna projekta sklopljeno je 16 ugovora (7 radova, 4 nabave opreme i 5 usluge) od čega su 4 ugovora završena (3 za nabavu opreme i 1 za usluge). Za pripremu projekata su sklopljena dva ugovora za usluge. Ugovoreno je 36,62 milijuna eura odnosno 42,17% dodijeljenih sredstava, plaćeno je 19,58 milijuna eura što iznosi 53,47% ugovorenih odnosno 22,55% dodijeljenih sredstava. Ovjereno je 26,54 milijun eura što iznosi 72,47 % ugovorenog odnosno 30,56% dodijeljenog.

U pogledu Prioritetne osi 3 Tehnička pomoć, dosad je sklopljeno ukupno pet ugovora za usluge, od čega su 4 ugovora završila s provedbom. Ugovoreno je 1,92 milijuna eura odnosno 92,75% dodijeljenih sredstava. Isplaćeno je 0,82 milijuna eura, što iznosi 42,71% od ugovorenih, odnosno 39,61% od dodijeljenih sredstava, a cjelokupan iznos je i ovjeren.

### **3.3.3. Komponenta III C programa IPA – Regionalni razvoj: Operativni program „Regionalna konkurentnost“**

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa uključuje Ministarstvo gospodarstva, u svojstvu tijela zaduženog za Operativni program (do 21. lipnja 2013.) i nadležnog za Prioritetnu os 3, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu tijela zaduženog za Operativni program (od 22. lipnja 2013.) i nadležnog za Prioritetnu os 1, Ministarstvo poduzetništva i obrta te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao tijela nadležnih za Prioritetnu os 2 te Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u svojstvu provedbenog tijela.

Promjena u sustavu provedbe komponente IIIC programa IPA izvršena je temeljem Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA), (Narodne novine, broj 76/2013) koja je stupila na snagu 22. lipnja 2013., kada je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od Ministarstva gospodarstva preuzelo ovlasti Tijela nadležnog za Operativni program „Regionalna konkurentnost“.

Dodijeljena IPA sredstva za Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za razdoblje 2007.- 2013. iznose 81,99 milijuna eura (u prethodnom izvještajnom razdoblju dodijeljena sredstva iznosila su 63,95 milijuna eura, a u predmetnom izvještajnom razdoblju povećana su do iznosa navedenog u Izmjenama Sporazuma o financiranju).

Od početka provedbe Operativnog programa do 30. lipnja 2013. godine, ukupno je ugovoreno 64,87 milijuna eura, što čini 79,12% dodijeljenih IPA sredstava, a ukupno je plaćeno 35,34 milijuna eura, odnosno 54,48% ugovorenih IPA sredstava. U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 18,20 milijuna eura, odnosno 22,20% dodijeljenih IPA sredstava, a isplaćeno 7,36 milijuna eura IPA sredstava što predstavlja 11,35% ukupno ugovorenih IPA sredstava.

Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za razdoblje 2007.- 2013. iznose 14,47 milijuna eura, a ugovoreno je 6,81 milijuna eura ili 47,06% od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja. Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2013. godine ukupno je isplaćeno 4,19 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja ili 61,53% od ukupno ugovorenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja.

U području **Prioritetne osi 1** Unapređenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja, u okviru prvog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava dodijeljeno je ukupno 5,28 milijuna eura. U ovom izvještajnom razdoblju je izvršen i posljednji od 6 potpisanih ugovora, dok je prethodnih 5 izvršeno u prethodnom izvještajnom razdoblju. U okviru drugog poziva dodjele bespovratnih sredstava potpisano je 19 ugovora (u prethodnom izvještajnom razdoblju) s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u ukupnom iznosu od 21,25 milijuna eura te je u ovom izvještajnom razdoblju s provedbom završilo 5 projekata. U pripremi je i natječajna dokumentacija za treći poziv dodjele bespovratnih sredstava jedinicama lokalne i

područne (regionalne) samouprave, a predviđena sredstva iznose 9,41 milijuna eura. U predmetnom izvještajnom razdoblju započela je faza ocjenjivanja i odabira projekata.

U području **Prioritetne osi 2** Jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, u provedbi su ugovori o pružanju usluga za:

- Pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzetnicima – faza II (ugovor je potpisan u predmetnom izvještajnom razdoblju);
- Tehnička pomoć za potporu jačanja konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetništva (ugovor je potpisan u predmetnom izvještajnom razdoblju);
- Program poboljšanja poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja - faza II;
- Poboljšanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice BIZIPACT – faza II;
- Jačanje konkurentnosti hrvatskih obrta korištenjem informacijsko-telekomunikacijske tehnologije;

dok su završeni ugovori o pružanju usluga za:

- Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini;
- Podrška razvoju klastera;
- Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja.

U svrhu pružanja potpore za povećanje konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika - faza I, dodijeljeno je bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 4,46 milijuna eura, te je potpisano 48 ugovora.

U području transfera tehnologije i usluge podrške trgovačkim društvima utemeljenim na znanju, potpisano je 19 ugovora dodjele bespovratnih sredstava sklopljenih sa sveučilištima i znanstvenim institutima u okviru Fonda za ulaganje u znanost i inovacije (u iznosu 11,16 milijuna eura). U tijeku je provedba dva ugovora o pružanju tehničke pomoći, i to za projekte Osiguravanje grafičkih procesora kao resursa u području naprednog računarstva te Tehnička pomoć - faza II (za pomoć u provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava).

Za veliki infrastrukturni projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti i komercijalizaciju tehnologija – BIOCentar, u provedbi su ugovori za izgradnju, nadzor radova i ugovor tehničke pomoći u ukupnom iznosu od 8,43 milijuna eura, dok je javni natječaj za nabavu opreme objavljen 26. lipnja 2013. godine.

U dijelu Operativnog programa koji se odnosi na **Prioritetnu os 3** odnosno Tehničku pomoć Operativnoj strukturi za provedbu i upravljanje Operativnim programom, završila je provedba prve faze projekata tehničke pomoći. U provedbi je nastavak Projekta tehničke pomoći Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom i Projekt pripreme budućih programskih dokumenata i zalihe projekata, dok je projekt Nabava informatičke opreme za tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom završen.

**Tablica 39: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa "Regionalna konkurentnost" u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	PO 1	PO 2		PO 3	UKUPNO
	M 1.1.	M 2.1.	M 2.2.	M 3.1.	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	27,73	23,91	22,76	7,59	81,99
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	19,66	21,84	19,45	3,92	64,87
UGOVORENA SREDSTVA	0,00	9,03	9,17	0	18,2
UGOVORENO/ UKUPNO DODIJELJENO	0,00%	37,77%	40,29%	0,00%	22,20%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	11,93				11,93
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	1,79	0,71	4,72	0,14	7,36
PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO	9,10%	3,23%	24,27%	3,57%	11,35%
PLAĆENO /UKUPNO DODIJELJENO	6,46%	2,97%	20,74%	1,84%	8,98%
DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	14,55%				14,55%
OVJERENO	4,35	0,64	0,88	0,14	6,01
OVJERENO/UKUPNO UGOVORENO	22,13%	2,93%	4,52%	3,57%	9,26%
OVJERENO/ /UKUPNO DODIJELJENO	15,69%	2,68%	3,87%	1,84%	7,33%

Prioritetna os 1. - Unapređenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja  
Mjera 1.1.: Poslovna infrastruktura  
Prioritetna os 2. - Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva  
Mjera 2.1.: Poboljšanje poslovne klime

Mjera 2.2 - Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju  
Prioritetna os 3. - Tehnička pomoć  
Mjera 3.1 - Tehnička pomoć za upravljanje Operativnim programom

**Tablica 40: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa "Regionalna konkurentnost" od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**


	PO 1	PO 2		PO 3	UKUPNO
	M 1.1.	M 2.1.	M 2.2.	M 3.1.	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	27,73	23,91	22,76	7,59	81,99
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	19,66	21,84	19,45	3,92	64,87
UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	70,90%	91,34%	85,46%	51,65%	79,12%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	36,03				36,03
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	14,31	10,56	8,47	2	35,34
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	72,79%	48,35%	43,55%	51,02%	54,48%
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	51,60%	44,17%	37,21%	26,35%	43,10%
UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	43,94%				43,94%
UKUPNO OVJERENO	8,94	10,49	4,84	2	38,67*
UKUPNO OVJERENO/ UKUPNO UGOVORENO	45,47%	48,03%	24,88%	51,02%	40,50%
UKUPNO OVJERENO/ UKUPNO DODIJELJENO	32,24%	43,87%	21,27%	26,35%	32,04%

\* Uključen avans 1 u iznosu 10,60 milijuna eura i avans 2 u iznosu 1,78 milijuna eura.


Prioritetna os 1. - Unapređenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja  
Mjera 1.1.: Poslovna infrastruktura  
Prioritetna os 2. - Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva  
Mjera 2.1.: Poboljšanje poslovne klime

Mjera 2.2 - Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju  
Prioritetna os 3. - Tehnička pomoć ,  
Mjera 3.1 - Tehnička pomoć za upravljanje Operativnim programom

Grafikon 14: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa “Regionalna konkurentnost“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)

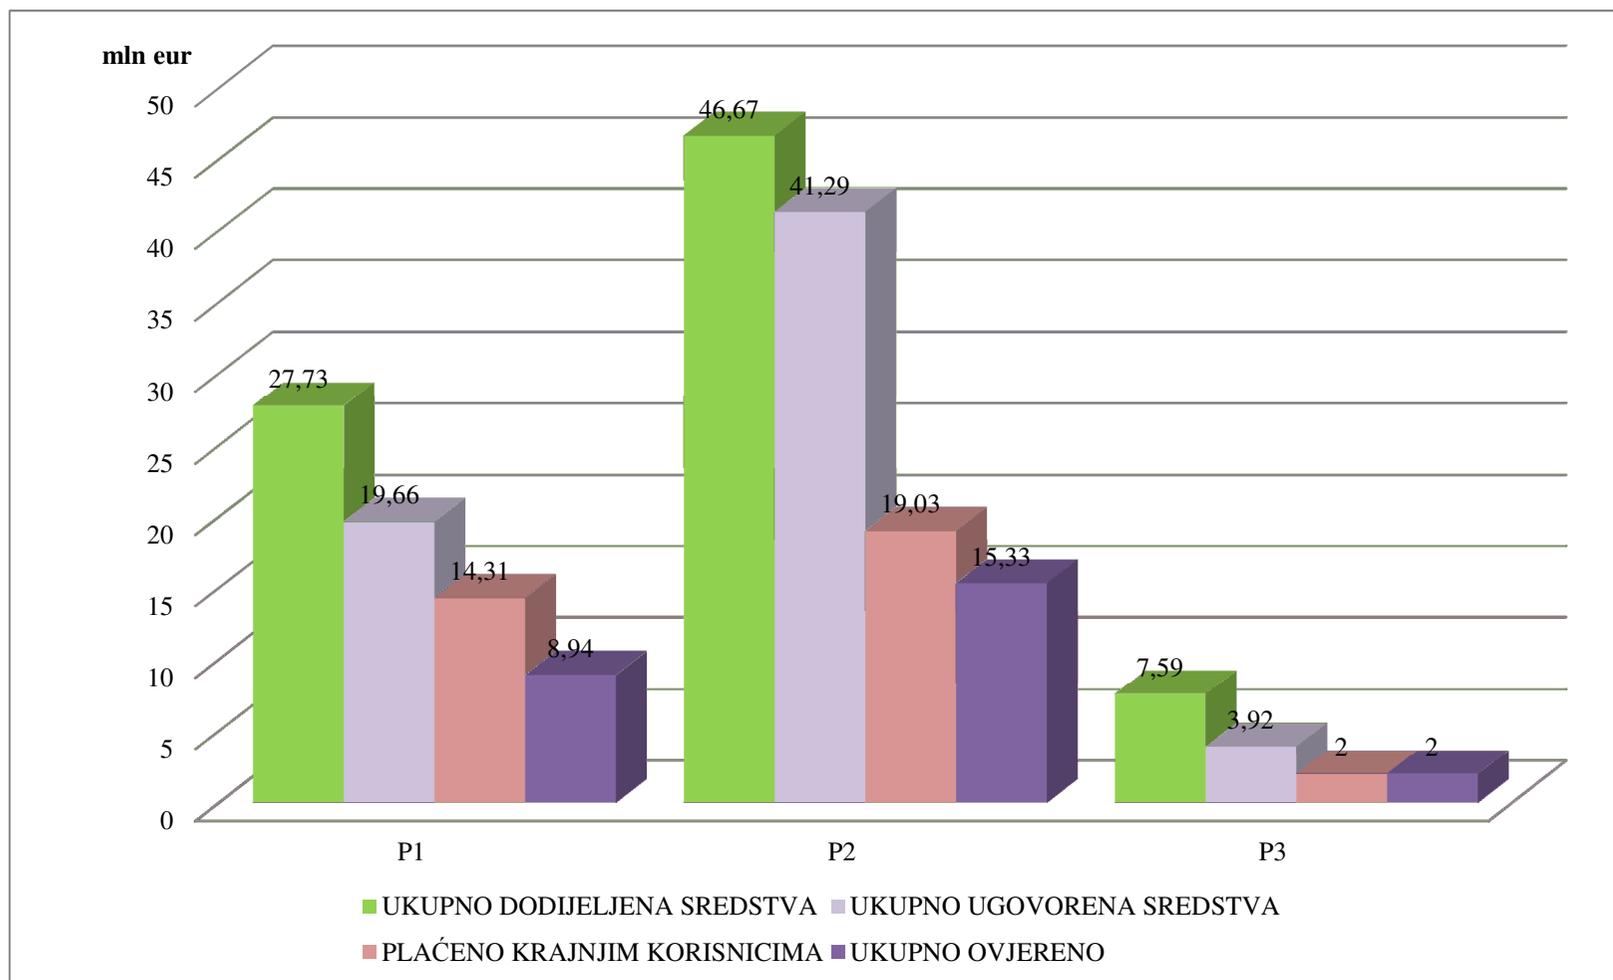

Grafikon 15: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Operativnog programa “Regionalna konkurentnost“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013.

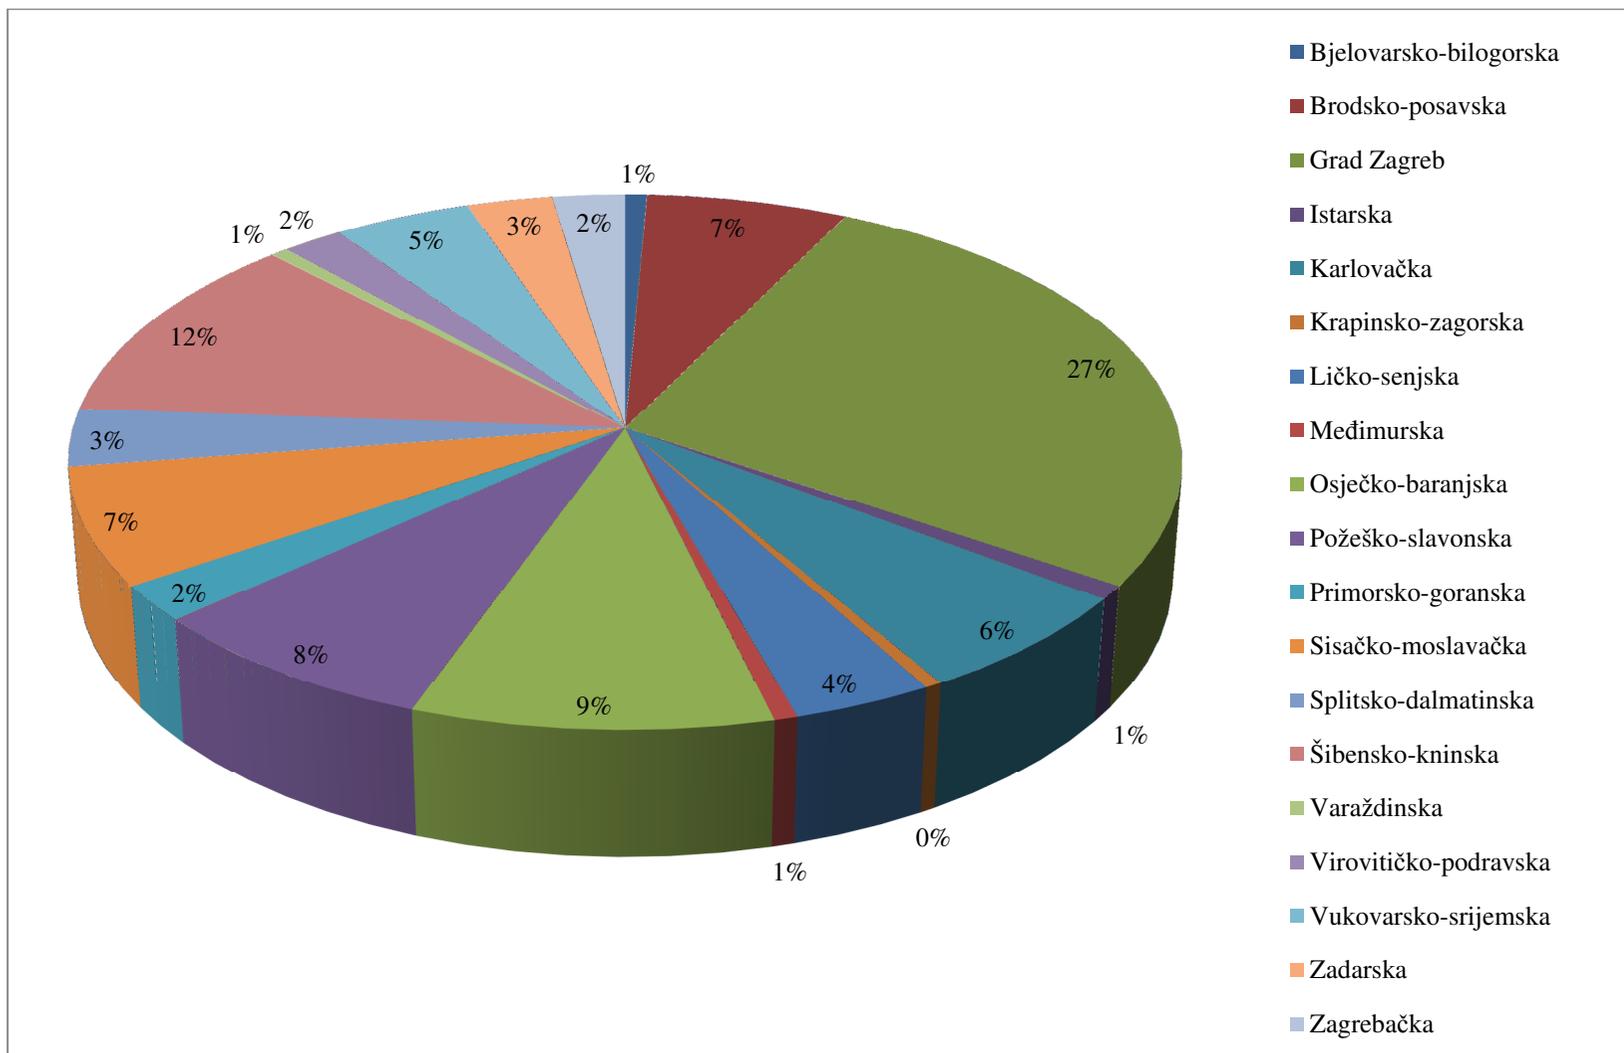

### **3.4. KOMPONENTA IV PROGRAMA IPA – RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA**

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog Operativnog programa uključuje: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u svojstvu tijela nadležnog za Operativni program i tijela nadležnog za prioritet/mjeru u području zapošljavanja i tržišta rada, socijalnog dijaloga i tehničke pomoći, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u svojstvu tijela nadležnog za prioritet/mjeru u području obrazovanja, Ministarstvo socijalne politike i mladih u svojstvu tijela nadležnog za prioritet/mjeru u području socijalne uključenosti, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u svojstvu tijela nadležnog za prioritet/mjeru u području razvoja civilnog društva, te Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva u svojstvu provedbenih tijela.

Ova komponenta uključuje mjere koje unaprjeđuju sustavne i administrativne kapacitete na području obrazovanja, zapošljavanja i socijalne uključenosti skupina i pojedinaca u nepovoljnom položaju te potiču umrežavanje s partnerima iz nevladinog sektora.

Korisnici bespovratnih sredstava dolaze iz privatnog, civilnog i javnog sektora te uključuju trgovačka društva, poduzetnike, lokalne i područne razvojne agencije, pučka učilišta, obrazovne ustanove i druge javne ustanove, udruge građana, socijalne partnere i druge organizacije civilnoga društva, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave te tijela državne uprave.

Dodijeljena IPA sredstva za Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ za razdoblje 2007.- 2013. iznose 94,42 milijuna eura. Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2012. godine ugovoreno je 56,17 milijuna eura, odnosno 59,49% dodijeljenih sredstava za razdoblje 2007.-2013. Ukupno je isplaćeno korisnicima 39,90 milijuna eura ili 71,03 % ugovorenog iznosa.

**Tablica 41: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente IV programa IPA u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	PO 1		PO 2			PO 3			PO 4		PO 5		UKUPNO
	M 1.1.	M 1.2.	M 2.1.	M 2.2.	M 2.3.	M 3.1.	M 3.2.	M 3.3.	M 4.1.	M 4.2.	M 5.1.	M 5.2.	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	19,44	5,64	12,10	7,81	5,00	20,53	6,95	4,64	2,37	6,96	0,66	2,32	94,42
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	13,39	2,75	8,49	1,97	2,01	15,71	4,14	1,98	0,46	5,27	0,00	0,00	56,17
UGOVORENA SREDSTVA	5,70	0,79	1,04	0,00	0,83	3,55	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	13,00
UGOVORENA/UKUPNO DODIJELJENO	29,32 %	14,00 %	8,60 %	0,00 %	16,60 %	17,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	15,66 %	0,00 %	0,00 %	13,77%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	6,96												6,96
PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	2,02	0,78	0,87	0,07	0,26	0,87	0,20	0,27	0,04	0,51	0,00	0,00	5,89
PLAĆENO/UKUPNO UGOVORENO	15,08 %	28,36 %	10,25 %	3,55 %	12,94 %	5,54 %	4,83 %	13,64 %	8,70 %	9,68 %	0,00 %	0,00 %	10,49%
PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	10,39 %	13,83 %	7,19 %	0,90 %	5,20 %	4,24 %	2,88 %	5,82 %	1,69 %	7,33 %	0,00 %	0,00 %	6,24%
DOZNAČENO/UKUPNO DODIJELJENO	7,37%												7,37%
OVJERENO	2,50	0,78	2,73	0,06	0,13	1,36	0,11	0,27	0,04	0,51	0,00	0,00	8,49
OVJERENO/UKUPNO UGOVORENO	18,67 %	28,36 %	32,16 %	3,05 %	6,47 %	8,66 %	2,66 %	13,64 %	8,70 %	9,68 %	0,00 %	0,00 %	15,11%
OVJERENO/UKUPNO DODIJELJENO	12,87 %	13,83 %	22,56 %	0,77 %	2,60 %	6,62 %	1,58 %	5,82 %	1,69 %	7,33 %	0,00 %	0,00 %	8,99%

Prioritetna os 1: Pобољшanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada

Mjera 1.1.: Podrška u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike tržišta rada

Mjera 1.2.: Podrška učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje

Prioritetna os 2: Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada

Mjera 2.1.: Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju

Mjera 2.2.: Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu obrazovanju

Mjera 2.3.: Razvoj socijalnih usluga radi unaprjeđenja mogućnosti zapošljavanja

Prioritetna os 3: Unaprjeđivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Mjera 3.1.: Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Mjera 3.2.: Jačanje sustava obrazovanja odraslih

Mjera 3.3.: Podrška kvaliteti i učinkovitosti ustanova nadležnih za osmišljavanje politika i obrazovanje i osposobljavanje

Prioritetna os 4: Tehnička pomoć

Mjera 4.1.: Priprema projekata

Mjera 4.2.: Upravljanje Operativnim programom i izgradnja sposobnosti

Prioritetna os 5: Jačanje uloge civilnog društva radi boljeg upravljanja

Mjera 5.1.: Promicanje socijalnog dijaloga

Mjera 5.2.: Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj

**Tablica 42: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente IV programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	PO 1		PO 2			PO 3			PO 4		PO 5		UKUP NO
	M 1.1.	M 1.2.	M 2.1.	M 2.2.	M 2.3.	M 3.1.	M 3.2.	M 3.3.	M 4.1.	M 4.2.	M 5.1.	M 5.2.	
DODIJELJENA SREDSTVA	19,44	5,64	12,10	7,81	5,00	20,53	6,95	4,64	2,37	6,96	0,66	2,32	94,42
UGOVORENA SREDSTVA	13,39	2,75	8,49	1,97	2,01	15,71	4,14	1,98	0,46	5,27	0,00	0,00	56,17
UGOVORENO / DODIJELJENO (postotak)	68,89 %	48,75 %	70,16 %	25,22 %	40,20 %	76,52 %	59,56 %	42,67 %	19,41 %	75,72 %	0,00 %	0,00 %	59,49%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	40,08												40,08
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	8,34	2,04	7,35	1,85	0,26	10,86	3,76	1,25	0,31	3,88	0,00	0,00	39,90
PLAĆENO/ UGOVORENO (postotak)	62,29 %	74,12 %	86,57 %	93,90 %	12,94 %	69,13 %	90,82 %	63,13 %	67,39 %	73,62 %	0,00 %	0,00 %	71,03%
PLAĆENO/DODIJE LJENO (postotak)	42,90 %	36,17 %	60,74 %	23,69 %	5,20 %	52,90 %	54,10 %	26,94 %	13,08 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %	42,26%
DOZNAČENO/ DODIJELJENO (postotak)	42,45%												42,45 %
OVJERENO	5,33	2,04	5,99	1,83	0,13	8,28	3,58	1,25	0,31	3,88	0,00	0,00	44,75*
OVJERENO / UGOVORENO (postotak)	39,81 %	74,18 %	70,55 %	92,89 %	6,47 %	52,71 %	86,47 %	63,13 %	67,39 %	73,62 %	0,00 %	0,00 %	58,07%
OVJERENO / DODIJELJENO (postotak)	27,42 %	36,17 %	49,50 %	23,43 %	2,60 %	40,33 %	51,51 %	26,94 %	13,08 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %	34,55%

\* Uključen avans 1 u iznosu 11,48 milijuna eura i avans 2 u iznosu od 2,65 milijuna eura

Prioritetna os 1: Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada

Mjera 1.1.: Podrška u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike tržišta rada

Mjera 1.2.: Podrška učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje

Prioritetna os 2: Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada

Mjera 2.1.: Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju

Mjera 2.2.: Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu obrazovanju

Mjera 2.3.: Razvoj socijalnih usluga radi unaprjeđenja mogućnosti zapošljavanja

Prioritetna os 3: Unaprjeđivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Mjera 3.1.: Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Mjera 3.2.: Jačanje sustava obrazovanja odraslih

Mjera 3.3.: Podrška kvaliteti i učinkovitosti ustanova nadležnih za osmišljavanje politika i obrazovanje i osposobljavanje

Prioritetna os 4: Tehnička pomoć

Mjera 4.1.: Priprema projekata


Mjera 4.2.: Upravljanje Operativnim programom i izgradnja sposobnosti

Prioritetna os 5: Jačanje uloge civilnog društva radi boljeg upravljanja

Mjera 5.1.: Promicanje socijalnog dijaloga

Mjera 5.2.: Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj

Grafikon 16: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala" od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)

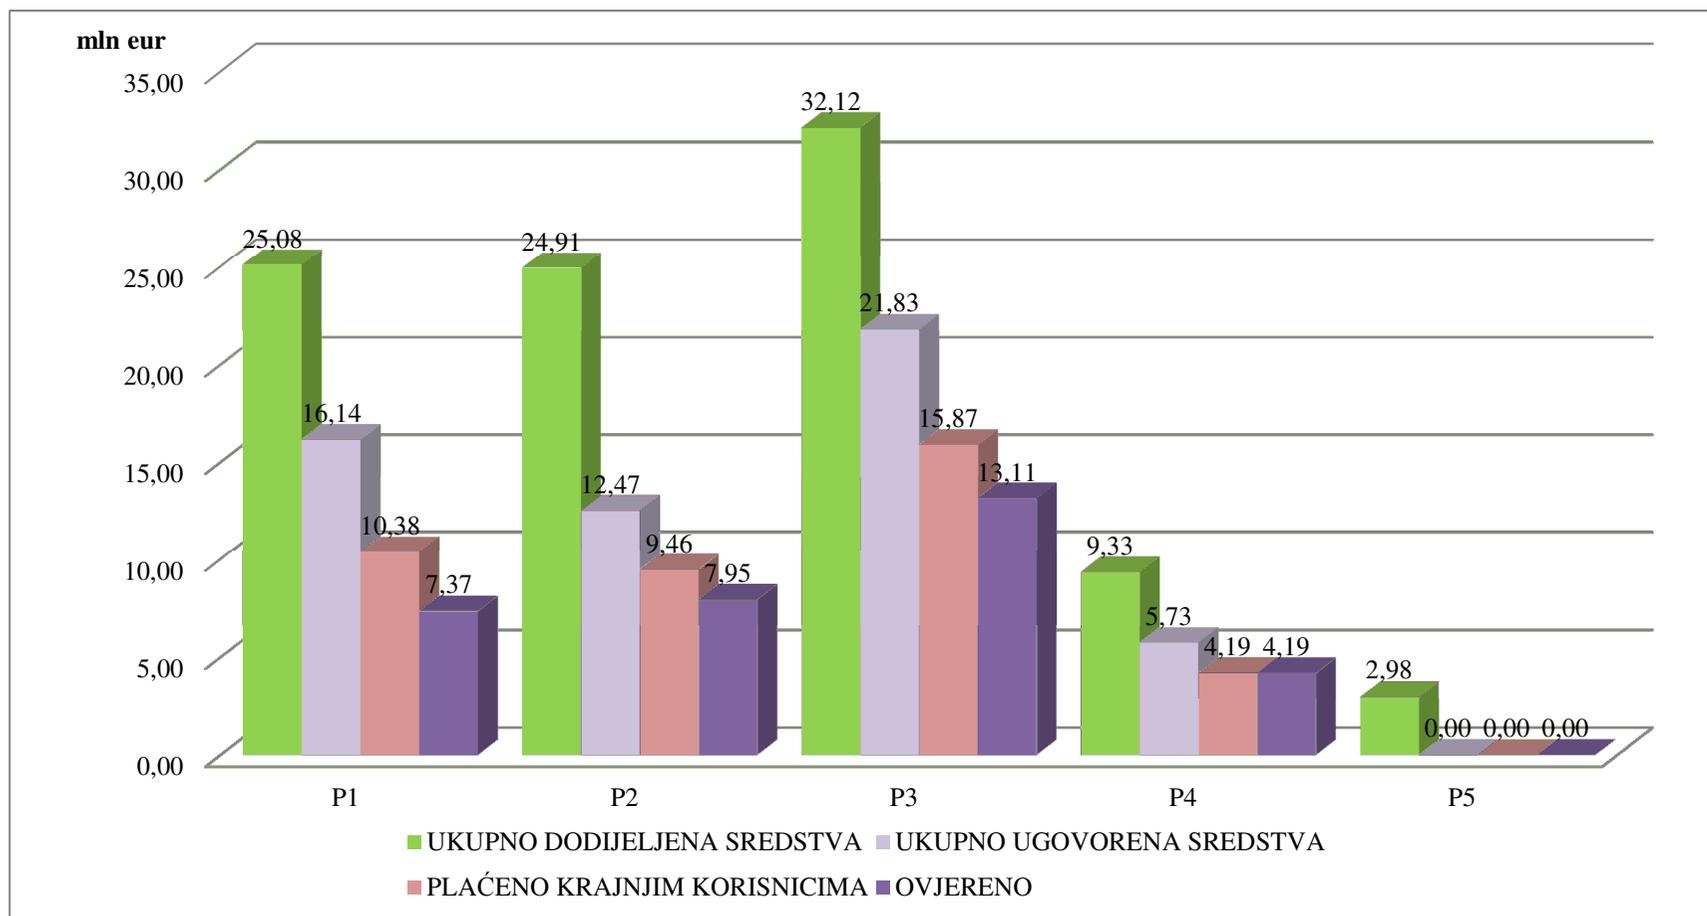

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, ugovoreno je 6 novih operacija<sup>13</sup> u vrijednosti od 13,00 milijuna eura. Ujedno, trenutno je u provedbi 12 operacija od kojih je 5 ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava, 3 ugovora o uslugama, 2 ugovora o nabavi roba te 2 ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost ugovora u provedbi je 17,32 milijuna eura.

Krajnjim korisnicima je plaćeno 5,89 milijuna eura što iznosi 10,49 % u odnosu na ugovorena sredstva, dok je od Europske komisije zatraženo 8,49 milijuna eura. Do 30. lipnja 2013. godine Europska komisija je na račun Nacionalnog fonda uplatila 6,96 milijuna eura.

Kumulativno, od početka programskog razdoblja od ukupno dodijeljenih 94,42 milijuna eura IPA sredstava ukupno je ugovoreno 39 operacija u vrijednosti od 56,17 milijuna eura, što iznosi 59,49% dodijeljenih sredstava. Također, završena je provedba 26 operacija u vrijednosti od 31,94 milijuna eura, a korisnicima je plaćeno 39,90 milijuna eura što čini 71,03% u odnosu na ugovorena sredstva. Na račun Nacionalnog fonda uplaćeno je ukupno 40,08 milijuna eura od strane Europske komisije što je 42,45% u odnosu na dodijeljena sredstva. U prvoj polovici 2013. godine objavljeno je 5 natječaja u vrijednosti od 6,65 milijuna eura.

U pogledu kumulativno postignutih rezultata zaključno s 30. lipnjem 2013. godine, a glede provedbe projekta usmjerenih na poboljšavanja **pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada**, pružena je podrška postojećim Lokalnim partnerstvima za zapošljavanje (LPZ) te su uspostavljena nova LPZ (ukupno 21 LPZ u svim županijama u Republici Hrvatskoj), koja uključuju sve relevantne dionike na lokalnom tržištu rada (uključujući obrazovni, javni i poslovni sektor) te predstavljaju forum za donošenje odluka relevantnih dionika za funkcioniranje tržišta rada. Također, usvojena je 21 Strategija razvoja ljudskih potencijala na regionalnoj razini, a ukupno 2.435 krajnjih korisnika sudjelovalo je u projektnim aktivnostima. Usvojeno je 8 Akcijskih planova za zapošljavanje mladih, razvijene su nove usluge za nezaposlene mlade osobe te su otvorena 2 pilot Poslovna kluba koja omogućuju umrežavanje mladih s ciljem povećanja njihove zapošljivosti. Do sada je ukupno 1.797 mladih sudjelovalo na različitim treninzima i radionicama u okviru provedbe projekata usmjerenih na poboljšanje pristupa tržištu rada za mlade. Ukupno 4.232 osobe su sudjelovale u različitim programima osposobljavanja, obuke, usavršavanja i slično. U okviru ukupnog broja od 4.232 sudionika, njih 75 su osobe s invaliditetom, 321 nezaposlene osobe iznad 50 godina starosti, 1.547 žene primarne dobi te 1.936 dugotrajno nezaposlene osobe.

Kroz projekte usmjerene na nove pristupe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pružanju usluga korisnicima i podrška cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju, provedene su aktivnosti uspostave centara za pružanje usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, uspostave novih procesa poslovanja s informatičkom podrškom kao što su info-kiosci. Nadalje, 49 stručnjaka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje se usavršilo za pružanje novih odnosno unaprijeđenih usluga korisnicima.

U izvještajnom razdoblju, a u cilju osiguranja održivosti, objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava te se očekuje početak provedbe projekata lokalnih inicijativa za zapošljavanje usmjerenih na jačanje dionika lokalnog tržišta rada u razvoju i provedbi aktivnih mjera politike tržišta rada i jačanje kapaciteta uspostavljenih lokalnih partnerstva za zapošljavanje.

---

<sup>13</sup> Operacija u sklopu određene mjere odnosno prioritetne osi obuhvaća dodjelu bespovratnih sredstava većem broju korisnika, odnosno uključuje potpisivanje većeg broja ugovora i financiranje većeg broja projekata putem jednog natječaja.

Također, u prvoj polovici 2013. godine nastavila se provedba projekata usmjerenih ka nezaposlenim visokoobrazovanim osobama, koji sudjeluju u različitim vrstama usavršavanja kroz projekte usmjerene na poboljšanje pristupa održivom zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba. Kroz projekte u provedbi koji su usmjereni na integraciju nezaposlenih visokoobrazovanih osoba na tržište rada, pruža se podrška u vidu znanja, informacija i vještina za samozapošljavanje i pokretanja poslovne aktivnosti te podrške poslovanju u prvoj fazi, kao i ostalih znanja koje će povećati njihovu zapošljivost (razvoj tehničkih vještina kroz formalni i neformalni sustav obrazovanja, uspostavljanje Poslovnih klubova, pružanje usluga profesionalnog usmjeravanja, poslovnog podudaranja i posredovanja).

Također, u lipnju 2013. godine potpisani su sporazumi za izravne dodjele bespovratnih sredstava: Osposobljavanje za zapošljavanje radnika u višku i dugotrajno nezaposlenih u vrijednosti od 4,30 milijuna eura i Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u vrijednosti od 2,40 milijuna eura. U okviru prve izravne dodjele provode se mjere aktivne politike tržišta rada usmjerene prema dugotrajno nezaposlenima i onima u višku na tržištu rada kroz različite aktivnosti provođenja edukacija za ciljane skupine, provođenja analiza potreba poslodavaca, promicanje novih mjera za potencijalne korisnike i slično. Druga izravna dodjela se također odnosi na provedbu aktivne i preventivne politike tržišta rada od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kroz provedbu treninga za dugotrajno nezaposlene i radnike u višku kao i osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za mlade nezaposlene osobe bez radnog iskustva.

Zaključno s 30. lipnja 2013. godine, a nastavno na provedbu projekata **socijalnog uključivanja** osoba kojima je otežan pristup tržištu rada, educirana su ukupno 652 stručnjaka u sektoru zapošljavanja i socijalne skrbi. Razvijena su tri nova međuinstitucionalna/međusektorska poslovna procesa za rad sa socijalno ugroženim skupinama - Protokol o postupanju centra za socijalnu skrb i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o pružanju usluga dugotrajno nezaposlenim korisnicima pomoći za održavanje, nacionalni internetski portal "One-stop-shop" za pružanje usluga nezaposlenim osobama s invaliditetom i set novih metoda rada i praktičnih alata za Hrvatski zavod za zapošljavanje i centre za socijalnu skrb. Zaposlenici centara za socijalnu skrb i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osposobljeni su za pružanje usluga kroz nove metode rada sa ženama u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Djelatnici centara za socijalnu skrb dodatno su educirani za pružanje usluga socijalnog mentorstva dugotrajno nezaposlenim korisnicima socijalne pomoći.

Od ukupno 652 educirana stručnjaka, za korištenje novih metoda rada sa skupinama u nepovoljnom položaju osposobljeno je 213 stručnjaka, dok su ostale edukacije bile usmjerene na stjecanje znanja i vještina iz razvoja politika vezanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kreiranje i provedbu aktivnih mjera tržišta rada vezanih uz zapošljavanje osoba s invaliditetom ili edukacije u području ravnopravnosti spolova te promicanja i zapošljavanja socijalno ugroženih skupina.

Do sada je ukupno 4.590 osoba u nepovoljnom položaju bilo uključeno u programe usavršavanja, obrazovanja i sl. kroz različite projekte u području socijalne uključenosti, od čega 82% čine žene, 1.004 su korisnici socijalne skrbi (22%), a od toga je 34% starijih korisnika socijalne skrbi (stariji od 45 godina). Nadalje, 37% korisnika socijalne pomoći su predstavnici Roma ili drugih nacionalnih manjina.

Također, 41% svih sudionika projekta dobilo je diplomu/potvrdu o završetku programa, od čega je bilo 89% žena. Nadalje, 102 osobe s invaliditetom primile su usluge profesionalne rehabilitacije, što čini 17% od svih osoba s invaliditetom koje su bile uključene u projektne aktivnosti. 14% svih sudionika projekata pronašlo je neki oblik zapošljavanja unutar šest mjeseci nakon sudjelovanja u projektnim aktivnostima, od kojih su 82% žene, 18% osobe s invaliditetom, 65% dugotrajno nezaposleni, a 15% su pripadnici romske ili druge nacionalne manjine.

U izvještajnom razdoblju potpisano je ukupno 15 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz tri natječaja:

- Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina;
- Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici;
- Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina.

Krajem lipnja 2013. godine, objavljen je i natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom u vrijednosti od 1,40 milijuna eura.

Također, u prvoj polovici 2013. godine nastavila se provedba projekata širenja mreže socijalnih usluga u zajednici, u okviru koje se provode aktivnosti usmjerene na olakšavanje samostalnog života osoba u nepovoljnom položaju, pomaganje razvoja kompetencija potrebnih na tržištu rada i drugim područjima u životu kao i aktivnosti usmjerene prema obiteljima koje skrbe o ovisnim članovima odnosno pomaganje usklađivanja radne i obiteljske uloge, te povećanje ekonomske aktivnosti obitelji s ovisnim članovima, kao što su primjerice organiziranje pomoći u kući za starije osobe i osobe s invaliditetom, organiziranje i rad dnevnih boravaka ili klubova za osobe s invaliditetom itd.

U okviru pružanja podrške sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga, izrađena su dva glavna Izvješća o procjeni, prvo izvješće o provedenim aktivnostima vezanim uz deinstitucionalizaciju s naglaskom na socijalno planiranje (Izvješće o procjeni planiranja socijalnih usluga) i drugo izvješće o provedenim aktivnostima vezanim uz transformaciju domova socijalne skrbi u Hrvatskoj (Izvješće o procjeni transformacije i deinstitucionalizacije ustanova). Kroz projektne aktivnosti osnaživanja kapaciteta stručnjaka pri socijalnom planiranju i promicanju alternativnih oblika skrbi unutar zajednice ukupno je educirano 339 stručnjaka.

Provedbom projekata u sustavu **obrazovanja** zaključno s 30. lipnja 2013. godine postignuti su sljedeći rezultati: razvijeni su novi metodološki dokumenti i alati za potporu sustavu pri usklađivanju s tržištem rada (Metodologija za razvoj strukovnih standarda i kurikuluma, Priručnici za praćenje i evaluaciju novih kurikuluma u pilot školama i realizaciju inovacija u strukovnim školama, Nacionalni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju, Priručnik o andragoškim metodama poučavanja, Upute za izradu programa osposobljavanja i usavršavanja, Priručnik za praćenje i vrednovanje programa osposobljavanja i usavršavanja, Metodologija za razvoj složenih projekata za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih), izrađeno je 14 profila sektora i 26 strukovnih standarda zanimanja/kvalifikacija/kurikuluma, proveden je pilot-proces samovrjednovanja u 24 strukovne škole te je izrađen Priručnik za samovrjednovanje kao i pripadajući mrežni alat E-kvaliteta. Također, 200 sudionika sudjelovalo je u aktivnostima izobrazbe i daljnjeg razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, od kojih 49% čine partneri iz gospodarskog sektora i socijalni partneri.

Ukupno 525 stručnjaka je sudjelovalo u usavršavanju u području osiguranja kvalitete strukovnog obrazovanja. U području jačanja sustava obrazovanja odraslih, 2.724 odraslih polaznika je uspješno završilo nove/postojeće/prilagođene programe obrazovanja odraslih, od kojih je ukupno 1.404 žena i 1.320 muškaraca. Ukupno je 350 zaposlenika institucija za obrazovanje odraslih educirano u području razvoja metodologija za modernizaciju postojećih ili kreiranje novih kratkoročnih programa.

Nadalje, ojačani su ljudski kapaciteti za daljnju provedbu reformi u sustavu obrazovanja, 329 odgojno obrazovnih institucija sudjelovalo je u provedbi projekata, opremljeno je 9 institucija koje rade s učenicima s teškoćama, 89 institucija za obrazovanje odraslih uključeno je u aktivnosti jačanja kapaciteta, 205 strukovnih škola sudjelovalo je u dizajnu inovativnog strukovnog pristupa.

Ukupno je 5.656 osoba sudjelovalo u aktivnostima usavršavanja kroz provedbu projekata, 2.724 odraslih polaznika je osposobljeno, 1.729 osoba sudjelovalo je u aktivnostima u području obrazovanja učenika s teškoćama (1.210 muškaraca i 519 žena).

Unutar izvještajnog razdoblja, u području modernizacije školskih kurikuluma u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva provode se projekti usmjereni na uvođenje suvremenih i inovativnih sadržaja/obilježja u nastavu u strukovnim školama unutar postojećeg sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, uvođenje inovativnih obrazovnih programa kako bi se radilo na daljnjem povećanju kompetencija učenika strukovnih škola koje su im potrebne za tržište rada. U projektima sudjeluju škole koje provode nove sadržaje u strukovnim kurikulumima te se okviru projektnih aktivnosti provode stručna usavršavanja za nastavnike u školama. U provedbi je 30 ugovora bespovratnih sredstava, a ukupna vrijednost projekata iznosi više od 5,2 milijuna eura.


U lipnju 2013. godine potpisano je 16 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupnog iznosa 5,1 milijuna eura u okviru natječaja Daljnji razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, a čiji je cilj poduprijeti razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kroz razvoj i modernizaciju obrazovnog sustava i kvalifikacija u općem i visokom obrazovanju te kroz razvoj kurikuluma odnosno programa utemeljenih na ishodima učenja. U pripremi je potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru natječaja Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti sustav obrazovanja, čiji je cilj promicanje jednakih prilika u pristupu obrazovanju za skupine u nepovoljnom položaju.

Također kroz projekt Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, koji je u provedbi, provode se sljedeće aktivnosti: analiza postojećeg sustava stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje i potreba usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, izrada strategija stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika za razdoblje 2014.–2020. te razvoj poboljšanog sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika.

Unutar izvještajnog razdoblja u Prioritetnoj osi 5 koja se odnosi na **jačanje civilnoga društva**, objavljeni su natječaji za sljedeće programe dodjele bespovratnih sredstava:

- Jačanje socijalnog dijaloga;
- Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva;
- Podrška organizacijama civilnog društva u području zagovaranja i motivacije za socijalno isključene skupine;
- Podrška organizacijama civilnog društva aktivnih u području volonterstva na jačanju gospodarske i socijalne kohezije.

**Grafikon 17: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013.**

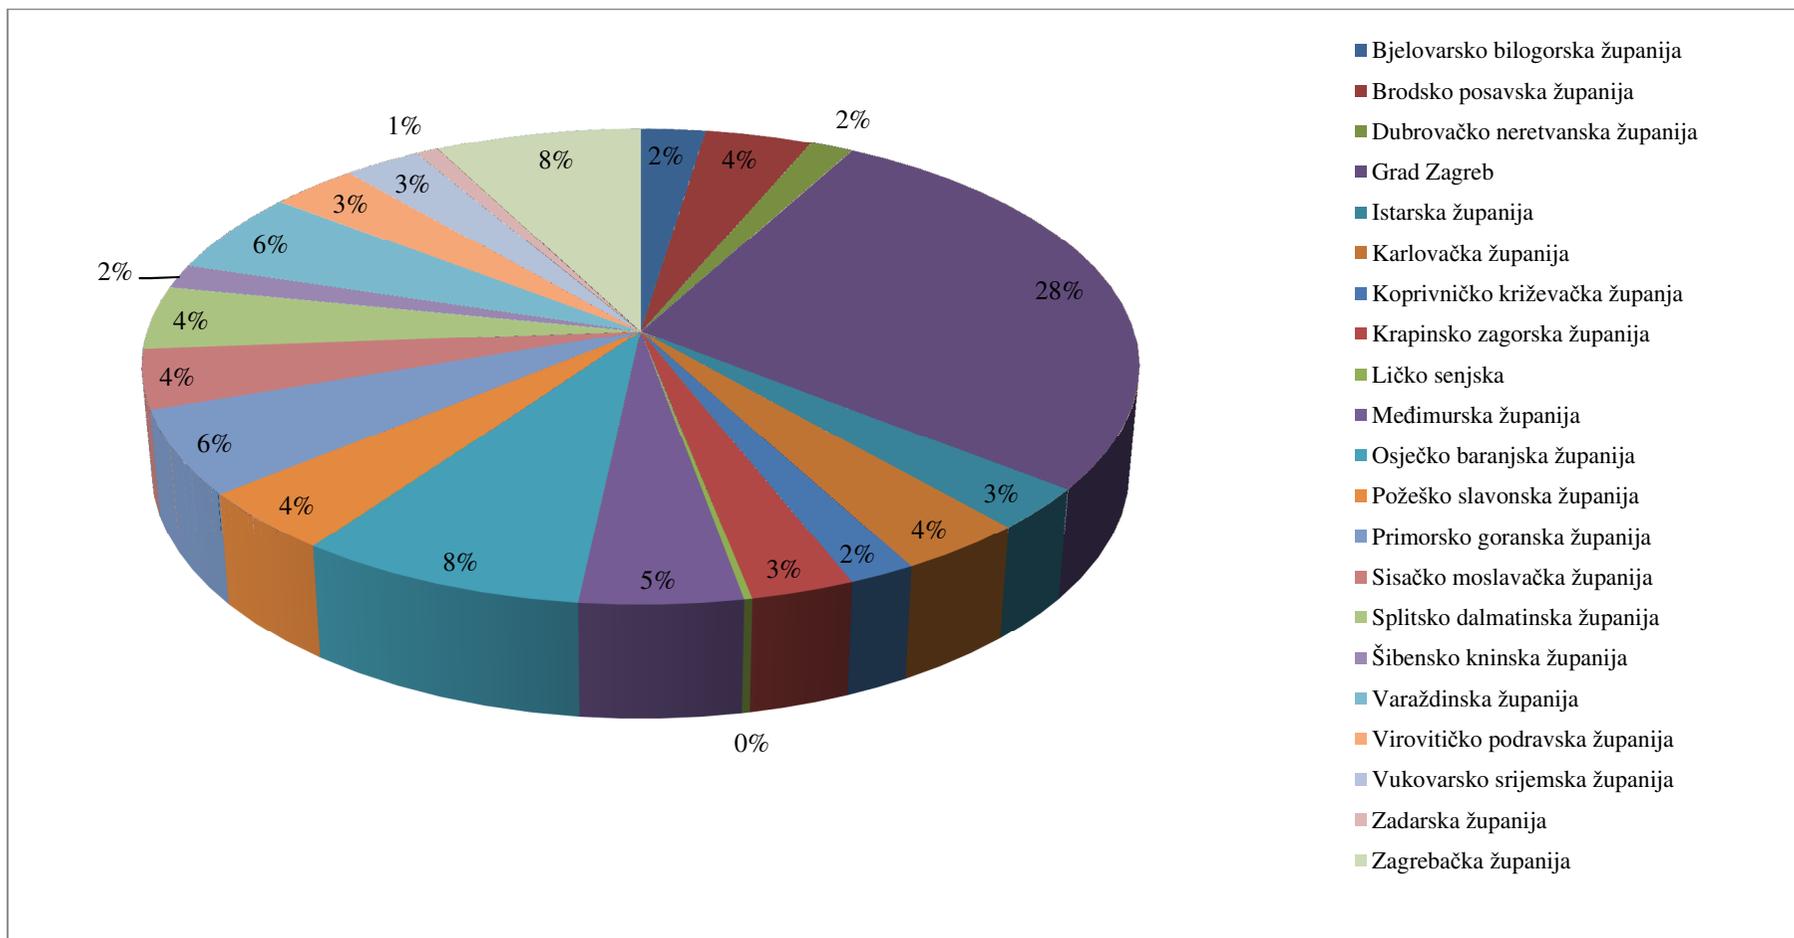

### 3.5. KOMPONENTA V PROGRAMA IPA – RURALNI RAZVOJ

Operativnu strukturu za provedbu ove komponente čine Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje Ministarstva poljoprivrede u svojstvu tijela odgovornog za komponentu V programa IPA, te Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u svojstvu provedbenog tijela.

IPARD programom definiraju se tri strateška prioriteta djelovanja, a za svako prioritetno područje definiran je po jedan specifični cilj, koji će se ostvarivati putem odgovarajućih mjera. Osim mjera unutar tri prioriteta, predviđena je i mjera 501 „Tehnička pomoć“. U svakoj mjeri definirani su sektori kojima se pruža potpora, unutar djelatnosti poljoprivrede i prerađivačke industrije, osnovne ruralne infrastrukture te ostalih gospodarskih djelatnosti odnosno aktivnosti unutar ruralnih područja Republike Hrvatske.

Potencijalni korisnici za dodjelu sredstava IPARD programa po mjerama su:

- u Mjeri 101 - poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba;
- u Mjeri 103 - obrti, trgovačka društva i zadruge, registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti i obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV):
  - a) u rangu mikro, malih ili srednjih poduzeća s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba;
  - b) u rangu poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili s godišnjim prometom koji ne prelazi 200 milijuna eura s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba;
- u Mjeri 202 - odabrani LAG<sup>14</sup>-ovi koji s Agencijom za plaćanja sklope Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a;
- u Mjeri 301 - jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi do 10.000 stanovnika);
- u Mjeri 302 - fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika u sustavu PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba.

U okviru Prioriteta 1, u javnim sredstvima Europska unija doprinosi sa 75%, a Republika Hrvatska s 25%. Doprinos korisnika u obje mjere (101, 103) iznosi do 50%. Za ulaganja u okviru Prioriteta 2, udio javnih sredstava u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi do 100%. U javnim sredstvima Europska unija doprinosi s 80%, a Republika Hrvatska s 20%. Za ulaganja u okviru Prioriteta 3, za Mjeru 302 do 50% prihvatljivog ulaganja plaća se iz javnih sredstava, a do 50% iz privatnih. Javna sredstva financiranja sastoje se od udjela Europske unije u iznosu od 75% i udjela Republike Hrvatske u iznosu od 25%. Za ulaganja u okviru Mjere 301 maksimalni intenzitet potpore je 100%, koji se sastoji od 75% sredstava Europske unije i 25% sredstava Republike Hrvatske. Provedbu Mjere 501 pokriva Europska unija u iznosu od 80% i Republika Hrvatska u iznosu od 20%.

Za komponentu V programa IPA ukupno je za razdoblje 2007.-2012. dodijeljeno 129,4 milijuna eura EU sredstava odnosno 172,5 milijuna eura ukupne potpore (EU i nacionalno

---

<sup>14</sup> Lokalna akcijska grupa

sufinanciranje)<sup>15</sup>. Od početka provedbe IPARD programa ukupno je objavljeno 18 natječaja za mjere 101, 103, 301, 302 i 202.

U predmetnom izvještajnom razdoblju Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala još tri IPARD natječaja (za mjeru 101, 103 i 202). Također je otvoren poziv za podnošenje prijava za mjeru 501 Tehnička pomoć, na koju je zaprimljeno 5 prijava, od čega su 4 ugovorene s iznosom potpore Europske unije u vrijednosti od 21,32 milijuna eura.

U Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do kraja izvještajnog razdoblja pristigle su ukupno 1.143 prijave, s ukupnim iznosom tražene potpore od 285,54 milijuna eura. Na dan 30. lipnja 2013. godine ukupno su ugovorena 292 projekta, završeno je i isplaćeno ukupno 99 projekata te su u obradi još 592 projekta, s ukupnim iznosom tražene potpore od 118,43 milijuna eura. Trenutno je, od ukupno 1.143 prijave, za mjeru 101 zaprimljeno 426 prijava, za mjeru 103 njih 124, za mjeru 202 njih 49, za mjeru 301 210 prijava, za mjeru 302 njih 329, a za mjeru 501 zaprimljeno je 5 prijava.

Ukupno su do 30. lipnja 2013. godine izvršena plaćanja za 99 projekata, u vrijednosti od 18,48 milijuna eura potpore Europske unije, uz sredstva nacionalnog sufinanciranja od 6,2 milijuna eura, a što ukupno iznosi 24,64 milijuna eura isplaćene potpore. Od ukupnog broja isplaćenih projekata, 20 projekata je ugovoreno u 2010. godini, 55 projekata u 2011. godini, a 24 projekata u 2012. godini.

Od početka provedbe ukupno su ugovorena 292 projekta u vrijednosti od 65,06 milijuna eura potpore Europske unije, što predstavlja značajan porast u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje odnosno na stanje dana 31. prosinca 2012. godine, kada je bio ugovoren ukupno 251 projekt, u vrijednosti od 56,47 milijuna eura potpore Europske unije.

U mjeri 101 najveći broj ugovora potpisan je u sektorima voća i povrća (85 ugovora), mesa (27 ugovora), a slijede ulaganja u sektor mlijeka (20 ugovora), jaja (9 ugovora) i sektor žitarica i uljarica (6 ugovora). Za 61 projekt izvršena je isplata sredstava, u ukupnom iznosu od 10,52 milijuna eura. Od toga iznosa iz IPA sredstava isplaćeno je 7,89 milijuna eura.

U mjeri 103 najveći broj ugovora potpisan je u sektoru voća i povrća (18 ugovora), sektoru ribarstva (13 ugovora), sektoru mesa (11 ugovora), vinarstva (7 ugovora) i mljekarstva (4 ugovora). Od svih ugovorenih projekata, za njih 22 je izvršena isplata sredstava u ukupnom iznosu od 12,17 milijuna eura. Od toga iznosa iz IPA sredstava isplaćeno je 9,13 milijuna eura.

U mjeri 302 najveći broj ugovorenih projekata je u sektoru ruralnog turizma (46 projekata), tradicijskih obrta i prerade na poljoprivrednim gospodarstvima (po 3 projekta) te po jedan projekt u sektoru slatkovodnog ribarstva i obnovljivih izvora energije. Od ukupno ugovorenih projekata, za njih 10 je izvršena isplata sredstava u ukupnom iznosu od 0,56 milijuna eura. Od toga iznosa iz IPA sredstava isplaćeno je 0,42 milijuna eura.

U mjeri 301 ugovorena su ukupno 34 projekta, u vrijednosti ugovorene EU potpore 11,11 milijuna eura. Najveći broj ugovora potpisan je u sektoru sustava kanalizacije i pročišćavanja

---


<sup>15</sup> Ukupno dodijeljena sredstva, sukladno na dan 30 lipnja 2013. važećem Zakonu o potvrđivanju sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje višegodišnji sporazum o financiranju 2007. – 2010., koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. lipnja 2012. godine., kojim se utvrđuje maksimalni godišnji iznosi doprinosa Europske unije iz IPA komponente za ruralni razvoj za 2007. – 2011. (IPARD) (u eurima) (Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 6/2012 od 20. srpnja 2012.).

otpadnih voda (18 ugovora), lokalnih nerazvrstanih cesta (16 ugovora). Isplaćeno je šest projekata u ukupnom iznosu od 1,39 milijuna eura. Od toga iznosa iz IPA sredstava isplaćeno je 1,05 milijuna eura.

U prvom natječaju za mjeru 202 zaprimljeno je 49 prijava te u izvještajnom razdoblju nije ugovoren niti jedan projekt.

Od ukupnog broja ugovorenih projekata od početka programskog razdoblja (292) najveći broj njih je iz Istarske županije (44 projekta) te Osječko-baranjske županije (42 projekta), dok je najmanje projekata ugovoreno u Šibensko-kninskoj županiji (1) te Krapinsko-zagorskoj županiji i Gradu Zagrebu (po 3 projekta). S obzirom na regionalnu pokrivenost s vrijednošću iznosa ugovora (vidi Grafikon ... ) prednjače Osječko-baranjska (14,33 milijuna eura), Istarska (10,65 milijuna eura) te Splitsko-dalmatinska županija (6,32 milijuna eura), dok su najmanja sredstva ugovorena u Šibensko-kninskoj županiji (0,05 milijuna eura).

**Grafikon 18: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava komponente V programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013.**

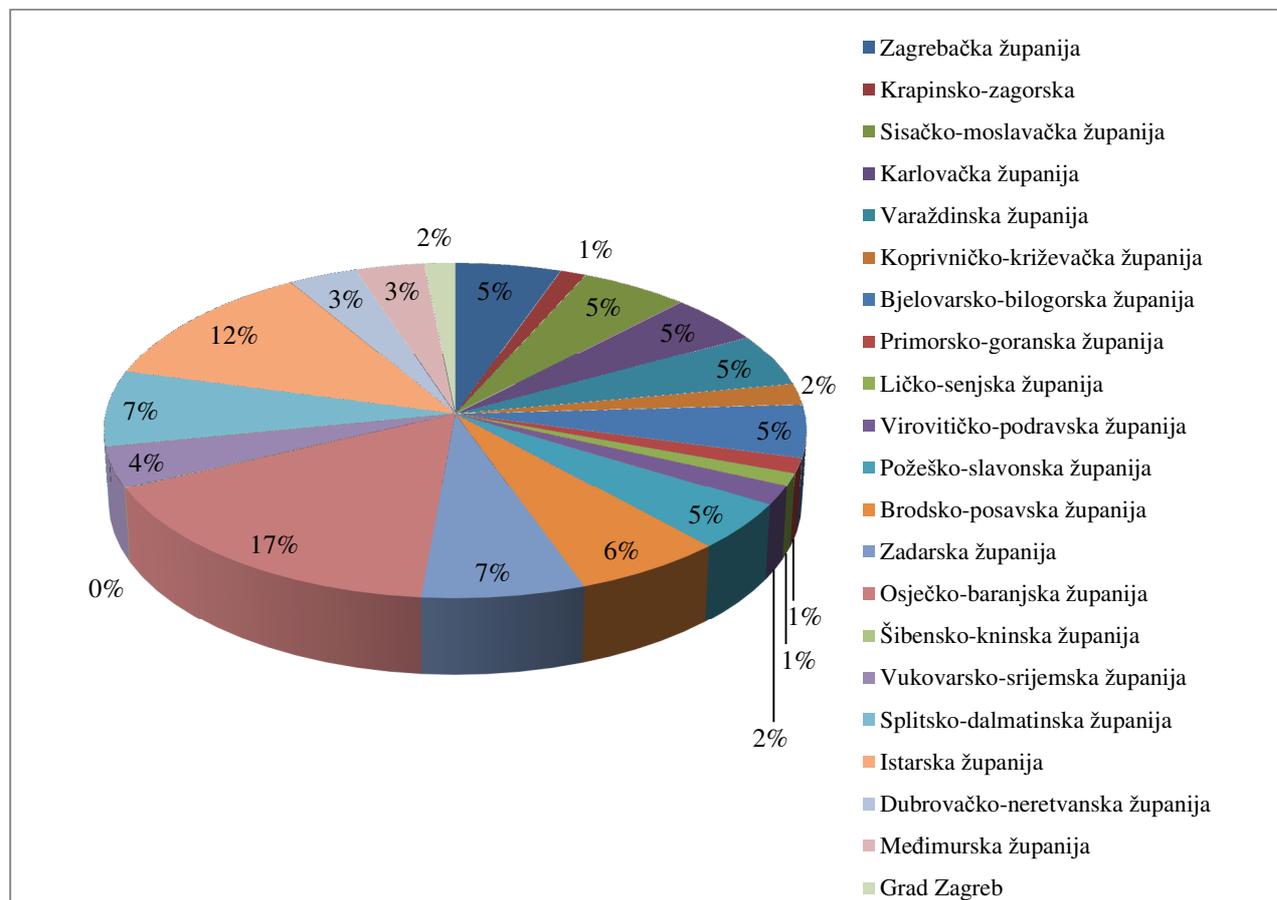

U pripremi je drugi natječaj za provedbu mjere 202, a otvaranje natječaja je predviđeno za rujan 2013. godine. Također, do daljnjega se neće raspisivati ostali IPARD natječaji. Ova je odluka donesena uslijed velikog broja zaprimljenih prijava na dosadašnje natječaje, za koje je ukupni traženi iznos potpore veći od trenutno raspoloživih sredstava.

**Tablica 43: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente V programa IPA, Operativnog programa „Ruralni razvoj“ 2007.-2012., u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	PO 1		PO 2		PO 3		TEHNIČKA POMOĆ	UKUPNO
	M 101	M 103	M201	M 202	M 301	M 302		
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA <sup>16</sup>	129,4							129,4
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	24,49	26,45	0	0	11,11	2,99	0,02	65,06
UGOVORENA SREDSTVA	5,52	1,53	0	0	1,51	0	0,02	8,59
UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	6,63%							6,63%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	3,54	5,50	0	0	0,25	0,42	0	9,70
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	1,62	0,82	0	0	1,05	0,23	0	3,72
PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO	6,62%	3,09%	0,00%	0,00%	9,45%	7,69%	0,00%	5,72%
PLAĆENO /UKUPNO DODIJELJENO	2,87%							2,87%
DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	7,50%							7,50%
OVJERENO	3,54	5,5	0	0	0,25	0,42	0	9,71
OVJERENO/UKUPNO UGOVORENO	14,45%	20,79%	0,00%	0,00%	2,25%	14,05%	0,00%	14,92%
OVJERENO/ /UKUPNO DODIJELJENO	7,50%							7,50%

Prioritet 1: Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedbe standarda Zajednice

Mjera 101: Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice

Mjera 103: Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice

Prioritet 2: Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno-okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja

Mjera 201: Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika

Mjera 202: Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

Mjera 301: Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture

Mjera 302: Diversifikacija i razvoj ruralnih ekonomskih aktivnosti

Prioritet 3: Razvoj ruralne ekonomije

<sup>16</sup> Ukupno dodijeljena sredstva, sukladno na dan 30 lipnja 2013. važećem Zakonu o potvrđivanju sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje višegodišnji sporazum o financiranju 2007. – 2010., koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. lipnja 2012. godine., kojim se utvrđuje maksimalni godišnji iznosi doprinosa Europske unije iz IPA komponente za ruralni razvoj za 2007. – 2011. (IPARD) (u eurima) (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 6/2012).

**Tablica 44: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente V programa IPA, Operativnog programa „Ruralni razvoj“ 2007.-2012., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

	PO 1		PO 2		PO 3		TEHNIČKA POMOĆ	UKUPNO
	M 101	M 103	M 201	M 202	M 301	M 302		
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	129,4							<b>129,4</b>
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	24,49	26,45	0	0	11,11	2,99	0,02	<b>65,06</b>
UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	50,28%							<b>50,28%</b>
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	7,83	7,80	0	0	0,25	0,42	0	<b>39,79*</b>
UKUPNO PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	7,89	9,13	0	0	1,05	0,42	0	<b>18,48</b>
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	32,22%	34,50%	0,00%	0,00%	9,41%	14,07%	0,00%	<b>28,40%</b>
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	14,28%							
UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	30,75%							
UKUPNO OVJERENO	7,83	7,8	0	0	0,25	0,42	0	<b>39,79*</b>
UKUPNO OVJERENO/ UKUPNO UGOVORENO	31,97%	29,49%	0,00%	0,00%	2,25%	14,07%	0,00%	<b>25,06%</b>
UKUPNO OVJERENO/ UKUPNO DODIJELJENO	12,60%							<b>12,60%</b>

\* Uključen avans u iznosu 23,49 milijuna eura.

Prioritet 1: Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedbe standarda Zajednice

Mjera 101: Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice

Mjera 103: Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice

Prioritet 2: Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno-okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja  
Mjera 201: Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika


Mjera 202: Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

Mjera 301: Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture

Mjera 302: Diversifikacija i razvoj ruralnih ekonomskih aktivnosti

Prioritet 3: Razvoj ruralne ekonomije

**Grafikon 19: Grafički prikaz statusa provedbe komponente V programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013. (IPA sredstva, u milijunima eura)**

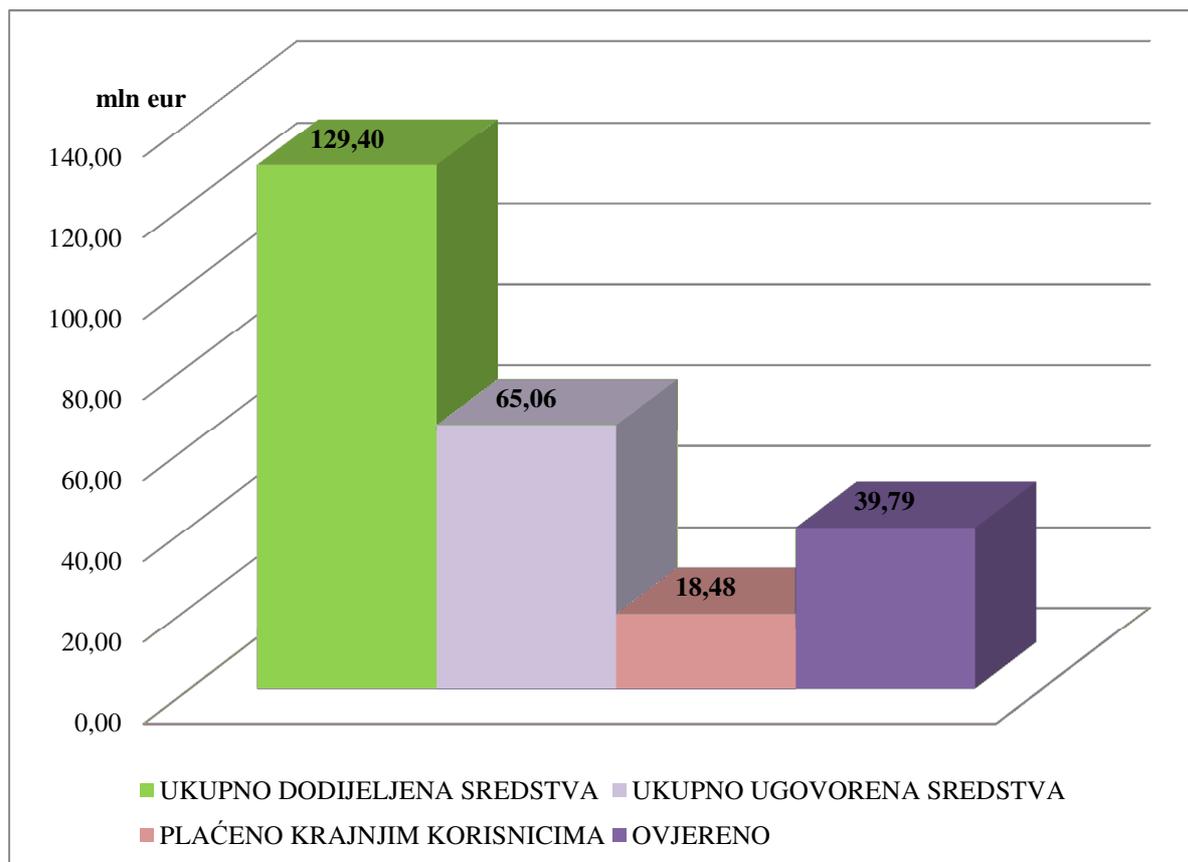

#### 4. NEPRAVILNOSTI

Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevvara (u daljnjem tekstu: SSNIP) Ministarstva financija ima glavnu koordinativnu ulogu unutar Sustava te provodi koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije (u daljnjem tekstu: AFCOS sustav), te je ujedno glavna kontakt točka Europskom uredu za borbu protiv prijevvara (u daljnjem tekstu: OLAF).

U ožujku 2013. godine je započelo provođenje *Twinning light* IPA 2009 projekta „Daljnje unaprjeđenje funkcioniranja AFCOS-sustava u RH s ciljem učinkovite zaštite financijskih interesa EU u RH“ zajedno s partnerima iz Ministarstva financija, Središnje agencije za ugovaranje projekata i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Litve.

Opći cilj projekta jest osigurati efikasnu i učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj u procesu priprema za strukturne fondove i Kohezijski fond kroz unapređenje vještina, znanja i uloga tijela u AFCOS sustavu. Ciljevi i aktivnosti projekta usmjereni su na jačanje kapaciteta i poboljšanje suradnje, komunikacije, koordinacije i razmjene informacija, te obuhvaćaju sva tijela u sve tri razine AFCOS sustava.

Aktivnosti projekta uključuju izradu nove Nacionalne strategije suzbijanja prijevvara za zaštitu financijskih interesa EU u razdoblju od 2013.-2015. te pripadajućeg Akcijskog plana, kao i izradu procedura za upravljanje nepravilnostima i prijevarama u okviru strukturnih instrumenata, pripremu nacrtu izmjena i dopuna Odluke o osnivanju AFCOS mreže (Narodne novine, broj 92/2008), izradu protokola o suradnji s nadležnim tijelima, provedbu edukacija za predstavnike tijela u AFCOS sustavu vezano uz upravljanje nepravilnostima i prijevarama u okruženju strukturnih instrumenata, te provedbu promotivnih aktivnosti s ciljem jačanja svijesti javnosti vezano uz suzbijanje nepravilnosti i prijevvara.

Vezano uz jačanje kapaciteta zaposlenika tijela u AFCOS-sustavu, predstavnici SSNIP-a su tijekom prve polovice 2013. godine, odnosno u mjesecu travnju, održali edukaciju za zaposlenike tijela u AFCOS-sustavu u području zaštite financijskih interesa Europske unije, i to u sklopu modula 11. programa edukacije „Financijsko upravljanje i kontrola EU fondova - Nepravilnosti i prijevare“.

Također, SSNIP je izradio Nacrt prijedloga Uredbe kojom će se uspostaviti institucionalni okvir sustava upravljanja nepravilnostima i prijevarama u skladu s odredbama članka 41., stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 136/2012), te je isti poslan nadležnim tijelima na mišljenje.

Nadalje, sukladno tromjesečnoj obvezi, tijela odnosno institucije Sustava za izvještavanje o nepravilnostima dužna su izvještavati SSNIP o slučajevima u kojima su utvrđene nepravilnosti. U razdoblju od drugog tromjesečja 2008. godine, zaključno s 30. lipnja 2013. godine prijavljeno je 83 slučaja nepravilnosti, od kojih je zatvoreno njih 69. Unutar navedenih zatvorenih slučajeva, korisnici odnosno ugovaratelji izvršili su povrat sredstava prema nadležnim provedbenim tijelima u ukupnom iznosu od 875.465,00 EUR. U ostalim slučajevima nije bilo potrebe za povratom sredstava, već su poduzete odgovarajuće korektivne mjere (ponavljanje natječajnog postupka, obustava plaćanja, zaključivanje dodatka ugovoru i slično).

Isto tako, tijela Sustava za izvještavanje o nepravilnostima imaju tromjesečnu obvezu izvijestiti SSNIP o zaprimljenim prijavama sumnji na nepravilnost te o postupcima koje su poduzeli s ciljem utvrđivanja nepravilnosti po navedenim prijavama. U izvještajnom razdoblju tijela Sustava za izvještavanje o nepravilnostima zaprimila su ukupno 14 prijava sumnji na nepravilnost te ukoliko se u navedenim prijavama utvrde nepravilnosti, o istima će se sukladno važećim procedurama izvijestiti SSNIP.

U izvještajnom razdoblju (od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine) prijavljena su tri (3) nova slučajeva nepravilnosti - jedan slučaj u komponenti II programa IPA, te dva slučaja u komponenti IV programa IPA:

1. Komponenta II programa IPA – Naziv programa: Transnacionalni program Jugoistočne Europe – projekt Europske vode. Vrsta nepravilnosti: povreda pravila vezanih uz javnu nabavu. Opis slučaja: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem razvoja zajedničke metodologije i demonstrativna primjena inovativne intervencije prema integriranom upravljanju vodnim resursima u ruralnim područjima, kako bi se kretali prema modelu održivog razvoja modela uspostavljenim EU zakonodavstvom. Prilikom provjere na licu mjesta koju su proveli predstavnici Agencije za regionalni razvoj (kao provedbeno tijelo) kod korisnika, utvrđeno je da je trošak nabave opreme neopravdan s obzirom da za nabavljenu opremu korisnik ne posjeduje potvrdu o podrijetlu robe koju je izdala nadležna gospodarska komora. Korektivna mjera: korisniku je završno plaćanje umanjeno u iznosu neopravdanog troška.

2. Komponenta IV programa IPA – Naziv projekta: Vježbenička tvrtka kao putovanje u stvarnom životnom iskustvu. Vrsta nepravilnosti: neopravdani trošak i povreda pravila vezanih uz javnu nabavu. Opis slučaja: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem povećanja osposobljenosti i zapošljavanja učenika srednjih strukovnih škola te razviti, unaprijediti i modernizirati kurikulum vježbeničkih tvrtki i broj škola koje imaju vježbeničke tvrtke. Prilikom provjere dokumentacije od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO, provedbeno tijelo), utvrđeno je da korisnik nije poštivao propisane procedure vezane uz provođenje sekundarne nabave u okviru projekta. Naime korisnik je proveo sekundarnu nabavu za dio elektroničke opreme, dok je drugi dio kupljen neposredno nakon, od istog dobavljača, direktnom nabavom. Korektivna mjera: završno plaćanje korisniku će se umanjiti u iznosu neopravdanog troška.

3. Komponenta IV programa IPA – Naziv projekta: Slavonski Brod solarni demonstracijski centar. Vrsta nepravilnosti: neopravdan trošak i nedostatna/nepotpuna dokumentacija. Opis slučaja: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem razvoja i modernizaciji strukovnih obrazovnih sustava u Republici Hrvatskoj. Osim razvoja i modernizacije, specifični cilj predloženog projekta je unaprijediti profesionalne, materijalne i tehničke uvijete u Tehničkoj školi Slavonski Brod, kao i provedbu novog kurikuluma (tehničar solarnih sustava) kroz razvoj demonstracijskog centra za solarne sustave. Prilikom provjere na licu mjesta koju su proveli predstavnici ASOO (provedbeno tijelo) kod korisnika, utvrđeno je da su u jednoj aktivnosti predstavnici pružatelja usluga bili prisutni tijekom evaluacije ponuda. Nadalje u okviru aktivnosti za pružanje usluga prevođenja, ASOO je utvrdio da je korisnik sklopio dva podugovora sa svojim zaposlenicima vezano uz ispunjavanje navedene aktivnosti te uvidom u zaprimljenu dokumentaciju, ASOO je utvrdio da evidencije radnih sati nisu sadržavale originalan potpis člana tima projekta te pojedine evidencije radnih sati nisu bile istovjetne onima

predstavljenima tijekom ranijeg izvještavanja. Korektivne mjere: završno plaćanje korisniku će se umanjiti u iznosu neopravdanog troška.

Do 30. lipnja 2013. godine ostaje otvoreno 10 slučajeva nepravilnosti iz prethodnih programa (1 nepravilnost iz programa CARDS 2003, 1 nepravilnost iz programa PHARE 2006, 2 nepravilnosti iz programa SAPARD, 1 nepravilnosti iz programa IPA I, 3 nepravilnosti iz programa IPA II i 2 nepravilnosti iz programa IPA IV), a zatvoreno je 7 slučajeva nepravilnosti (1 nepravilnost iz programa CARDS 2003, 5 nepravilnosti iz programa IPA II i 1 nepravilnost iz programa IPA IIIc).

Zaključno s 30. lipnja 2013. godine uslijed utvrđenih nepravilnosti ukupno je izvršeno povrata u iznosu od 0,87 milijuna eura, od čega se 0,79 milijuna eura odnosi na komponente I - IV programa IPA.

**Tablica 45: Izvršeni povrati po komponentama programa IPA u razdoblju od početka provedbe programa zaključno do 30. lipnja 2013. godine (izražena u eurima)**

IPA komponenta	Iznos povrata
IPA komponenta I	32.760
IPA komponenta II	19.365
IPA komponenta III	18.165
IPA komponenta IV	9.405
IPA komponenta V	/
Ukupno	79.695

## **5. NASTAVAK PRIPREMA ZA KORIŠTENJE EU FONDOVA NAKON STUPANJA U ČLANSTVO U EUROPSKOJ UNIJI**

### **5.1 Jačanje administrativnih kapaciteta za upravljanje Europskim fondovima**

U pogledu zapošljavanja u svrhu jačanja administrativnih kapaciteta za upravljanje fondovima Europske unije, Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 6. prosinca 2012. godine o zapošljavanju putem javnoga natječaja u ministarstvima i ostalim institucijama uključenima u provedbu IPA programa, kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretpristupnim programima Europske unije, bez prethodne (ex-ante) kontrole od strane Delegacije Europske unije, te dozvolu za rad sustava za provedbu fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Odluka Vlade Republike Hrvatske od 6. prosinca 2012. godine), zadužena su ministarstva i ostale institucije uključene u provedbu IPA programa i fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj osigurati potreban broj zaposlenika novim zapošljavanjima na način da najkasnije do 31. prosinca 2012. godine raspišu javne natječaje za prijam u državnu službu odnosno javne natječaje za zapošljavanje, a do 31. ožujka 2013. godine zaposle potrebna 204 zaposlenika. Prema posljednjem Izvješću o provedbi Odluka Vlade Republike Hrvatske od 6. prosinca 2012. godine koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dostavilo Vladi Republike Hrvatske u svibnju 2013. godine, proizlazi da su od 1. studenog 2012. godine do 31. ožujka 2013. godine objavljeni javni natječaji za prijam u državnu službu i javni natječaji za zapošljavanje za 173 osobe odnosno putem istih otvorena su 173 radna mjesta. U navedenom razdoblju putem javnog natječaja za prijam u državnu službu i javnog natječaja za zapošljavanje na poslovima provedbe IPA programa i fondova Europske unije zaposleno je 87 dodatnih zaposlenika. Također, do kraja ožujka 2013. putem internih oglasa i/ili sporazumnih premještaja, zaposleno je 13 dodatnih zaposlenika, dok je 26 zaposlenika napustilo institucije.

U okviru jačanja administrativnih kapaciteta na nacionalnoj razini, u izvještajnom razdoblju organizirali su se i provodili redovni programi izobrazbe povezani s upravljanjem fondovima Europske unije. Tijekom provedenih redovnih edukativnih aktivnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije vezanih uz pripremu i provedbu projekata iz fondova Europske unije ukupno je educirano 194 polaznika. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije također je organiziralo informativne i edukativne događaje „Regionalne dane EU fondova“ u gradovima diljem Hrvatske, sa svrhom informiranja i obrazovanja potencijalnih korisnika EU fondova o mogućnostima koje su im na raspolaganju u razdoblju 2007.–2013. te u razdoblju 2014.–2020. Za svaki grad edukativna događanja prilagođavaju se sukladno potrebama na terenu, odnosno zemljopisnom položaju svakog grada, a tijekom Regionalnih dana EU fondova provodi se i trening trenera, kojime se osposobljavaju polaznici za ponavljanje sličnih edukacija i u drugim gradovima RH. U izvještajnom razdoblju u šest gradova ukupno je informirano i educirano 365 polaznika.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je tijekom izvještajnog razdoblja organiziralo tri radionice za novinare „Ususret EU fondovima“, u Splitu, Opatiji i Osijeku, namijenjene novinarima tiskanih i elektroničkih medija koji se bave tematikom informiranja o fondovima Europske unije, ili im je to područje interesa, a u okviru kojih je ukupno educirano 85 novinara iz Republike Hrvatske. Radionice su obuhvaćale predavanja i panel rasprave o temama povezanim s novinarskim praćenjem i izvještavanjem o fondovima Europske unije.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije tijekom izvještajnog razdoblja, organizirala je i provela ukupno 25 edukacija u okviru programa

„Financijsko upravljanje i kontrola EU fondova“ i edukacija na temu primjene procedura propisanih Praktičnim vodičem kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama te dva ciklusa „Program izobrazbe u području javne nabave“.

## **5.2. Osnivanje Radne skupine za fondove Europske unije**

U cilju pripremanja prijedloga Vladi Republike Hrvatske aktivnosti vezanih uz pripremu korištenja, unaprjeđenje korištenja i trajnog praćenja korištenja fondova Europske unije, a radi poticanja sveukupnog rasta i razvoja u kontekstu provedbe zajedničkih politika Europske unije, osnovana je Radna skupina za fondove Europske unije Odlukom o osnivanju Radne skupine za fondove Europske unije, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. siječnja 2013. godine. U Radnu skupinu imenovani su članovi iz redova državnih dužnosnika, predsjednika uprava, ravnatelja i generalnih direktora. Zadaće Radne skupine su:

- predlagati Vladi Republike Hrvatske zakonska i druga rješenja kojima će se omogućiti učinkovito korištenje fondova Europske unije;
- kontinuirano pratiti i ocjenjivati djelovanje sustava upravljanja i korištenja fondova Europske unije;
- kontinuirano pratiti i ocjenjivati pripremu i provedbu projekata financiranih fondovima Europske unije, s naglaskom na velike investicijske projekte;
- donositi prijedloge s ciljem otklanjanja administrativnih i drugih poteškoća za učinkovitu provedbu projekata financiranih fondovima Europske unije te postizanja što većeg stupnja iskorištenosti fondova Europske unije.

U tom svjetlu, u pogledu statusa pripreme i provedbe investicijskih projekata, Zaključkom od 13. lipnja 2013. godine Vlada Republike Hrvatske je zadužila Radnu skupinu za fondove Europske unije da prati napredak i pripremu provedbe devet investicijskih projekata u odnosu na rokove utvrđene u planovima nabave. Od ukupnog broja investicijskih projekata u pripremi, Ministarstvo poljoprivrede priprema četiri investicijska projekta (Sustav vodoopskrbe i odvodnje za pročišćavanje otpadnih voda za gradove Osijek, Poreč, Čakovec i Vukovar), Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture priprema tri investicijska projekta (Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionicama Gradec - Sveti Ivan Žabno, Podsused - Samobor – Perivoj i Dugo Selo – Križevci), te po jedan investicijski projekt u nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Izgradnja i opremanje inovacijskog centra politehnike Marko Marulić) te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci). Objava natječaja u okviru navedenih projekata je planirana za drugu polovicu 2013. godine odnosno u prvoj polovici 2014. godine.

## **5.3. Aktivnosti koje se odnose na programsko razdoblje Europske unije 2007.-2013.**

S obzirom na očekivani ulazak Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije dana 1. srpnja 2013. godine, bilo je nužno pravovremeno završiti aktivnosti uspostavljanja zakonodavnog i institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, odnosno postojeći okvir dodatno prilagoditi novonastalim okolnostima.

Prije provođenja postupka procjene usklađenosti Sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Sustava), bilo je potrebno završiti postupak pripreme i donošenja Zajedničkih nacionalnih pravila (Pravila). Pravila su donesena s ciljem jednoobraznog postupanja svih tijela unutar Sustava, koja čine

institucionalni okvir za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu operativnih programa iz programskog razdoblja 2007.-2013., a na temelju Zakona i u skladu s Uredbom. Inicijalnu verziju prijedloga Zajedničkih nacionalnih pravila izradili su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Koordinacijskog tijela te Ministarstvo financija u svojstvu Tijela za ovjeravanje, u skladu s odredbama Zakona i Uredbe, u suradnji s Upravljačkim tijelima i Posredničkim tijelima, te je ista usuglašena u okviru Međuresorne radne skupine za provedbu pripremnih aktivnosti povezanih s uspostavom Sustava.

Pravila su odobrena Odlukama o davanju prethodne suglasnosti na sadržaj prijedloga pravila o postupanju tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih instrumenata Europske. Odluke su potpisali potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za ukupno devet Zajedničkih nacionalnih pravila, odnosno ministar financija za ukupno sedam Zajedničkih nacionalnih pravila.

Pravila u verziji 1.0 (odobrena Odlukama nadležnih ministara od 5. travnja 2013. godine) te 2.0 (odobrena Odlukama nadležnih ministara od 14. lipnja 2013.) izrađena su na engleskom jeziku te će isti, po završetku cjelokupnog postupka procjene usklađenosti, biti prevedena na hrvatski jezik. Prijedlozi pravila predstavljaju pravni i postupovni okvir za sve procedure uspostave i unaprjeđenja sustava, strateškog planiranja i programiranja, pripreme i provedbe projekata, izbora projekata i odobravanja sredstava pomoći, prognoziranja i praćenja, vrednovanja i zatvaranja operativnih programa, revizija, informiranja i vidljivosti te korištenja tehničke pomoći.

Temeljem pravno-postupovnog okvira iz Pravila, sva tijela Sustava su razradila interne procedure u obliku internih Priručnika o postupanju koji također čine dokumentaciju potrebnu za dobivanje pozitivnog mišljenja u okviru revizijske procjene usklađenosti Sustava.

Osim toga, tijela u Sustavu pokrenula su procese prilagodbe svog unutarnjeg ustrojstva putem izmjena i/ili dopuna Uredbi o unutarnjem ustrojstvu te su u skladu s time pripremljene Organizacijske razvojne strategije za tri horizontalna tijela u Sustavu i za sva četiri operativna programa. Organizacijske razvojne strategije dostavljene su Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije kao nacionalnog revizijskom tijelu.

Slijedom navedenog, izrađena su četiri zasebna Opisa sustava za sva četiri Operativna programa: „Promet“, „Zaštita okoliša“, „Regionalna konkurentnost“ i „Razvoj ljudskih potencijala“, koji integriraju Organizacijske razvojne strategije te pravila i procedure propisane u Zajedničkim nacionalnim pravilima i internim Priručnicima o postupanju.

U izvještajnom razdoblju započeo je postupak procjene usklađenosti Sustava od strane nacionalnog tijela za reviziju Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije (u daljnjem tekstu: ARPA).

Ujedno, tijekom prve polovice 2013. godine Republika Hrvatska finalizirala je izradu programskih dokumenata za korištenje strukturnih instrumenata u Republici Hrvatskoj u programskom razdoblju 2007.-2013. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije završavalo je postupak uspostavljanja integriranog sustava upravljanja informacijama (MIS - sustav za strukturne fondove i Kohezijski fond), obavljene su konzultacije s Europskom komisijom po pitanju prijelaza iz sustava upravljanja pretpristupnim sredstvima pomoći programa IPA u sustav upravljanja strukturnim instrumentima te je u organizaciji Ministarstva

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a u okviru *twinning* projekta financiranog iz programa IPA, završen prvi ciklus edukacija „Upravljanje i kontrola korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj“ sastavljen od 10 modula, a koji je pridonio boljem razumijevanju pravila i procedura među službenicima tijela odnosno institucija u Sustavu.

#### **5.4. Aktivnosti koje se odnose na programsko razdoblje Europske unije 2014.-2020.**

Sredinom siječnja 2013. Republika Hrvatska je od Europske komisije zaprimila Prijedlog za pripremu i prioritete programskih dokumenta (eng. *Position paper*) koji predstavlja polazište za otvaranje dijaloga oko sadržaja Partnerskog sporazuma i Operativnih programa. Sam dokument predstavljen je javnosti na skupu koji je organiziralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 31. siječnja 2013. godine.

U izvještajnom razdoblju nastavljen je proces programiranja za novo financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., započet u travnju 2012. godine. Tijekom prve polovice 2013. godine Tematske radne skupine identificirala su razvojne prioritete i potencijale Republike Hrvatske za spomenuto sedmogodišnje razdoblje te okvirnu raspodjelu financijskih sredstava po pojedinim prioritetima. Tijekom svibnja započet je neformalni dijalog s Europskom komisijom vezano za proces izrade programskih dokumenata za razdoblje 2014.-2020.

7. i 8. svibnja 2013. godine održan je niz sastanaka između Tematskih radnih skupina i predstavnika Europske komisije na kojima su predstavljeni razvojni prioriteti i potencijali Republike Hrvatske za nadolazeće sedmogodišnje razdoblje.

Na sastanku ministara, održanom 22. svibnja 2013. godine, odlučeno je da će se u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju Europske unije 2014.-2020. provoditi tri Operativna programa, dok je isto formalizirano izvan izvještajnog razdoblja, 29. kolovoza 2013. godine, donošenjem Odluke Vlade RH o operativnim programima za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu.

Na godišnjoj konferenciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održanoj 6. i 7. lipnja 2013. u Zagrebu, započeo je proces javnih konzultacija za pripremu strateških dokumenata za nadolazeće programsko razdoblje. Zainteresirana javnost imala je priliku iskazati mišljenje o razvojnim prioritetima Republike Hrvatske putem on-line ankete. Nastavak javnih konzultacija planiran je za jesen 2013. godine, do kada će biti pripremljeni zreliji nacrti programskih dokumenata. Tijekom lipnja 2013. godine nastavljen je rad na pripremi programskih dokumenata.

## 6. ZAKLJUČAK

Podaci prikazani u Izvješću pokazatelj su tendencije daljnjeg značajnog rasta uspješnosti u ugovaranju, plaćanju i doznačavanju sredstava od strane Europske komisije, i opće zadovoljavajuće dinamike korištenja pretpristupnih sredstava.

U predmetnom razdoblju zabilježeni su značajni pozitivni pomaci koji se odnose na ugovorena, kao i isplaćena sredstva krajnjim korisnicima i ugovarateljima. Promatrajući podatke na zadnji dan izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2013., napredak ostvaren u ugovaranju iznosi nešto manje od stotinu milijuna eura u odnosu na posljednji dan proteklog izvještajnog razdoblja, a iznos plaćanja izvršenih prema krajnjim korisnicima premašuju pedeset milijuna eura, što ujedno iznosi gotovo 20% ukupno isplaćenog iznosa od početka provedbe programa IPA.

Podaci o ugovaranju I komponente Nacionalnog programa IPA iz alokacija za godine 2007., 2008. i 2009., za koje je ugovaranje završeno, ukazuju na ostvarenje visokih stopa ugovorenosti koje su redovito iznad 90% dodijeljenih iznosa. Osim toga, u izvještajnom razdoblju ostvaren je značajan skok u ugovaranju za programsku godinu 2009. (gotovo 5 milijuna eura novougovorenenih sredstava), i 2010. (više od 8 milijuna eura novougovorenenih sredstava).

Komponenta II programa IPA odnosno programi prekogranične suradnje sa zemljama nečlanicama i transnacionalni programi nastavljaju pokazivati uspješnost u ugovaranju visokih stopa u odnosu na dodijeljene iznose, krećući se od visokih 87 do čak nešto manje od 100% ugovorenosti. Status isplaćenosti također ukazuje na uznapredovalo korištenje ugovorenenih sredstava, i kreće se od 64 do gotovo 83% ukupno ugovorenenih sredstava.

U odnosu na prethodno razdoblje, najznačajniji napredak u ugovaranju ostvaren je u komponenti III programa IPA, koja bilježi porast ugovaranja od gotovo 50 milijuna eura (uključujući iznose povećanja sufinanciranja za projekte Marinščina i Kaštijun u sklopu komponente IIIB) odnosno ostvarenje nešto manje od četvrtine ukupno ugovorenenih sredstava iz alokacija za razdoblje 2007.-2012. Nadalje, u istoj komponenti ostvaren je i najveći napredak u izvršenju plaćanja te iznosi gotovo 25 milijuna eura.

U komponenti IV programa IPA, od početka korištenja programa do zadnjeg dana izvještajnog razdoblja ugovoreno je gotovo 60% dodijeljenih sredstava pri čemu je u izvještajnom razdoblju najveći napredak u ugovaranju zabilježen u okviru prioritetne osi usmjerene na zapošljavanje u iznosu od gotovo 6,50 milijuna eura što predstavlja gotovo 50% ukupno ugovorenenih sredstava.

Komponenta V programa IPA bilježi najslabiji napredak u ugovaranju spram raspoloživih iznosa: u izvještajnom razdoblju ugovoreno je tek nešto više od 8 milijuna eura u odnosu na dodijeljeni iznos koji je nešto manji od 130 milijuna eura. Slijedom toga, i postotak isplaćenosti relativno je nizak i ostvaruje stopu manju od 6%.

Za razliku od dosadašnjih Izvješća Vlade Republike Hrvatske prema Hrvatskom saboru sukladno Zaključku Hrvatskog sabora od 6. listopada 2005. godine, predmetno Izvješće sadrži veću razinu detalja i financijskih pokazatelja (na razini projektnog sažetka za komponentu I, po pojedinom programu za komponentu II te po pojedinoj prioritetnoj osi i mjeri za komponente III, IV i V programa IPA) kao i pokazatelje geografske rasprostranjenosti projekata u okviru

shema dodjele bespovratnih sredstava, a sve u cilju daljnjeg unapređenja sustavnog i fokusiranog praćenja uspješnosti korištenja sredstava kao i omogućavanja jasnog utvrđivanja slabosti u pojedinim dijelovima operativnih struktura za provedbu pojedine komponente programa IPA te pravovremenog dijagnosticiranja manjkavosti koje nepovoljno utječu na iskorištenost raspoloživih sredstava.

**Prilog 1 – Pregled traženih i dobivenih sredstava od Europske komisije, te izvršenih plaćanja po programima do 30. lipnja 2013.**

## PREGLED TRAŽENIH I DOBIVENIH SREDSTAVA OD EUROPSKE KOMISIJE, TE IZVRŠENIH PLAĆANJA PO PROGRAMIMA DO 30. LIPNJA 2013.\*

u EUR

PROGRAM	UGOVORENO	TRAŽENO od 1.1.2013. do 30.06.2013.	UKUPNO TRAŽENO do 30.06.2013.	DOZNAČENO od 1.1.2013. do 30.06.2013.	UKUPNO DOZNAČENO do 30.06.2013.	PLAĆENO od 1.1.2013. do 30.06.2013.	% PLAĆENO OD UGOVORENOG	UKUPNO PLAĆENO do 30.06.2013.	UKUPNO % PLAĆENO OD UGOVORENOG
IPA I 2007	36.826.849,63	0,00	36.961.756,75	0,00	34.914.018,97	800.142,19	0,02	34.187.880,67	92,83
IPA I 2007 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	4.600.000,00	0,00	4.440.643,66	0,00	4.440.643,66	0,00	0,00	4.274.485,76	92,92
IPA I 2008	33.889.588,15	0,00	32.195.108,75	0,00	32.195.108,75	4.499.871,25	0,13	27.181.892,140	80,21
IPA I 2008 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	5.575.000,00	0,00	5.372.570,36	0,00	5.263.620,86	13.600,00	0,00	5.228.612,36	93,79
IPA 2008 NUCLEAR SAFETY	676.846,78	547.804,44	643.004,44	344.750,41	439.950,41	94.857,12	0,14	388.205,98	57,36
IPA I 2009	34.260.060,02	0,00	23.917.726,30	0,00	23.917.726,30	6.656.368,18	0,19	20.710.754,63	60,45
IPA I 2009 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	5.304.928,00	0,00	5.106.484,43	0,00	5.106.484,43	0,00	0,00	5.106.484,23	96,26
IPA I 2010	14.263.503,70	10.913.270,55	20.267.502,45	0,00	9.354.231,90	3.414.954,92	0,24	7.476.509,72	52,42
IPA I 2010 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	7.442.685,00	0,00	7.402.434,31	0,00	7.402.434,31	0,00	0,00	7.402.433,31	99,46
IPA I 2011	51.438,60	0,00	2.676.626,10	0,00	2.676.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA I 2011 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	7.062.867,00	0,00	7.062.867,00	0,00	7.062.867,00	0,00	0,00	7.062.867,00	100,00
IPA 2011 NUCLEAR SAFETY	136.143,00	242.625,00	242.625,00	0,00	0,00	81.685,80	0,60	81.685,80	60,00
IPA I 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA I 2012 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	5.092.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392.673,07	0,86	4.392.673,07	86,26
IPA II 2007 Hrvatska - Srbija	799.289,57	0,00	759.325,09	0,00	759.325,09	64.069,50	8,02	705.668,22	88,29
IPA II 2008 Hrvatska - Srbija	799.340,44	0,00	759.373,42	0,00	759.373,42	0,00	0,00	733.533,54	91,77
IPA II 2009 Hrvatska - Srbija	799.103,84	239.148,65	759.148,65	239.148,65	759.148,65	41.341,16	5,17	564.763,03	70,67
IPA II 2010 Hrvatska - Srbija	756.301,25	440.000,00	520.000,00	440.000,00	520.000,00	335.977,18	44,42	399.977,18	52,89
IPA II 2011 Hrvatska - Srbija	386.646,72	520.000,00	520.000,00	80.000,00	80.000,00	263.655,07	68,19	263.655,07	68,19
IPA II 2007 Hrvatska - Crna Gora	396.541,50	0,00	376.714,43	0,00	376.714,43	0,00	0,00	288.476,30	72,75
IPA II 2008 Hrvatska - Crna Gora	399.949,61	0,00	379.952,13	0,00	379.952,13	0,00	0,00	283.871,52	70,98
IPA II 2009 Hrvatska - Crna Gora	399.996,00	259.996,20	379.996,20	0,00	120.000,00	260.631,62	65,16	292.628,42	73,16
IPA II 2010 Hrvatska - Crna Gora	399.996,00	220.000,00	260.000,00	0,00	40.000,00	175.611,17	43,90	175.611,17	43,90
IPA II 2011 Hrvatska - Crna Gora	240.959,59	220.000,00	260.000,00	40.000,00	40.000,00	151.157,12	62,73	151.157,12	62,73
IPA II 2007 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	996.640,32	0,00	946.808,30	0,00	946.808,30	2.220,84	0,22	829.144,83	83,19
IPA II 2008 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	999.999,59	0,00	974.830,27	0,00	949.999,61	0,00	0,00	830.092,65	83,01
IPA II 2009 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	988.031,64	638.630,00	938.630,00	0,00	300.000,00	120.633,12	12,21	631.418,86	63,91
IPA II 2010 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	999.998,97	350.000,00	650.000,00	0,00	300.000,00	481.908,21	48,19	561.908,21	56,19
IPA II 2011 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	996.508,13	100.000,00	650.000,00	100.000,00	100.000,00	343.134,23	34,43	343.134,23	34,43
IPA II 2007 Mediteran i Jugoistočna Europa	394.243,60	0,00	412.736,08	0,00	374.531,42	0,00	0,00	353.313,65	89,62
IPA II 2008 Mediteran i Jugoistočna Europa	501.193,80	0,00	480.776,00	0,00	480.776,00	-24.503,54	-4,89	406.293,89	81,07
IPA II 2009 Mediteran i Jugoistočna Europa	392.515,24	8.758,18	372.889,48	0,00	364.131,30	0,00	0,00	289.330,12	73,71

PROGRAM	UGOVORENO	TRAŽENO od 1.1.2013. do 30.06.2013.	UKUPNO TRAŽENO do 30.06.2013.	DOZNAČENO od 1.1.2013. do 30.06.2013.	UKUPNO DOZNAČENO do 30.06.2013.	PLAĆENO od 1.1.2013. do 30.06.2013.	% PLAĆENO OD UGOVORENOG	UKUPNO PLAĆENO do 30.06.2013.	UKUPNO % PLAĆENO OD UGOVORENOG
<b>IPA IIIa - Promet</b>	68.953.318,33	8.965.423,62	58.983.050,91	25.547.740,72	55.855.480,60	8.965.423,63	13,00	40.469.833,61	58,69
<b>IPA IIIb - Zaštita okoliša</b>	84.144.489,99	9.646.183,80	59.178.852,59	18.019.680,33	52.246.156,35	8.457.522,99	10,05	29.353.672,95	34,88
<b>IPA IIIc - Regionalna konkurentnost</b>	64.871.543,19	6.020.632,57	38.666.586,74	11.925.155,94	36.026.128,85	7.393.243,14	11,40	35.372.960,64	54,53
<b>IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala</b>	56.169.416,72	8.479.471,76	44.747.578,36	6.959.628,87	40.082.871,94	5.881.626,02	10,47	39.891.596,82	71,02
<b>IPA V - IPARD</b>	65.054.943,45	9.704.744,06	39.788.384,08	9.704.744,09	39.788.384,12	3.710.309,04	0,06	18.483.195,45	28,41
<b>UKUPNO IPA</b>	<b>506.023.371,38</b>	<b>57.516.688,83</b>	<b>398.054.982,28</b>	<b>73.400.849,01</b>	<b>364.423.494,90</b>	<b>56.578.113,03</b>	0,11	<b>295.169.722,15</b>	<b>58,33</b>

\* U svrhu sažetosti i praktičnosti prikaza, financijski pokazatelji zaokruživani su na dvije decimale. Eventualne diskrepancije između podataka prikazanih u tekstu, tablicama i grafikonima u Izvješću i onih iz ovoga Priloga 1 Izvješća proizlaze iz zaokruživanja ulaznih podataka na dvije decimale i veličinom su zanemarive za potrebe samog izvješća.
